



**Consortio
Interventoría
Cota**

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS No 18

18 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA IDU-521-2022

OBJETO:

Interventoría integral para la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota

CONTRATO CONSULTORÍA IDU-1815-2021

OBJETO:

Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota

Periodo Comprendido entre

1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024

Bogotá D, C. 18 de noviembre de 2024

VERSIÓN 3



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS




CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3



ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Observaciones	Folios
1	3/07/2024	versión inicial	105
2	3/09/2024	Respuesta observaciones IDU 202423600949391	106
3	18/11/2024	Respuesta observaciones IDU 202423601247131	107

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nombre: Nathaly Rodríguez Urrego Cargo: Coordinadora de Interventoría	Nombre: Nathaly Rodríguez Urrego Cargo: Coordinadora de Interventoría	Nombre: William Malaver Bello Cargo: Director de Interventoría

SUPERVISIÓN: INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU

Revisado por:	Aprobado por:
	
Nombre: Diana Carolina Valderrama Torres Cargo: Apoyo a la Supervisión	Nombre: Diana Carolina Valderrama Torres Cargo: Apoyo a la Supervisión

Contenido

1	GENERALIDADES	9
1.1	Metas Físicas	9
1.2	Objetivo General	10
1.2.1	Objetivos Específicos	10
2	INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.....	11
2.1	Datos generales, fecha de suscripción, legalización, iniciación y terminación.	11
2.2	Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases	12
2.2.1	Suspensión No.1	14
2.2.2	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	15
2.2.3	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	15
2.2.4	Acta de reinicio	15
2.2.5	Modificación No.2 al Contrato IDU-1815-2021	15
2.2.6	Suspensión No.2	18
2.2.7	Ampliación No.1 a la suspensión No.2	22
2.2.8	Ampliación No.2 a la suspensión No.2	22
2.2.9	Ampliación No.3 a la suspensión No.2	23
2.2.10	Ampliación No.4 a la suspensión No.2	23
2.2.11	Ampliación No.5 a la suspensión No.2	23
2.2.12	Ampliación No.6 a la suspensión No.2	24
2.3	Valor inicial del contrato y adiciones.	24
2.3.1	Modificación No. 2 al contrato de Interventoría 521 de 2022 (Forma de Pago) 24	
2.3.2	Modificación No. 3 al contrato de Consultoría 1815 de 2021.....	25
2.3.3	Modificación No. 4 al contrato de Consultoría 1815 de 2021.....	25
2.4	Sanciones y acciones legales en proceso.	26
2.5	Garantías, certificados de modificación y vigencias.....	28
2.5.1	Pólizas Contrato IDU-1815-2021.....	28
2.5.2	Pólizas Contrato IDU-521-2022.....	31
2.6	Modificaciones al contrato.....	33
2.7	Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes.	34

2.8	Convenios asociados	35
3	BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS	37
3.1	Estado Financiero	37
3.1.1	Actas de Pago Consultoría	38
3.1.2	Actas de pago Interventoría	40
3.2	Número de CDP	41
3.3	Número CRP	42
3.4	Relación de actas de pago y órdenes de pago	43
3.5	Incluir costos de investigación y diagnóstico de redes. Ejecución de recursos para redes discriminando costos con cargo al IDU y con cargo a cada ESP (adjuntando los Soportes).	43
4	INFORMACIÓN TÉCNICA	44
4.1	Relación del personal Interventoría	44
4.2	Relación del personal Consultoría	48
4.3	Principales actividades desarrolladas por el personal de la Consultoría de cada dependencia.	53
4.3.1	Etapas de Investigación	53
4.3.2	Topografía	54
4.3.3	Diseño Geométrico	54
4.3.4	Estudios de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	55
4.3.5	Estudios y Diseños Arquitectónicos	55
4.3.6	Redes Hidrosanitarias	56
4.3.7	Redes Secas (Eléctricas, Telefónicas y de Gas)	57
4.3.8	Estudios y Diseños Estructurales	58
4.3.9	Suelos y Geotecnia	59
4.3.10	Pavimentos	59
4.3.11	Gestión del Riesgo de Proyectos	60
4.3.12	Estudio Ambiental	60
4.3.13	Presentación Proyecto BIM.	61
4.3.14	Social	61
4.3.15	Arqueología	62
4.3.16	Patrimonio y Bienes de Interés cultural.	62
4.3.17	Estudio Predial y Reasentamiento	63
4.3.18	Presupuesto	64

4.3.19	Documentos para el cierre de la Fase de Factibilidad.....	64
4.3.20	Programación.....	65
4.4	Gestión realizada con cada una de las empresas y entidades que intervengan en el proyecto.	65
4.4.1	ETB.....	65
4.4.2	VANTI.....	66
4.4.3	UAESP	66
4.4.4	Ministerio de Cultura MINCULTURA	66
4.5	Problemas técnicos y soluciones planteadas de cada dependencia.	66
4.6	Relación del estado y soportes de los productos entregados.....	68
4.6.1	Estado de los productos Fase RAI	68
4.6.2	Estado de los productos Fase Factibilidad.....	69
4.6.3	Estado de los productos Fase Estudios y Diseños.	72
4.7	Registro fotográfico.	75
4.8	Programación de la Consultoría.....	81
4.8.1	Cronograma plan de Contingencia.....	81
4.8.2	Cronograma de la Fase RAI.....	82
4.8.3	Cronograma de la Fase de Factibilidad.....	82
4.8.4	Cronograma de la Fase de Estudios y Diseños.	82
4.8.5	Cronograma de la Fase estudios y diseños plan de contingencia	83
4.8.6	Cronograma de la Fase de Aprobaciones.....	83
4.8.7	Cronograma.....	84
4.9	Certificados vigentes de calibración o ajuste de los equipos de inspección.	97
4.10	Reporte de salida no conforme.	97
4.11	Reporte para la actualización de los estudios, factibilidad, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad, según formato IDU vigente.	100
5	INFORME SOCIAL.....	101
5.1	Informe mensual de la Consultoría.	101
5.2	Informe mensual de la Interventoría.....	101
6	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE SST.	102
6.1	Informe mensual ambiental de la Consultoría.....	102
6.2	Informe mensual ambiental de la Interventoría.....	102
6.3	Informe mensual SST de la Consultoría.	102

6.4	Informe mensual SST de la Interventoría.....	102
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	103
8	ANEXOS.....	105
9	REFERENCIAS	106

Lista de Tablas

Tabla 1. Metas fiscales del proyecto	10
Tabla 2. Datos generales de los contratos de Consultoría e Interventoría.....	11
Tabla 3. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría	12
Tabla 4. Afectaciones en el plazo de los Contratos de Consultoría e Interventoría.	13
Tabla 5. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría.	13
Tabla 6. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría.	14
Tabla 7. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría	15
Tabla 8. Valor inicial del contrato y adiciones.....	26
Tabla 9. Contrato Consultoría – Garantías, certificados de modificación y vigencias.....	28
Tabla 10. Estado de póliza de cumplimiento No. 33-44-101221349 Contrato IDU 1815 de 2021.....	29
Tabla 11. Estado de póliza RCE No. 33-40-101066861-5 Contrato IDU 1815 de 2021. ...	30
Tabla 12. Contrato Interventoría – Garantías, certificados de modificación y vigencias	31
Tabla 13. Estado de póliza de cumplimiento No. 65-44-101211723 Contrato IDU 521 de 2022.....	31
Tabla 14. estado de Póliza RCE No. 65-40-101065034 del contrato de Interventoría 521 de 2022.....	32
Tabla 15. Modificaciones a los Contratos de Consultoría e Interventoría	33
Tabla 16. Relación de actas suscritas	34
Tabla 17. Estado financiero	37
Tabla 18. CDP Contrato IDU 1815-2021	41
Tabla 19. CPD IDU-521-2022.....	42
Tabla 20. CRP Contrato IDU 1815-2021	42
Tabla 21. CRP Contrato IDU-521-2022.....	42
Tabla 22. Actas y Ordenes de pago de Interventoría generadas.	43
Tabla 23. Actas y Ordenes de pago de Consultoría generadas.....	43
Tabla 24. Relación del personal del Contrato de Interventoría.	44
Tabla 25. Relación del personal del Contrato de Consultoría	48
Tabla 26. Informes semanales de Interventoría	65
Tabla 27. Estado de los productos Fase RAI	68
Tabla 28. Estado de los productos de la Fase de factibilidad.	69
Tabla 29. Relación del estado de los productos radicados en el IDU.	70
Tabla 30. Relación de informes con observaciones del IDU en el periodo.	72
Tabla 31. Estado de los productos de la Fase de Estudios y Diseños.....	72
Tabla 32. Resumen del % programado y ejecutado.....	84
Tabla 33. Resumen del % programado y ejecutado. Plan de Contingencia	86
Tabla 34. Resumen del % programado y ejecutado Fase RAI.....	87
Tabla 35. Resumen del % programado y ejecutado Fase Factibilidad.	89
Tabla 36. Resumen del % programado y ejecutado Fase Estudios y Diseños.	92
Tabla 37. Resumen del % programado y ejecutado Fase Aprobaciones.....	94
Tabla 38. Salidas no conforme informe No.18.	97

Lista de Fotografías

Fotografía 1. Comité IDU número 5 y taller de impactos en el club Laverdieri del día 2 de mayo de 2024	75
Fotografía 2. verificación de las muestras de pavimentos enviadas al laboratorio DAPCIL. S.A.S.....	75
Fotografía 3. Acompañamiento en campo a las actividades enmarcadas en el Plan de exploración de Geotecnia.....	76
Fotografía 4. Recorrido urbano con la comunidad del barrio Alaska.....	76
Fotografía 5. Visita a los laboratorios Geodelta y BATEMAN INGENIERÍA para la revisión de las muestras allegadas de las perforaciones de geotecnia realizadas en campo.....	77
Fotografía 6. A Acompañamiento en campo a las actividades enmarcadas en el Plan de exploración de Geotecnia.....	77
Fotografía 7. Comité Ambiental y técnico No.16 del día 14 de mayo de 2024 en las instalaciones del IDU.....	78
Fotografía 8. Mesa de trabajo entre la Interventoría, la Consultoría , el IDU con VANTI el día 16 de mayo de 2024.....	78
Fotografía 9. Acompañamiento de los trabajos de geotecnia en campo por parte de la Interventoría el día 14 de mayo de 2024.....	79
Fotografía 10. Recorrido Urbano entre el colegio Salitre y el club Laverdieri el día 22 de mayo de 2024.....	79
Fotografía 11. Recorrido Urbano entre el colegio Salitre y el club Laverdieri el día 22 de mayo de 2024.....	80
Fotografía 12. Acompañamiento de los trabajos de geotecnia en campo por parte de la Interventoría el día 20 de mayo de 2024.....	80

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Trazada del proyecto con única alternativa.....	9
Ilustración 2. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	81
Ilustración 3. Cronograma plan de contingencia a corte del 27 de mayo de 2024.....	81
Ilustración 4. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	82
Ilustración 5. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	82
Ilustración 6. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	83
Ilustración 7. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	83
Ilustración 8. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.....	84

Lista de Gráficas


Grafica 1. Estado financiero Consultoría.....	37
Grafica 2. Estado financiero Interventoría.....	38
Grafica 3. Programado vs Ejecutado a corte del Informe semanal No.75.....	86

1 GENERALIDADES

El presente documento es el Informe Mensual de Interventoría No.18 correspondiente al periodo entre el 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 ejecución de la Fase de Estudios y Diseños del Contrato IDU-521- 2022 que tiene por objeto “*Interventoría integral para la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota*”

De acuerdo con el resultado de la Fase de Factibilidad, el proyecto Vía Cota tiene una estimación en longitud de 5.7 kilómetros con único trazado como alternativa, busca que las calzadas, las aceras, las zonas de Bio Retención (SUDS) y las ciclorrutas planteadas para la Vía Cota, formen parte del nuevo sistema de espacio público, destinados al tránsito y permanencia de los peatones del sector; y se relacionan funcionalmente con elementos del espacio público construido, con los elementos de la estructura ecológica principal, con la red de ciclorrutas y con los senderos peatonales existentes.

Ilustración 1. Trazada del proyecto con única alternativa.

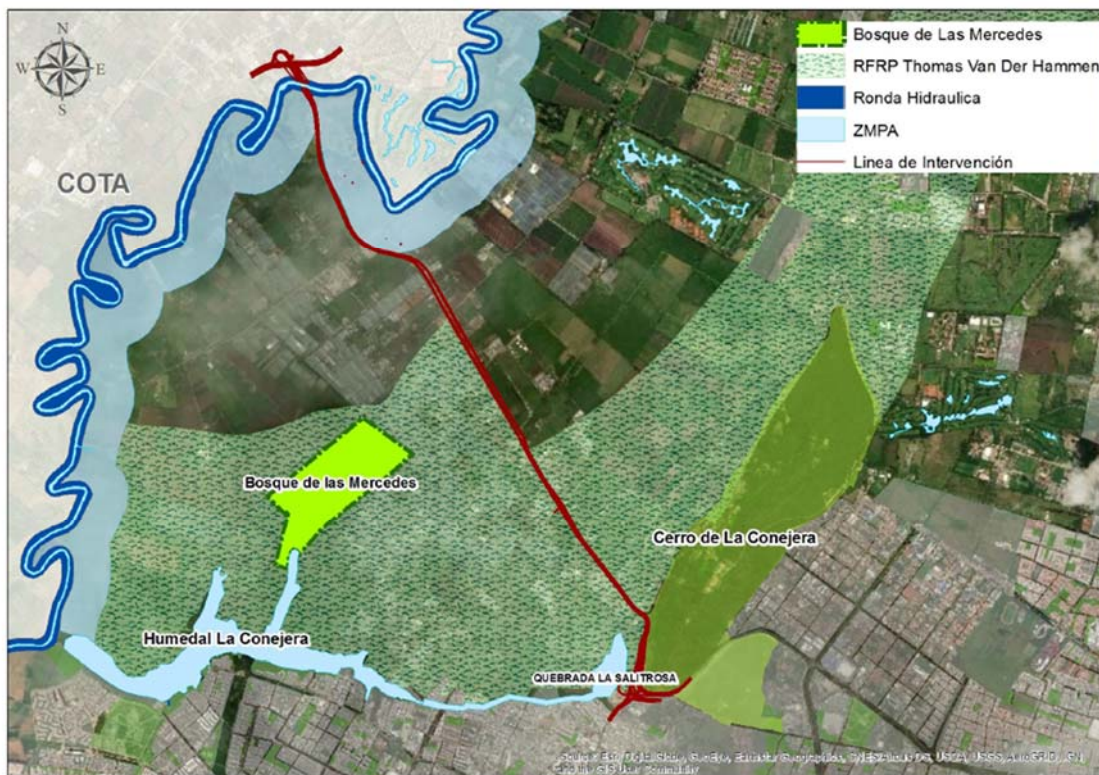

Fuente: SGDU – IDU

1.1 Metas Físicas

Las metas físicas presentadas en la Tabla 1 son un indicativo, en razón a que son estimaciones del resultado de la Fase de Factibilidad, teniendo en cuenta que, la meta física definitiva será definida en la Fase de los Estudios y Diseños.

Tabla 1. Metas físicas del proyecto

Meta física vía	Unidad	Cantidad
Longitud Corredor (Calzada Izquierda y Derecha)	Km	13,5
Longitud Ciclorruta (Calzada Izquierda y calzada derecha)	Km	12.2
Espacio Público Aproximado	m ²	35.380
Longitud intersección	Km	1.9
Longitud ciclorruta intersección	Km	3.8
Puentes vehiculares	und	3

Fuente: Resultado avance de la etapa de estudios y diseños – Cto 1815 de 2021

1.2 Objetivo General

Desarrollar la etapa de estudios y diseños que contempla las fases de recopilación y análisis de la información, factibilidad, estudios y diseños y aprobaciones para la construcción de la vía Cota desde la Carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota como parte del ciclo de maduración del proyecto.

1.2.1 Objetivos Específicos

Los objetivos específico del proyecto son:

- Mejorar la accesibilidad y conectividad del tramo vial entre la ciudad de Bogotá D.C y el municipio de Cota
- Armonizar el proyecto con los proyectos o contratos que se desarrollen en la zona de influencia directa.
- Informar las actividades realizadas por el Consorcio EYD Cota en el desarrollo del contrato IDU-1815- 2021 para los componentes de topografía, gestión predial, tránsito, geometría vial, urbanismo y espacio público, hidráulica e hidrología, redes secas y de gas, geotecnia, estructuras, pavimentos, arqueología y bienes de interés cultural (BIC), BIM, cronograma, costos y presupuestos.
- Presentar el estado de avance de las actividades ejecutadas en relación con las actividades programadas.
- Cumplir el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente (Versión 9).

2 INFORMACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA.

2.1 Datos generales, fecha de suscripción, legalización, iniciación y terminación.

En la siguiente tabla están los datos generales del Contrato de Consultoría y Contrato de Interventoría, entre los que están el número del contrato, objeto, nombre del consultor, nombre de interventor, porcentaje de participación en los consorcios, estado del contrato, fecha de suscripción, fecha de legalización, fecha de inicio y fecha de terminación actual al presente informe.

Tabla 2. Datos generales de los contratos de Consultoría e Interventoría

INFORMACIÓN	CONSULTOR		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	IDU No. 1815 de 2021		IDU No. 521 de 2022	
OBJETO	Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota		Interventoría integral para la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	Consortio EYD Cota	Participación	Consortio Interventoría Cota	Participación
	EDL S.A.S	50%	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S	40%
	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S	50%	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y COMERCIALES SAS SERINCO COLOMBIA	5%
			PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA PEYCO COLOMBIA	16%
			GESTIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SLU GESSING COLOMBIA	16%
			AMBIOTEC S.A.S	23%
ESTADO DEL CONTRATO	En el periodo del informe No. 15, el contrato está en ejecución en la Fase de Estudios y Diseños.		En el periodo del informe No. 14, el contrato está en ejecución en la Fase de Estudios y Diseños.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/12/2021		5/05/2022	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	27/12/2021		9/06/2022	
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022		1 de agosto de 2022	
Suspensión No.1	29 de noviembre de 2022		29 de noviembre de 2022	

INFORMACIÓN	CONSULTOR	INTERVENTOR
No. DEL CONTRATO	IDU No. 1815 de 2021	IDU No. 521 de 2022
Suspensión No.1 – Ampliación No.1	19 de diciembre de 2022	19 de diciembre de 2022
Suspensión No.1 – Ampliación No.2	4 de enero de 2023	4 de enero de 2023
Fecha de reinicio	11 de enero de 2023	11 de enero de 2023
Suspensión No.2	21 de septiembre de 2023	21 de septiembre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.1	20 de octubre de 2023	20 de octubre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.2	9 de noviembre de 2023	9 de noviembre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.3	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.4	6 de diciembre de 2023	6 de diciembre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.5	13 de diciembre de 2023	13 de diciembre de 2023
Suspensión No.2 - Ampliación No.6	20 de diciembre de 2023	20 de diciembre de 2023
Fecha de terminación actual:	27 de febrero de 2025	27 de marzo de 2025

Fuente: Consorcio Interventoría Cota

2.2 Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases

En Tabla 3 están los plazos iniciales de cada una de las fases del Contrato de Consultoría e Interventoría. El Contrato de Consultoría está compuesto por 4 fases con un plazo de 15 meses y el Contrato de Interventoría está compuesto por 5 fases con un plazo de 16 meses.

Tabla 3. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría

PLAZO DEL CONTRATO	15 meses		16 meses	
Etapas	De Consultoría		De Interventoría	
Estudios y Diseños	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses
	Elaboración de Factibilidad (según componente)	2 meses	Elaboración de Factibilidad (según componente)	2 meses
	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses
	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	5 meses	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	5 meses
	NA	NA	Recibo	1 mes

Fuente: Datos de los Contratos de Consultoría e Interventoría

La Tabla 4 contiene los datos de los plazos, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensiones y reiniciación que se han presentado en el desarrollo de los contratos de Consultoría e Interventoría, en los cuales se modificaron las fechas de culminación en las fases de factibilidad y estudios y diseños, cabe aclarar que, el plazo total de los contratos se ha modificado al pactado inicialmente (26.4 meses para la Consultoría y 27.4 para la Interventoría).

Tabla 4. Afectaciones en el plazo de los Contratos de Consultoría e Interventoría.

CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	PLAZO	DESCRIPCIÓN	PLAZO
Suspensión No.1	20 días	Suspensión No.1	20 días
Ampliación No.1 a la suspensión No.1	16 días	Ampliación No.1 a la suspensión No.1	16 días
Ampliación No.2 a la suspensión No.1	7 días	Ampliación No.2 a la suspensión No.1	7 días
Suspensión No.2	30 días	Suspensión No.2	30 días
Ampliación No.1 a la Suspensión No.2	20 días	Ampliación No.1 a la Suspensión No.2	20 días
Ampliación No.2 a la Suspensión No.2	17 días	Ampliación No.2 a la Suspensión No.2	17 días
Ampliación No.3 a la Suspensión No.2	10 días	Ampliación No.3 a la Suspensión No.2	10 días
Ampliación No.4 a la Suspensión No.2	7 días	Ampliación No.4 a la Suspensión No.2	7 días
Ampliación No.5 a la Suspensión No.2	7 días	Ampliación No.5 a la Suspensión No.2	7 días
Ampliación No.6 a la Suspensión No.2	7 días	Ampliación No.6 a la Suspensión No.2	7 días
Modificación No.4 (Adición y prórroga)		Modificación No.3 (Adición y prórroga)	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	27 de marzo de 2025

Fuente: Contrato de Consultoría e Interventoría.

Con base a la modificación No.2 del Contrato IDU-1815-2021 y a la modificación No.1 del Contrato IDU-521-2022, los plazos de las Fases se establecieron de la siguiente forma:

Tabla 5. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría.

PLAZO DEL CONTRATO	15 meses		16 meses	
Etapas	De Consultoría		De Interventoría	
Estudios y Diseños	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses
	Elaboración de Factibilidad (según componente)	3 meses	Elaboración de Factibilidad (según componente)	3 meses
	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses
	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses
	NA	NA	Recibo	1 mes

Fuente: Contrato de Consultoría e Interventoría.

Con base a la modificación No.4 del Contrato IDU-1815-2021 y a la modificación No.3 del Contrato IDU-521-2022, los plazos de las Fases se establecieron de la siguiente forma:

Tabla 6. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría.

PLAZO DEL CONTRATO	26.4 meses		27.4 meses	
Etapas	De Consultoría		De Interventoría	
Estudios y Diseños	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses
	Elaboración de Factibilidad (según componente)	10.4 meses	Elaboración de Factibilidad (según componente)	10.4 meses
	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	10 meses	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	10 meses
	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses
	NA	NA	Recibo	1 mes

Fuente: Contrato de Consultoría e Interventoría.

2.2.1 Suspensión No.1

Por medio del comunicado 1026-1815-2021-0313 con el asunto “*Solicitud Suspensión de Contrato IDU 1815 de 2021*”, la Consultoría solicitó de suspensión del Contrato IDU-1815 de 2021, con base a:

(...)”

Con el fin de poder adelantar mesas de trabajo con la Interventoría para replantear los términos en los cuales se presentó la solicitud de prórroga del pasado 9 de noviembre de 2022, solicitamos suspender el contrato por un tiempo de veintiún (21) días calendario, para que se puedan evaluar las causas, los tiempos y las condiciones de la posible prórroga y se evalúe la posibilidad de prorrogar o no.

“(...)”

Por medio del comunicado CIC-IDU-072-1122 con el asunto “*Comunicación 1026-1815-2021-0313 del 2022-11-29, solicitud de suspensión del Contrato IDU 1815 de 2021.*”, radicado en el IDU 20225262088912, la Interventoría conceptuó:

(...)”

teniendo en cuenta una posibilidad de replanteamientos por parte del consultor a su solicitud consideramos procedente la solicitud de suspensión solicitada por el Consultor. Es pertinente aclarar que la suspensión del Contrato de Consultoría IDU 1815 de 2021 conlleva a la suspensión del Contrato de Interventoría IDU-521 de 2022.

Así las cosas, ponemos a consideración de la Entidad las Actas de Suspensión de los Contratos 1815 de 2021 e IDU 521 de 2022, quedando a espera de su aprobación, para proceder de conformidad.

“(...)

El acta No. 2 de suspensión No.1 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 29 de noviembre de 2022 por el plazo de veinte (20) días calendario.

El acta No. 2 de suspensión No.1 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 29 de noviembre de 2022 por el plazo de veinte (20) días calendario.

2.2.2 Ampliación No.1 a la suspensión No.1

El acta No. 4 de ampliación No.1 a la suspensión No.1 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 19 de diciembre de 2022 por el plazo de dieciséis (16) días calendario.

El acta No. 3 de ampliación No.1 a la suspensión No.1 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 19 de diciembre de 2022 por el plazo de dieciséis (16) días calendario.

2.2.3 Ampliación No.2 a la suspensión No.1

El acta No. 5 de ampliación No.2 a la suspensión No.1 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 4 de enero de 2023 por el plazo de siete (7) días calendario.

El acta No. 4 de ampliación No.2 a la suspensión No.1 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 4 de enero de 2023 por el plazo de siete (7) días calendario.

2.2.4 Acta de reinicio

El acta No. 6 de reinicio del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 11 de enero de 2023.

El acta No. 5 de reinicio del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 11 de enero de 2023.

2.2.5 Modificación No.2 al Contrato IDU-1815-2021

La modificación No.2 al contrato IDU-1815-2021 y modificación No.1 al contrato IDU-521-2022, modificó el plazo de las Fases de la siguiente forma:

Tabla 7. Plazos de los Contratos de Consultoría e Interventoría

PLAZO DEL CONTRATO	15 meses		16 meses	
Etapas	De Consultoría		De Interventoría	
Estudios y Diseños	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses
	Elaboración de Factibilidad (según componente)	3 meses	Elaboración de Factibilidad (según componente)	3 meses
	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses
	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses

PLAZO DEL CONTRATO	15 meses		16 meses	
Etapas	De Consultoría		De Interventoría	
	NA	NA	Recibo	1 mes

Fuente: Datos de los Contratos de Consultoría e Interventoría

Por lo anterior, la fecha de finalización de la Fase de Factibilidad fue el 11 de febrero de 2023.

La solicitud para la modificación por parte de la Consultoría fue remitida por medio del comunicado 1026-1815-2021-0331 con el asunto “*Solicitud de Prórroga de la Fase de Factibilidad para evaluación de Alternativas a puntos críticos identificados*” con las siguientes consideraciones:

(...)

Una vez realizada la implantación del trazado geométrico del proyecto establecido en la Prefactibilidad, consistente en una doble calzada con carriles vehiculares de 3.65 m, separador central, dos intersecciones a nivel semaforizadas (Intersección Calle 170 con Carrera 92 e Intersección Carrera 111 o Avenida Corpas) y franja de espacio público de 6.80 m de ancho (ver figura 1.), hemos podido identificar una gran cantidad de puntos críticos de gran complejidad, adicionales a las dos intersecciones (Calle 170 y Av. Corpas) establecidas en la Prefactibilidad, que se enumeran a continuación:

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

- *Intersección Calle 170 – IED SALITRE*
- *Ubicación paraderos y bahías – puentes peatonales – retorno Ciclo-rutas a todo lo largo del corredor vial.*
- *Interferencia tubería VANTI (Gas 14” K 0+000 – K 3+600)*
- *Interferencia Redes Eléctricas de Alta Tensión (K 0+000 al K 3+600 e Intersección Cota)*
- *Intersección Av. Corpas (Carrera 111)*
- *Intersección Av. Borde Norte (Vía Guaymaral)*
- *Intersección Av. Aguas (Carrera 138)*
- *Franja predial no aprovechable (K 4+200 a K 5+000)*
- *Tramo Borde Norte – Cota en 3 carriles por sentido (K 3+300 – K 5+700)*
- *Interferencia tubería TGI (Gas 20” Intersección Cota)*
- *Necesidad de Ampliación de la franja de intervención presentada a la CAR.*

Para resolver las interferencias con infraestructuras de Redes de Gas (14” y 20”) y Redes Eléctricas de Alta Tensión que afectan a todo lo largo del corredor, es necesario llevar a cabo mesas de trabajo con las empresas propietarias de las mismas para concertar la viabilidad técnica y financiera de las posibles soluciones a las interferencias y evitar reproceso posterior a la entrega.

Por lo anterior y con el fin de poder cumplir con la obligación de generar la ingeniería básica de mínimo dos soluciones por cada punto crítico identificado, de alta complejidad o intersección identificada en el proyecto o en la prefactibilidad de conformidad con las exigencias establecidas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.1.4 GUÍA DE MADURACIÓN DE PROYECTOS IDU (GU-FP-04 V1) se hace necesario ampliar el plazo de ejecución de la Fase de Elaboración de Factibilidad por (1) un mes. Dado que la Etapa de Estudios y Diseños está pactada a Valor Global y las actividades a realizar están dentro del Alcance Original del Contrato no se requiere de adición de recursos para el pago correspondiente a los productos a entregar, por lo cual no es necesario modificar el valor del contrato ni la forma de pago.

Para no afectar el plazo total, ni la forma de pago del contrato, sugerimos que este mayor tiempo, requerido para la Fase de Elaboración de Factibilidad se descuenta del plazo de (5) cinco meses establecidos para la fase Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios programando el inicio de algunos trámites de aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales de manera paralela desde la etapa de estudios y diseños.

Con el cambio solicitado quedaría la cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del contrato de la siguiente manera:

CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de QUINCE (15) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo está discriminado así:

ETAPA	FASE	DURACIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS	Investigación, Recopilación y Análisis de información.	2 meses
	Elaboración de Factibilidad (según componente)	3 meses
	Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la Interventoría)	6 meses
	Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de servicios.	4 meses
Total		15 meses

(...)"

Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-029-1222 con radicado IDU 20225262206102, se remitió el concepto en los siguientes términos.

(...)"

Con base al análisis técnicos y jurídicos expuestos a lo largo del presente documento, el Consorcio Interventoría Cota recomienda realizar la modificación correspondiente a los términos desarrollados en la presente, así mismo realizar la modificación del Contrato de Interventoría IDU-521-2022. Así las cosas, se pone a consideración de la Entidad la presente solicitud de modificación al Contrato de Consultoría IDU-1815-2021

Finalmente, el Consorcio Interventoría Cota se permite manifestar que, la viabilidad otorgada a la presente modificación no puede entenderse como la renuncia ni solicitud de archivo de los procesos administrativos que a la fecha se adelantan al interior de la Entidad en contra del Consorcio EYD Cota, pues la viabilidad se emite única y exclusivamente con la finalidad de que se logre el objeto contratado y los fines estatales.

“(...)

2.2.6 Suspensión No.2

Una vez revisados y remitidos los productos de la Fase de Factibilidad por parte de la Interventoría, el día 21 de septiembre de 2023, se generó la suspensión No.2 al Contrato IDU-1815-2021 y al Contrato IDU-521-2022 por el termino de treinta (30) días calendario, dadas las siguientes causas:

(...)”

La presente suspensión se soporta en primera medida en cumplimiento de lo indicado en el numeral 8,3,2 Etapa de Factibilidad, del Manual de Gestión Contractual MG-GC-06 Versión 19 del IDU, así: El IDU contará con el término de treinta (30) días calendario, después de la radicación y previa aprobación del producto por parte del supervisor/interventor, para pronunciarse sobre la factibilidad presentada, con el fin de determinar si se continúa con la etapa de diseños.

En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de consultoría e interventoría del proyecto, hasta por treinta (30) días calendario, para analizar y tomar la decisión para que el proyecto continúe a la Etapa de diseño, sin que genere mayor costo para la (Negrita fuera de texto) lo que representa un tiempo de treinta (30) días calendario, para que la entidad pueda pronunciarse sobre la factibilidad presentada, con el fin de determinar si se continúa con la fase de Estudios y Diseños. Lo anterior, en concordancia también con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión versión 9 en el numeral 10.1.1.

Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta el estado de los productos o informes los cuales fueron radicados en su momento por la Interventoría del Contrato IDU 1815 de 2021 al Instituto, los cuales se relacionan a continuación:

Producto	Estado	Observación (s)
Informe Topografía	Recibido IDU	El día 30 de agosto de 2023, el IDU remitió a la Interventoría el recibido del producto "Informe de Factibilidad de Topografía" en la versión 3 mediante comunicado 202323601501321.
Estudio de tránsito	Atención Secretaria Distrital de Movilidad por parte de la Consultoría	<p>El día 31 de julio de 2023, la Consultoría radicó ante la Secretaria Distrital de Movilidad el Estudio de Tránsito con número 202361203333772.</p> <p>El día 15 de agosto de 2023, se realizó mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Movilidad en la que se presentaron observaciones a micro simulación.</p> <p>El día 30 de agosto de 2023, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-082-0823, el traslado de las observaciones al producto "Estudio Tránsito" en la versión 3, realizadas por correo electrónico por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad.</p> <p>El día 8 de septiembre de 2023, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-015-0923, el traslado de las observaciones al producto "Estudio Tránsito" en la versión 3, realizadas por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad mediante comunicado 202322410123331.</p> <p>El producto "Estudio Tránsito" está en atención de observaciones por parte de la Consultoría.</p>
Informe de Factibilidad Geotecnia	Recibido IDU	El día 18 de agosto de 2023, el IDU recibió el producto "Informe de Factibilidad Geotecnia" en la versión No.7 con comunicado 202323601432581.

Producto	Estado	Observación (s)
Informe de Factibilidad Redes Secas	Radicado IDU	<p>El día 12 de julio de 2023 la interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-036-0723 y bajo consecutivo IDU 202352601121602 el producto "Informe de Factibilidad de Redes Secas y de Gas" en la versión 7.</p> <p>El día 23 de agosto de 2023 la interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-064-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601453642 el producto "Informe ejecutivo de Factibilidad de Redes Secas y de Gas" en la versión 0.</p>
Informe de redes hidrosanitarias	Radicado IDU	<p>El día 9 de agosto de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-025-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601314342 el producto "Informe de Factibilidad de Redes Húmedas" en la versión 7.</p>
Informe de diseño geométrico de vías	Radicado IDU	<p>El día 13 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-025-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601628462 el producto "Informe de Factibilidad de Diseño Geométrico" en la versión 8, en atención a las observaciones del IDU 202323601304601.</p>
Informe de Urbanismo	Radicado IDU	<p>El día 14 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-038-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601637242 el producto "Informe de Factibilidad de Urbanismo" en la versión 9, en atención a las observaciones del IDU 202323601355661.</p>
Informe de estructuras	Radicado IDU	<p>El día 18 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-048-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601655902 el producto "Informe de Factibilidad de Estructuras" en la versión 6, en atención a las observaciones del IDU 202323601367291.</p>

Producto	Estado	Observación (s)
Informe de Factibilidad Estimación de Costos y Presupuestos	Atención observaciones IDU por parte de la Consultoría	<p>El día 11 de septiembre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría mediante comunicado 202323601589171 las observaciones al producto al producto "Informe de Factibilidad de Estimación de Costos y Presupuesto" en la versión No.5.</p> <p>El día 11 de septiembre de 2023, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-024-0923 el traslado del comunicado IDU 202323601589171 con las observaciones al producto al producto "Informe de Factibilidad de Estimación de Costos y Presupuesto" en la versión No.5.</p> <p>El producto "Informe de Factibilidad de Estimación de Costos y Presupuesto" está en atención de observaciones por parte de la Consultoría</p>
Factibilidad BIM	Radicado IDU	El día 21 de julio de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-066-0723 y bajo consecutivo IDU 202352601187362 el producto "Informe de Factibilidad BIM" en la versión 2.
Informe de Factibilidad Pavimentos	Radicado IDU	<p>El día 28 de abril de 2023, el IDU emitió el recibido al producto "Informe de Factibilidad de Pavimentos" en la versión 2 mediante comunicado 20232360606841.</p> <p>De acuerdo con el resultado de las matrices multicriterio se solicitó a la Consultoría actualizar el producto "Informe de Factibilidad de Pavimentos" en la versión 2</p> <p>El día 6 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-010-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601579312 el producto "Informe de Factibilidad de Pavimentos" en la versión 6.</p>
Informe final de la Fase de Factibilidad	Radicado IDU	El día 14 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-040-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601640602 el producto "Informe Final de Factibilidad" en la versión 3.

Producto	Estado	Observación (s)
Informe ejecutivo de la Fase de Factibilidad	Radicado IDU	El día 19 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-053-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601670102 el producto "Informe ejecutivo de Factibilidad" en la versión 1.
Lista de chequeo de la Fase de Factibilidad	Radicado IDU	El día 20 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-060-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601679092 la lista de chequeo de la Fase de Factibilidad en la versión 0.

El Instituto considera oportuno que los Contratos IDU 1815 de 2021 y 521 de 2022 se suspendan por el término de treinta (30) días calendario, con el objetivo de analizar y pronunciarse frente a la factibilidad y eventual continuidad con la fase de estudios y diseños, en consecuencia, las partes de común acuerdo suscriben acta de suspensión que se eleva a escrito en este documento.

"(...).

El acta No. 11 de suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 21 de septiembre de 2023 por el plazo de treinta (30) días calendario.

El acta No. 8 de suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 21 de septiembre de 2023 por el plazo de treinta (30) días calendario.

2.2.7 Ampliación No.1 a la suspensión No.2

El acta No. 12 de ampliación No.1 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 20 de octubre de 2023 por el plazo de veinte (20) días calendario.

El acta No. 9 de ampliación No.1 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 20 de octubre de 2023 por el plazo de veinte (20) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 20 días, plazo que se estableció para que el IDU efectuara el análisis correspondiente y estableciera la viabilidad de continuar con la etapa de estudios y diseños.

2.2.8 Ampliación No.2 a la suspensión No.2

El acta No. 13 de ampliación No.2 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 9 de noviembre de 2023 por el plazo de diecisiete (17) días calendario.

El acta No. 10 de ampliación No.2 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 9 de noviembre de 2023 por el plazo de diecisiete (17) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 17 días, plazo que se estableció para que las partes continuaran con los análisis correspondientes y demás actividades administrativas correspondientes, para concluir la procedencia de continuidad hacia la fase de estudios y diseños.

2.2.9 Ampliación No.3 a la suspensión No.2

El acta No. 14 de ampliación No.3 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 24 de noviembre de 2023 por el plazo de diez (10) días calendario

El acta No. 11 de ampliación No.3 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 24 de noviembre de 2023 por el plazo de diez (10) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 10 días, plazo que se estableció para que las partes continuaran con los análisis correspondientes y demás actividades administrativas correspondientes, para concluir la procedencia de continuidad hacia la fase de estudios y diseños.

2.2.10 Ampliación No.4 a la suspensión No.2

El acta No. 16 de ampliación No.4 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 6 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

El acta No. 13 de ampliación No.4 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 6 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 7 días, plazo que se estableció para que las partes continuaran con los análisis correspondientes y demás actividades administrativas correspondientes, para concluir la procedencia de continuidad hacia la fase de estudios y diseños.

2.2.11 Ampliación No.5 a la suspensión No.2

El acta No. 17 de ampliación No.5 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 13 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

El acta No. 14 de ampliación No.5 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 13 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 7 días, plazo que se estableció para que las partes continuaran con los análisis correspondientes y demás actividades administrativas correspondientes, para concluir la procedencia de continuidad hacia la fase de estudios y diseños.

2.2.12 Ampliación No.6 a la suspensión No.2

El acta No. 18 de ampliación No.3 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-1815-2021 fue firmada el día 20 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

El acta No. 14 de ampliación No.5 a la suspensión No.2 del Contrato-IDU-521-2022 fue firmada el día 20 de diciembre de 2023 por el plazo de diez (7) días calendario.

Conforme a la cláusula 29 del Contrato- IDU-1815-2021 y a la cláusula 26 del contrato IDU-521-2022 se amplía la suspensión entre las partes por un periodo de 7 días, plazo que se estableció para que las partes continuaran con los análisis correspondientes y demás actividades administrativas correspondientes, para concluir la procedencia de continuidad hacia la fase de estudios y diseños.

2.3 Valor inicial del contrato y adiciones.

En la **Tabla 8** está el valor inicial y adiciones de los Contratos de Consultoría e Interventoría, A la fecha del presente informe mensual no se han presentado adiciones a los Contratos de Consultoría e Interventoría, sin embargo se realizaron modificaciones en la forma de pago tanto para el contrato de Interventoría No. 521 de 2022 y para el contrato de Consultoría No.1815 de 2021.

2.3.1 Modificación No. 2 al contrato de Interventoría 521 de 2022 (Forma de Pago)

La Interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA, mediante el oficio CIC-IDU-078-0123 con radicado IDU No. 20235260153302 del 01 de febrero de 2023, solicitó al IDU que sea modificado el contrato de Interventoría IDU-521-2022 y se dé aplicabilidad a la Directriz de la Circular 81 de 2023, mediante la cual se pretende facilitar el pago correspondiente a los requisitos que avalan el trámite.

En consecuencia, se solicitó lo siguiente:

(...)"

en atención a la Circular No.81 de 2023 del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con fecha del 23 de enero de 2023, por la cual se presentan consideraciones y directrices a la forma de pago en los contratos de Interventoría en la Fase de Estudios y Diseños, el CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA, se acoge a la nueva forma de pago y solicita la modificación a la cláusula 8 "Forma de pago" del Contrato IDU-521-2022 que tiene por objeto "Interventoría integral para la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota"

"(...).

Teniendo en cuenta lo anterior el documento se encuentra publicado en el SECOP II con fecha de aprobación del día 22 de marzo de 2023.

2.3.2 Modificación No. 3 al contrato de Consultoría 1815 de 2021.

La Consultoría **CONSORCIO EYD COTA** mediante oficio 1026-1815-2021-0472 del 22 de febrero de 2023, enviado a la Interventoría **CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA**, solicitó la modificación de la cláusula FORMA DE PAGO según dada con Circular 81 de 2023, exponiendo la solicitud en los siguientes términos:

(...)“

Esta Consultoría ha recibido la Circular 81 de 2023 emitida por el director general del IDU, la cual establece directrices sobre la cláusula “Forma de Pago” en los contratos de Consultoría e Interventoría y/o aquella fase de estudios y diseños de los contratos de obra que contemplen la misma en materia de presentación de informes mensuales.

“(…).

De acuerdo con la solicitud realizada por la Consultoría la Interventoría manifestó lo siguiente:

(...)“

CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA, en cumplimiento de sus obligaciones Contractuales y una vez analizadas las directrices de la circular 81 de 2023, así como también la solicitud remitida por la Consultoría, considera pertinente aceptar la solicitud del CONSORCIO EYD COTA en modificar la cláusula 8 Forma de pago del Contrato IDU-1815-2021 que tiene por objeto “Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota”.

“(…).

Así mismo en respuesta a la solicitud realizada por el CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA mediante el oficio CIC-IDU-064-0223 con radicado IDU 20235260319402 del 28 de febrero de 2023, el Instituto de Desarrollo Urbano dio respuesta en los siguientes términos:

(...)”

En atención a la solicitud de modificación No. 3 realizada por la Consultoría y aprobado por la Interventoría, está Subdirección Técnica en su calidad de área supervisora del contrato de Interventoría IDU-521-2022 y encargada del seguimiento al contrato de Consultoría, recomienda al ordenador del gasto proceder con la elaboración de la modificación al Contrato de Consultoría IDU- 1815-2021

“(…).

Teniendo en cuenta lo anterior el documento se encuentra publicado en el SECOP II con fecha de aprobación del día 8 de mayo de 2023.

2.3.3 Modificación No. 4 al contrato de Consultoría 1815 de 2021.

La Consultoría **CONSORCIO EYD COTA** mediante oficio 1026-1815-2021-0865 del 20 de diciembre de 2023, enviado a la Interventoría **CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA**,

solicitó de manera consolidada la recomposición, prórroga y adición del contrato, exponiendo la solicitud en los siguientes términos:

(...)"

Como resultado de los estudios y diseños de la Fase de Factibilidad aprobados por la Interventoría, se modificaron de manera sustancial las soluciones previstas en la prefactibilidad desarrollada por el IDU y que exceden cualquier previsión que se pudiera haber realizado por parte del consultor en marco de la experticia propia y de las visitas a la zona del proyecto durante el tiempo de la presentación de la oferta. Se aumentaron considerablemente las áreas de Diseño Estructural y Diseño Geotécnico, así como las cantidades de Exploración Geotécnica, y el aumento en las Áreas de Influencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA y la Sustracción de la Reserva. Lo anterior impacta directamente sobre la elaboración de todos los productos objeto de los Estudios y Diseños, en su Fase III de detalle, a realizar con el contrato 1815 de 2021.entre otros....

"(...).

La Interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA, mediante comunicación CIC-IDU-013-1223 con radicado IDU 202352602315322 del 22 de diciembre de 2023, revisó la solicitud del contratista, y manifestó lo siguiente:

(...)"

De acuerdo con lo manifestado en el presente comunicado, la Interventoría emite concepto de favorabilidad para la recomposición de las fases, la ampliación de cuatro (4) meses y la adición de \$ 1.115.514.162 para la Fase de Estudios y Diseños en el marco del Contrato IDU-1815-2021.

"(...).

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del Contrato 1815-2021 y Contrato 521-2022 con la adición No.1 quedaron de la siguiente forma:

Tabla 8. Valor inicial del contrato y adiciones

VALOR Y ADICIONES		VALOR Y ADICIONES	
CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13.039.951.981	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.119.988.968
Adición No.1 (Modificación No.4)	\$ 1.115.514.162	Adición No.1 (Modificación No.3)	\$ 1.015.106.215
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$14.155.466.143	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 5.135.082.102

Fuente: Dato de los Contrato de Consultoría e Interventoría

2.4 Sanciones y acciones legales en proceso.

En el transcurso del periodo correspondiente al Informe No.18 no se presentaron sanciones y acciones legales para el contrato de consultoría 1815 de 2021 ni para el contrato de Interventoría 521 de 2022.

Igualmente, se informa que desde la Interventoría se han remitido los siguientes apremios al Consorcio EYD Cota, con el finde conminar al Consultor a dar cumplimiento en los plazos establecidos contractualmente, así:

- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-141-0424 y bajo radicado IDU 202452600815292 del día 3 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No 1 por el avance inadecuado de las perforaciones de geotecnia en campo y falta de evidencia de toma de muestras.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-011-0524 y bajo radicado IDU 202452600843332 del día 7 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No 2 por el avance inadecuado de las perforaciones de geotecnia en campo y falta de evidencia de toma de muestras.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-021-0524 y bajo radicado IDU 202452600911312 del día 20 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.1 por la no presentación de los informes mensuales de Consultoría No.17.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-023-0524 y bajo radicado IDU 202452600911132 del día 20 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.1 por la no presentación de los informes mensuales SST de Consultoría No.15 y 16.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-035-0524 y bajo radicado IDU 202452600891262 del 17 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No. 2 – Incumplimiento de compromisos de la mesa de trabajo de avance.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-036-0524 y bajo radicado IDU 202452600891402 del día 17 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No. 1 – Incumplimiento de compromisos de comité técnico de seguimiento No.70.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-041-0524 y bajo radicado IDU 202452600907922 del día 20 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.2 por la no presentación de productos de Redes Húmedas en la versión inicial.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-042-0524 y bajo radicado IDU 202452600908072 del día 20 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.1 por la no presentación de la hoja de vida del Especialista Hidráulico.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-043-0524 y bajo radicado IDU 202452600908192 del día 20 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.1 por la no presentación de la hoja de vida Biólogo Ornitólogo para EIA y Biólogo Ornitólogo Sustracción Reserva.”*.
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-064-0524 y bajo radicado IDU 202452600939882 del día 24 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría *“Apremio No.2 por la no presentación de los informes mensuales SST de Consultoría No.17.”*.

- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-065-0524 y bajo radicado IDU 202452600939902 del día 24 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría “*Apremio No.1 por la no respuesta al comunicado IDU 202417500574441.*”
- Por medio del comunicado de Interventoría CIC-IDU-075-0524 y bajo radicado IDU 202452600961922 del día 28 de mayo de 2024, se remitió a la Consultoría “*Apremio No. 1 – Incumplimiento de compromisos de comité técnico de seguimiento No. 71.*”

2.5 Garantías, certificados de modificación y vigencias

A continuación, se muestran las pólizas vigentes para los contratos de Consultoría e Interventoría.

2.5.1 Pólizas Contrato IDU-1815-2021

Las garantías, certificados de modificación y vigencias del Contrato IDU 1815 de 2021 son:

Tabla 9. Contrato Consultoría – Garantías, certificados de modificación y vigencias

GARANTÍAS					
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado	Porcentaje Asegurado	Vigencia
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	02/11/2025	\$4.246.639.842,90	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.	Desde la aprobación de la garantía y el termino de duración del contrato y ocho meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2022	02/03/2028	\$1.415.546.614,30	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	Desde la aprobación de la garantía única por el plazo del contrato y tres (3) años más.
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2022	02/03/2028	\$4.246.639.842,90	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato	Igual al plazo del contrato y tres (3) años más a partir del acta de terminación del contrato.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2022	02/03/2025	\$ 707.773.307,15	5% del valor del contrato	Desde la aprobación de la garantía única y por el plazo del contrato.

Fuente: Pólizas del Contrato de Consultoría

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 33-44-101221349: ANEXO No. 19 expedido por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. del 09/01/2024. En este Anexo, la Aseguradora en aclaraciones hace constar que tiene conocimiento de la modificación No.4.

PÓLIZA DE RCE No. 33-40-101066861: ANEXO No. 16 expedido por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. del 09/01/2024. En este Anexo, la Aseguradora en aclaraciones hace constar que tiene conocimiento de la de la modificación No.4.

En la Tabla 10 y Tabla 11 se muestra el estado y la trazabilidad de la Póliza De Cumplimiento No. 33-44-101221349 y póliza de RCE No. 33-40-101066861 del contrato de Consultoría 1815 de 2021.

Tabla 10. Estado de póliza de cumplimiento No. 33-44-101221349 Contrato IDU 1815 de 2021.

Acta	Anexo	Consecutivo Consultoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.1 - Acta Inicio	3	1026-1815-2021-0101	2/9/2022	20225261562512	5 de septiembre de 2022
Modificación No.1	3	1026-1815-2021-0101	2/9/2022	20225261562512	5 de septiembre de 2022
Acta No.2 - Suspensión No.1	4	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No.2 - Suspensión No.1	5	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 4 - Ampliación de Suspensión	4	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 4 - Ampliación de Suspensión	5	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 5 - Ampliación de Suspensión	6	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 5 - Ampliación de Suspensión	7	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 6 - Reinicio	6	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 6 - Reinicio	7	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Modificación No.2	8	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Modificación No.3	11	1026-1815-2021-0660	1/6/2023	20235260881612	6 de junio de 2023
Acta No.11 - Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.12 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.13 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.11 - Suspensión No.2	15	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.12 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	15	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.13 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	15	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	16	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.16 - Ampliación No. 4 Suspensión No.2	16	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.17 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	16	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.18 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	16	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	17	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.16 - Ampliación No. 4 Suspensión No.2	17	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.17 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	17	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Acta	Anexo	Consecutivo Consultoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.18 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	17	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Modificación No.4	18	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Modificación No.4	19	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

Tabla 11. Estado de póliza RCE No. 33-40-101066861-5 Contrato IDU 1815 de 2021.

Acta	Anexo	Consecutivo Consultoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.1 - Acta Inicio	4	1026-1815-2021-0101	2/9/2022	20225261562512	5 de septiembre de 2022
Modificación No.1	4	1026-1815-2021-0101	2/9/2022	20225261562512	5 de septiembre de 2022
Acta No.2 - Suspensión No.1	5	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 4 - Ampliación de Suspensión	5	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 5 - Ampliación de Suspensión	6	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Acta No. 6 - Reinicio	6	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Modificación No.2	7	1026-1815-2021-0497	8/3/2023	20235260371802	23 de marzo de 2023
Modificación No.3	10	1026-1815-2021-0660	1/6/2023	20235260881612	6 de junio de 2023
Acta No.11 - Suspensión No.2	13	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.12 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	13	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.13 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	13	1026-1815-2021-0889	5/1/2024	202452600022052	12 de febrero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.16 - Ampliación No. 4 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.17 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Acta No.18 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	14	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Modificación No.4	15	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024
Modificación No.4	16	1026-1815-2021-0896	10/1/2024	202452600039002	12 de febrero de 2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

2.5.2 Pólizas Contrato IDU-521-2022

Las garantías, certificados de modificación y vigencias del Contrato IDU 521 de 2022 son:

Tabla 12. Contrato Interventoría – Garantías, certificados de modificación y vigencias

GARANTÍAS					
Garantía	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor Asegurado	Porcentaje Asegurado	Vigencia
CUMPLIMIENTO	01/08/2022	19/04/2025	\$ 1.235.996.690	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.	Desde la aprobación de la garantía y el termino de duración del contrato y ocho meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2022	19/08/2027	\$ 411.998.897	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	Desde la aprobación de la garantía única por el plazo del contrato y tres (3) años más.
CALIDAD DEL SERVICIO	19/08/2022	19/08/2027	\$ 1.235.996.690	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato	Igual al plazo del contrato y tres (3) años más a partir del acta de terminación del contrato.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/08/2022	19/08/2024	\$ 464.000.000	Cuatrocientos (400) SMMLV	Desde la aprobación de la garantía única y por el plazo del contrato.

Fuente: Pólizas del Contrato de Interventoría

- **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101211723:** Anexo No. 27 expedida por Seguros del Estado S.A. el 10/01/2024. En este anexo la Aseguradora conoce el Acta No 15 de Ampliación a la Suspensión y Prórroga No. 1, Adición No. 1 y Modificación No. 3.
- **PÓLIZA DE RCE No. 65-40-101065034** Anexo No. 18 expedida por Seguros del Estado S.A. el 18/01/2024. En este anexo la Aseguradora ajusta el valor asegurado según el SMMLV del año 2024.

En la Tabla 13 y Tabla 14 se puede evidenciar el estado y la trazabilidad de la Póliza De Cumplimiento No. 65-44-101211723 y póliza de RCE No. 65-40-101065034 del contrato de Interventoría 521 de 2022.

Tabla 13. Estado de póliza de cumplimiento No. 65-44-101211723 Contrato IDU 521 de 2022

Acta	Anexo	Consecutivo Interventoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.1 - Acta Inicio	1	CIC-IDU-025-0822	24/8/2022	20225261501352	5 de septiembre de 2022
Acta No.1 - Acta Inicio	2	CIC-IDU-025-0822	24/8/2022	20225261501352	5 de septiembre de 2022
Acta No.2 - Suspensión No.1	3	CIC-IDU-026-1222	13/12/2022	20225262163372	19 de diciembre de 2022
Acta No.2 - Suspensión No.1	4	CIC-IDU-026-1222	13/12/2022	20225262163372	19 de diciembre de 2022
Acta No. 3 - Ampliación No. 1 a la Suspensión 1	5	CIC-IDU-004-0123	4/1/2023	20235260009792	18 de enero de 2023

Acta	Anexo	Consecutivo Interventoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No. 3 - Ampliación No. 1 a la Suspensión 1	6	CIC-IDU-004-0123	4/1/2023	20235260009792	18 de enero de 2023
Acta No. 4 - Ampliación No. 2 a la Suspensión 1	7	CIC-IDU-028-0523	12/5/2023	20235260757672	29 de mayo de 2023
Acta No. 4 - Ampliación No. 2 a la Suspensión 1	8	CIC-IDU-028-0523	12/5/2023	20235260757672	29 de mayo de 2023
Acta No. 5 - Reinicio	11	CIC-IDU-054-0523	24/5/2023	20235260823642	29 de mayo de 2023
Modificación No.1	9	CIC-IDU-003-0323	1/3/2023	20235260332662	29 de mayo de 2023
Modificación No.2	10	CIC-IDU-076-0323	27/3/2023	20235260478862	29 de mayo de 2023
Aclaración modificaciones	11	CIC-IDU-054-0523	24/5/2023	20235260823642	29 de mayo de 2023
Acta No.8 - Suspensión No.2	12	CIC-IDU-005-1023	20/10/2023	202352601887082	24 de octubre de 2023
Acta No.8 - Suspensión No.2	13	CIC-IDU-005-1023	20/10/2023	202352601887082	24 de octubre de 2023
Acta No.9 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	14	CIC-IDU-007-1123	21/11/2023	202352602098242	4 de diciembre de 2023
Acta No.9 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	15	CIC-IDU-007-1123	21/11/2023	202352602098242	4 de diciembre de 2023
Acta No.10 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	16	CIC-IDU-006-1223	14/12/2023	202352602251532	4 de enero de 2024
Acta No.10 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	17	CIC-IDU-006-1223	14/12/2023	202352602251532	4 de enero de 2024
Acta No.10 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	18	CIC-IDU-006-1223	14/12/2023	202352602251532	4 de enero de 2024
Acta No.11 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	19	CIC-IDU-007-1223	14/12/2023	202352602252162	4 de enero de 2024
Acta No.11 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	20	CIC-IDU-007-1223	14/12/2023	202352602252162	4 de enero de 2024
Acta No.13 - Ampliación No. 4 Suspensión No.2	21	CIC-IDU-011-1223	23/12/2020	202352602289962	15 de enero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	22	CIC-IDU-014-1223	27/12/2023	202352602335502	15 de enero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	23	CIC-IDU-014-1223	27/12/2023	202352602335502	15 de enero de 2024
Acta No.15 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	24	CIC-IDU-028-0124	10/1/2024	202452600037912	2 de febrero de 2024
Acta No.15 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	25	CIC-IDU-028-0124	10/1/2024	202452600037912	2 de febrero de 2024
Modificación No.3	26	CIC-IDU-038-0124	12/1/2024	202452600053092	2 de febrero de 2024
Modificación No.3	27	CIC-IDU-038-0124	12/1/2024	202452600053092	2 de febrero de 2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

Tabla 14. estado de Póliza RCE No. 65-40-101065034 del contrato de Interventoría 521 de 2022.

Acta	Anexo	Consecutivo Interventoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.1 - Acta Inicio	1	CIC-IDU-025-0822	24/8/2022	20225261501352	
Acta No.1 - Acta Inicio	2	CIC-IDU-025-0822	24/8/2022	20225261501352	5 de septiembre de 2022

Acta	Anexo	Consecutivo Interventoría	Fecha radicado	Radicado IDU	Fecha aprobación IDU
Acta No.2 - Suspensión No.1	3	CIC-IDU-026-1222	13/12/2022	20225262163372	19 de diciembre de 2022
Acta No. 3 - Ampliación 1 a la Suspensión	4	CIC-IDU-004-0123	4/1/2023	20235260009792	18 de enero de 2023
Acta No. 4 - Ampliación 2 a la Suspensión	5	CIC-IDU-028-0523	12/5/2023	20235260757672	29 de mayo de 2023
Acta No. 4 - Ampliación 2 a la Suspensión	6	CIC-IDU-066-0323	23/3/2023	20235260456922	29 de mayo de 2023
Acta No. 5 - Reinicio	9	CIC-IDU-054-0523	24/5/2023	20235260823642	29 de mayo de 2023
Modificación No.1	7	CIC-IDU-003-0323	1/3/2023	20235260332662	29 de mayo de 2023
Modificación No.2	8	CIC-IDU-076-0323	27/3/2023	20235260478862	-
Aclaración modificaciones	9	CIC-IDU-054-0523	24/5/2023	20235260823642	29 de mayo de 2023
Acta No.8 - Suspensión No.2	10	CIC-IDU-005-1023	20/10/2023	202352601887082	24 de octubre de 2023
Acta No.9 - Ampliación No. 1 Suspensión No.2	11	CIC-IDU-007-1123	21/11/2023	202352602098242	4 de diciembre de 2023
Acta No.10 - Ampliación No. 2 Suspensión No.2	12	CIC-IDU-006-1223	14/12/2023	202352602251532	4 de enero de 2024
Acta No.11 - Ampliación No. 3 Suspensión No.2	13	CIC-IDU-007-1223	14/12/2023	202352602252162	4 de enero de 2024
Acta No.13 - Ampliación No. 4 Suspensión No.2	14	CIC-IDU-011-1223	23/12/2020	202352602289962	15 de enero de 2024
Acta No.14 - Ampliación No. 5 Suspensión No.2	15	CIC-IDU-014-1223	27/12/2023	202352602335502	15 de enero de 2024
Acta No.15 - Ampliación No. 6 Suspensión No.2	16	CIC-IDU-028-0124	10/1/2024	202452600037912	2 de febrero de 2024
Modificación No.3	17	CIC-IDU-038-0124	12/1/2024	202452600053092	2 de febrero de 2024
Modificación No.3	18	CIC-IDU-057-0124	19/1/2024	202452600110052	2 de febrero de 2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

2.6 Modificaciones al contrato

El Contrato IDU-1815-2021 presentó cuatro (4) modificaciones y el Contrato IDU-521-2022 presentó tres (3) modificaciones a corte del presente informe.

Tabla 15. Modificaciones a los Contratos de Consultoría e Interventoría

MODIFICACIONES					
CONSULTOR			INTERVENTOR		
Modificatorio	Fecha	Observaciones	Modificatorio	Fecha	Observaciones
1	29 de julio de 2022	Modificar la CLAUSULA 1. Numeral 2.2. EQUIPO DE ESPECIALISTAS Y DE APOYO TÉCNICO DEL ANEXO – REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO	1	12 de enero de 2023	Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, AJUSTANDO EL PLAZO DE LA FASE DE FACTIBILIDAD A 3 MESES Y APROBACIONES A 4 MESES, MANTENIENDO EL PLAZO TOTAL EN 16 MESES.
2	12 de enero de 2023	Modificar la CLÁUSULA 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,	2	22 de marzo de 2023	Modificar el numeral 3 del párrafo Segundo de la Cláusula 8 denominada

MODIFICACIONES					
CONSULTOR			INTERVENTOR		
Modificadorio	Fecha	Observaciones	Modificadorio	Fecha	Observaciones
		AJUSTANDO EL PLAZO DE LA FASE DE FACTIBILIDAD A 3 MESES Y APROBACIONES A 4 MESES, MANTENIENDO EL PLAZO TOTAL EN 15 MESES.			FORMA DE PAGO, de conformidad con lo establecido en la Circular 81 de 2023.
3	8 de mayo de 2023	Modificar el contrato IDU-1815 de 2021 en su Cláusula 8 denominada FORMA DE PAGO, parágrafo Segundo, numeral 3 del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Circular 81 de 2023	3	28 de diciembre de 2023	Modificación prorroga 1 y adición 1 al contrato.
4	28 de diciembre de 2023	Modificación prorroga 1 y adición 1 al contrato.			
Notas: N/A			Notas: N/A		

Fuente: Documentos del Contrato de Consultoría e Interventoría.

2.7 Copia de las actas suscritas durante el período, junto con sus soportes.

Durante el transcurso del presente periodo, no se generaron actas para los contratos de Consultoría IDU 1815 de 2021, ni para el contrato de Interventoría No. 521 de 2022.

A continuación, se presente la trazabilidad de actas suscritas dentro del desarrollo del contrato: de pago

Tabla 16. Relación de actas suscritas

RELACIÓN DE ACTAS LEGALES									
CONSULTOR					INTERVENTOR				
Nº	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	Nº	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta de Inicio	01/08/2022	NA	NA	1	Acta de Inicio	01/08/2022	NA	NA
2	Acta de suspensión	29/11/2022	NA	Suspensión de 20 días calendario.	2	Acta de suspensión	29/11/2022	NA	Suspensión de 20 días calendario.
3	Acta de pago No.1	02/12/2022	\$406.587.560	Pago No.1	3	Acta de ampliación No.1 a la suspensión No.1	19/12/2022	NA	
4	Acta de ampliación No.1 a la suspensión No.1	19/12/2022	NA	Suspensión de 16 días calendario.	4	Acta de ampliación No.2 a la suspensión No.1	04/01/2023	NA	Suspensión de 16 días calendario.
5	Acta de ampliación No.2 a la suspensión No.1	04/01/2023	NA	Suspensión de 7 días calendario.	5	Acta de reinicio	11/01/2023	NA	Suspensión de 7 días calendario.
6	Acta de reinicio	11/01/2023	NA		6	Acta de pago No.1	05/04/2023	\$190.195.227	Pago No. 1
7	Acta de pago No.2	10/04/2023	\$273.559.132	Pago No.2	7	Acta de pago No.2	05/05/2023	\$77.189.179	Pago No. 2

RELACIÓN DE ACTAS LEGALES

CONSULTOR					INTERVENTOR				
N°	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	N°	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
8	Acta de pago No.3	08/05/2023	\$10.754.117	Pago No.3	8	Acta de suspensión No.2	21/09/2023	NA	Suspensión de 30 días calendario
9	Acta de pago No.4	05/06/2023	\$567.120.921	Pago No.4	9	Acta de ampliación No.1 a la suspensión No.2	20/10/2023	N/A	Suspensión de 20 días calendario
10	Acta de pago No.5	06/07/2023	\$409.680.648	Pago No.5	10	Acta de ampliación No.2 a la suspensión No.2	9/11/2023	N/A	Suspensión de 17 días calendario
11	Acta de suspensión No.2	21/09/2023	NA	Suspensión de 30 días calendario	11	Acta de ampliación a la suspensión No.2	24/11/2023	N/A	Suspensión de 10 días calendario
12	Acta de ampliación a la suspensión No.2	20/10/2023	N/A	Suspensión de 20 días calendario	12	Acta de suspensión No.2	11/12/2023	\$66.395.043	Pago No. 3
13	Acta de ampliación a la suspensión No.2	9/11/2023	N/A	Suspensión de 17 días calendario	13	Acta de ampliación a la suspensión No.2	6/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario
14	Acta de ampliación a la suspensión No.2	24/11/2023	N/A	Suspensión de 10 días calendario	14	Acta de ampliación a la suspensión No.2	13/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario
15	Acta de pago No.6	04/12/2023	\$94.079.169	Pago No.6	15	Acta de ampliación a la suspensión No.2	20/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario
16	Acta de ampliación a la suspensión No.2	6/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario	16	Acta de pago numero 4	11/04/2024	\$129.729.712	Pago No. 4
17	Acta de ampliación a la suspensión No.2	13/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario					
18	Acta de ampliación a la suspensión No.2	20/12/2023	N/A	Suspensión de 7 días calendario					
19	Acta de cambio de etapa FAC a EYD	28/12/2023	N/A						
20	Acta de pago No 7	03/05/2024	Vr Acta: \$216.157.752	Pago No.7					
			Descuento No.1: \$ 77.189.179	Descuento No. 1					

Fuente: Documentos del Contrato de Consultoría e Interventoría

2.8 Convenios asociados

Los Convenios Asociados vigentes con las diferentes ESP y Entidades a la fecha del presente informe son:

- Gas Natural S.A. ESP 20210906 IDU-853-2016 Prórroga 1 Convenio IDU-GAS NATURAL (VANTI).

- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 20201218 IDU-1069-2016 Otrosí modificadorio 1 al CONVENIO IDU-ETB.
- Codensa S.A. ESP 20210823 IDU-849-2016 Prórroga 1 al CONVENIO IDU-CODENSA
- Colombia Telecomunicaciones 01. Convenio IDU 1454 de 2017.
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado 01. Convenio IDU 1450 – 2017.

Además, de los convenios mencionados anteriormente, también se cuenta con los convenios 1356 de 2021 (Convenio Marco) y 1573 de 2022 (Convenio Derivado) suscritos entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cota.

3 BALANCE Y ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

En el capítulo 3 de balance y estado financiero del Contrato de Consultoría e Interventoría, se presenta el estado financiero, el número CDP y número CRP y la relación de actas de pago y órdenes de pago.

3.1 Estado Financiero


El control financiero en el formato del IDU “FO-EO-46” de los contratos de Consultoría y de Interventoría está en el Anexo 8.6.

Para el periodo del presente se generó el acta No. 20 de cobro para el contrato de Consultoría 1815 de 2021 por valor de \$216.157.752.


Tabla 17. Estado financiero

CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	
		ACTA	VALOR
Valor Inicial	\$ 13.039.951.981,00	Valor Inicial	\$ 4.119.988.968,00
Adición No. 1	\$ 1.115.514.162,00	Adición No. 1	\$ 1.015.093.134,00
Valor actual contrato	\$ 14.155.466.143,00	Valor actual contrato	\$ 5.135.082.102,00
Valor cobrado	\$ 1.977.939.300,00	Valor cobrado	\$ 333.779.449,00
Valor pendiente por cobrar	\$ 12.177.526.843,00	Valor pendiente por cobrar	\$ 4.801.302.653,00

Grafica 1. Estado financiero Consultoría

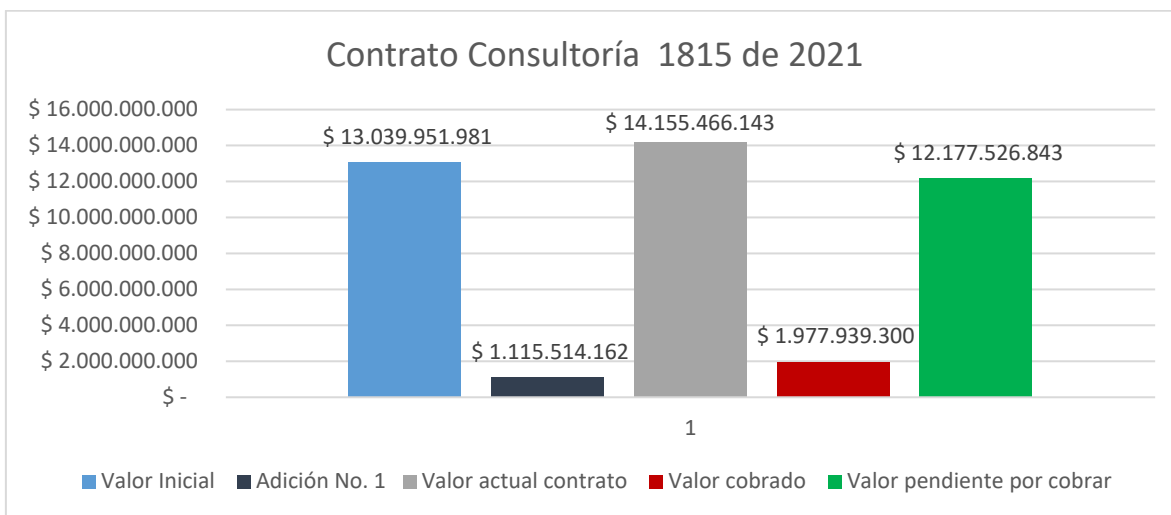

Grafica 2. Estado financiero Interventoría

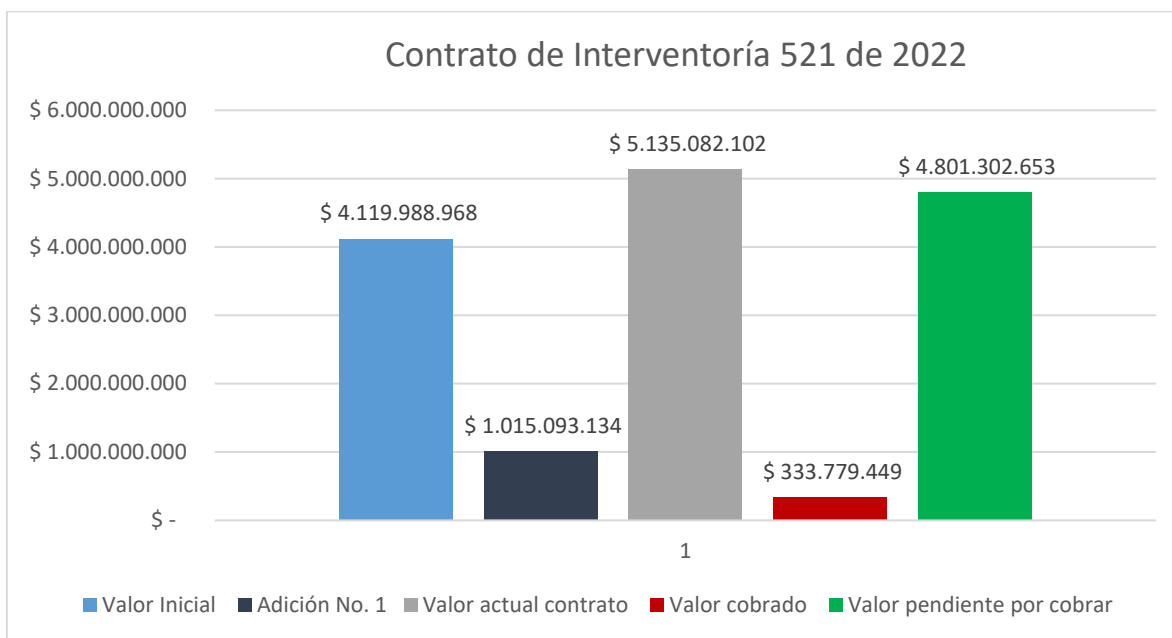

Fuente: Consorcio Interventoría Cota

3.1.1 Actas de Pago Consultoría.

3.1.1.1 Acta No.3 - Pago No.1 de la Consultoría.

El Acta No.3 - Pago No.1 de la Consultoría contempla:

- Informe mensual de Consultoría No. 1 (01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022).
- Producto RAI Topografía.
- Producto RAI Predios.
- Producto RAI Tránsito y Transporte.
- Producto RAI Urbanismo y Espacio Público.
- Producto RAI BIC.
- Producto Plan Diálogo Ciudadano.

El valor del Acta No.3 - Pago No.1 es de \$406.587.561 con fecha del 2 de febrero de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS No. 378 del 09/02/2023.

3.1.1.2 Acta No.7 - Pago No.2 de la Consultoría.

El Acta No.7 - Pago No.2 de la Consultoría contempla:

- Informe mensual de Consultoría No. 2 (01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022).
- Producto RAI Diseño Geométrico de vías.
- Producto RAI Diseño de Redes Acueducto Y Alcantarillado.

- Producto RAI, y plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias – Componente de Geotecnia.
- Producto RAI, Informe de Recopilación de información, Plan de exploración. Análisis interdisciplinarios previos, Investigación, recopilación y análisis de información existente, Inventario y diagnóstico preliminar de la infraestructura existente, Plan de investigación geotécnica complementaria, Plan de inventario y diagnóstico de vías, Plan de inventario y diagnóstico de espacio público, Metodología. - Componente de Pavimentos.
- Producto Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (Georreferenciados). – Estudios Sociales.

El valor del Acta No.7 - Pago No.2 es de \$273.559.132 con fecha del 10 de abril de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 1065 del 13/04/2023.

3.1.1.3 Acta No.8 - Pago No.3 de la Consultoría

El Acta No.8 - Pago No.3 de la Consultoría contempla:

- Cálculo del tránsito promedio diario (TPD)

El valor del Acta No.8 - Pago No.3 es de \$10.754.117 con fecha del 8 de mayo de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 1325 del 11/05/2023.

3.1.1.4 Acta No.9 – Pago No.4 de la Consultoría

El Acta No.9 - Pago No.4 de la Consultoría contempla:

- Informe mensual de Consultoría No. 3 (01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022).
- Informe mensual de Consultoría No. 4 (01 de noviembre de 2022 al 29 de noviembre de 2022).
- Topografía – Trabajo de campo (Georreferenciación, marco de referencia, nivelación, detalles – nube de puntos).
- BIC - Documento de valoración y criterios de intervención BIC

El valor del Acta No.9 - Pago No.4 es de \$ 567.120.921,00 con fecha del 5 de junio de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 1612 del 08/06/2023.

3.1.1.5 Acta No.10 – Pago No.5 de la Consultoría

El acta No.10 – Pago No.5 de la Consultoría contempla:

- Informe mensual de Consultoría No. 5 (11 de enero de 2023 al 12 de febrero de 2023).
- Informe mensual de Consultoría No. 6 (13 de febrero de 2023 al 12 de marzo de 2023).

El valor del Acta No.10 - Pago No.5 es de \$ 409.680.648,00 con fecha del 6 de julio de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 2046 del 11/07/2023.

3.1.1.6 Acta No.15 – Pago No.6 de la Consultoría

El acta No.15 – Pago No.6 de la Consultoría contempla:

- Ensayos de geotecnia de la Fase de Factibilidad.

El valor del Acta No.15 - Pago No.6 es de \$94.079.169 con fecha del 4 de diciembre de 2023.

3.1.1.7 Acta No.20 – Pago No.7 de la Consultoría

El acta No.20 – Pago No.7 de la Consultoría contempla:

- Componente de Topografía para la etapa de estudios y diseños
- Plan de dialogo Ciudadano

El valor del acta No 20- Pago No.7 es de \$216.157.752 con fecha del 03 de mayo de 2024

3.1.2 Actas de pago Interventoría

3.1.2.1 Acta No.6 - Pago No.1 de la Interventoría

El Acta No.6 - Pago No.1 de la Interventoría contempla:

- Informe mensual de Interventoría No. 1 (01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022).
- Producto RAI Topografía.
- Producto RAI Predios.
- Producto RAI Tránsito y Transporte.
- Cálculo del tránsito promedio diario (TPD) Tránsito y Transporte.
- Producto RAI Diseño Geométrico de vías.
- Producto RAI Urbanismo y Espacio Público.
- Producto RAI Diseño de Redes Acueducto Y Alcantarillado.
- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST – ESTUDIOS AMBIENTALES -SST – FORESTAL.
- Producto RAI, Informe de Recopilación de información, Plan de exploración. Análisis interdisciplinarios previos, Investigación, recopilación y análisis de información existente, Inventario y diagnóstico preliminar de la infraestructura existente, Plan de investigación geotécnica complementaria, Plan de inventario y diagnóstico de vías, Plan de inventario y diagnóstico de espacio público, Metodología. - Componente de Pavimentos.
- Producto Plan Diálogo Ciudadano.
- Producto Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (Georreferenciados). – Estudios Sociales.

El valor del Acta No.6 - Pago No.1 de Interventoría es de \$190.195.227 con fecha del 5 de abril de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 1013 del 12/04/2023.

3.1.2.2 Acta No.7 - Pago No.2 de la Interventoría

El Acta No.7 - Pago No.2 de la Interventoría contempla:

- Informe mensual de Interventoría No. 2 (01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022).

El valor del Acta No.7 - Pago No.2 de Interventoría es de \$77.189.179 con fecha del 5 de mayo de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 1257 del 10/05/2023.

3.1.2.3 Acta No.12 - Pago No.3 de la Interventoría

El Acta No 12 – Pago No 3 de la interventoría contempla:

- Producto de Topografía
- Producto de Arqueología y Bienes de interés Cultural (Recopilación Información BIC)
- Producto de Arqueología y Bienes de interés Cultural (Valoración y criterios de intervención BIC)

El valor del Acta No.12 - Pago No.3 de Interventoría es de \$66.395.043 con fecha del 27 de noviembre de 2023 con consecutivo de SIGPAGOS 4014 del 11/12/2023.

3.1.2.4 Acta No 16 – Pago No 4 de la Interventoría

El Acta No 16- pago No 4 de la interventoría contempla:

- Informe social No 3 y No 4
- Informe Técnico No 3 y No 4
- Informe Ambiental No 3 y No 4
- Informe SST No 3 y No 4

El valor del Acta No. 16 – Pago No 4 de interventoría es de \$129.729.712 con fecha del 4 de marzo de 2024 con consecutivo de SIGPAGOS 959 del 11/04/2024.

3.2 Número de CDP

El número del CDP del Contrato de Consultoría 1815-2021 es:

Tabla 18. CDP Contrato IDU 1815-2021

CDP No. Fecha	FECHA DE EXPEDICIÓN	PROYECTO	RUBRO	VALOR
4543	15/10/2021	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$11.012.942.546
4546	15/10/2021	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$2.027.009.435
6342	15/12/2023	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$1.115.514.162
TOTAL				\$ 14.155.466.143

El número del CDP del Contrato de Interventoría IDU-521-2022

Tabla 19. CPD IDU-521-2022

CDP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
1174 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$3.334.575.341
1207 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$169.254.827
1208 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$616.158.800
6343 15/12/2023	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$1.015.106.215
TOTAL			\$ 5.135.082.102

Fuente: documentos IDU

3.3 Número CRP

El número de CRP del Contrato de Consultoría 1815-2021 es:

Tabla 20. CRP Contrato IDU 1815-2021

CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
5009 (28/12/2021)	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$11.012.942.546
5010 (28/12/2021)	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$2.027.009.435
5958 (30/12/2023)	Vía Suba-Cota - Limite - Distr-Av San José	133011604490000007763	\$1.115.514.162
TOTAL			\$ 14.155.466.143

Fuente: documentos ID

El CRP del Contrato de Interventoría IDU-521-2022 es:

Tabla 21. CRP Contrato IDU-521-2022

CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
2439 - 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$3.334.575.341
2440 - 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$169.254.827
2441 - 22/06/2022	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$616.158.800
5962- 30/12/2023	Vía Suba-Cota	023011604490000007763	\$1.015.093.134
TOTAL			\$ 5.135.082.102

Fuente: documentos IDU

3.4 Relación de actas de pago y órdenes de pago

A la fecha de corte del presente informe se han generado las siguientes actas de pago para el contrato de Interventoría:

1. Acta No.6 – Pago No. 1 para el contrato de Interventoría.
2. Acta No.7 – Pago No. 2 para el contrato de Interventoría.
3. Acta No 12 – Pago No. 3 para el contrato de Interventoría
4. Acta No.16 – Pago No.4 para el contrato de Interventoría.

Tabla 22. Actas y Ordenes de pago de Interventoría generadas.

Acta No.	Pago No.	Fecha Acta	Valor del Acta	Orden de Pago No.	Fecha Orden de Pago
6	1	5/04/2023	\$190.195.227	1013	12/04/2023
7	2	05/05/2023	\$77.189.179	1257	10/05/2023
12	3	27/11/2023	\$66.395.043	4014	11/12/2023
16	4	4/03/2024	\$129.729.712	959	11/04/2024.

Fuente: Documentos del Contrato de Interventoría.

Para el contrato de Consultoría se han generado las siguientes actas de pago a la fecha de corte del presente informe:

1. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.3 - Pago No.1
2. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.7 - Pago No.2.
3. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.8 - Pago No.3.
4. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.9 - Pago No.4.
5. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.10 - Pago No.5.
6. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No.15 - Pago No.6.
7. El Contrato de la Consultoría generó el Acta No. 20 - Pago No.7.

Tabla 23. Actas y Ordenes de pago de Consultoría generadas.

Acta No.	Pago No.	Fecha Acta	Valor del Acta	Orden de Pago No.	Fecha Orden de Pago
3	1	02/02/2023	\$406.587.561	378	09/02/2023
7	2	10/04/2023	\$273.559.132	1065	13/04/2023
8	3	08/05/2023	\$10.754.117	1325	11/05/2023
9	4	05/06/2023	\$567.120.921	1612	08/06/2023
10	5	06/07/2023	\$409.680.648	2046	11/07/2023
15	6	04/12/2023	\$ 94.079.169	4146	7/12/2023.
20	5	3/05/2024	\$216.157.752	1002	10/05/2024.

Fuente: Documentos del Contrato de Consultoría.

3.5 Incluir costos de investigación y diagnóstico de redes. Ejecución de recursos para redes discriminando costos con cargo al IDU y con cargo a cada ESP (adjuntando los Soportes).

En razón a que el proyecto está en el quinto mes de la Fase de Estudios y Diseños a corte del presente informe, no se tiene los costos de investigación y diagnóstico de redes. Ejecución de recursos para redes discriminando costos con cargo al IDU y con cargo a cada ESP

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

En la información técnica se relaciona el personal de la Consultoría e Interventoría, en la información está el cargo, nombre, cédula y profesión.

4.1 Relación del personal Interventoría

La relación del personal de Interventoría a corte del 31 de mayo de 2024 se puede visualizar en la Tabla 24, para el presente periodo se recibió el siguiente comunicado por parte del IDU:

Tabla 24. Relación del personal del Contrato de Interventoría.

No.	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	Aprobación IDU	Estado del profesional	Nombre base de datos IDU	Cédula
	DIRECTOR/COORDINACIÓN				
1	Director de la Interventoría	202423600010291	Activo	William Enrique Malaver Bello	79.186.706
2	Coordinador de la Interventoría	20222361446691	Activo	Jorge Sebastián Caro Mesa	1.057.580.338
	LEGAL-FINANCIERO-CONTABLE				
3	Especialista Legal	20222361378621 202423600003781	Activo	Natalia Mayorga Ulloa	1.018.437.742
4	Especialista Financiero	20222361355831	Activo	Oscar Laureano Rosero Jiménez	79.592.329
5	Profesional Contable	20222361283981	Activo	Yenifer Milena Duran Ramírez	1.023.892.982
	ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES				
	TRÁNSITO				
6	Especialista en Tránsito y Transporte	20222361378621	Activo	Luis Carlos Guio Díaz	74.334.446
	VÍAS				
7	Especialista en Diseño Geométrico	202423600533321	Activo	Víctor Eduardo Guarín Carrasquilla	1.090.428.257
	ESPACIO PÚBLICO				
8	Especialista en urbanismo y espacio publico	20222361283981	Activo	Pablo Alejandro Sotomayor Tribin	79.144.366
	ESTRUCTURAS				
9	Especialista en Estructuras	20222361533871	Inactivo	Raúl Enrique Lozano Mora	80.411.279

No.	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	Aprobación IDU	Estado del profesional	Nombre base de datos IDU	Cédula
	GEOTECNIA				
10	Especialista en Geotecnia	20222361355831	Activo	Luisa Fernanda Morato Ríos	1.014.209.124
	PAVIMENTOS				
11	Especialista en Pavimentos		Activo	Verónica Torres Rincón	52.355.587
	REDES HIDROSANITARIAS				
12	Especialista Redes Hidrosanitarias	20222361578541	Activo	Ricardo Montenegro Soto	79.892.395
	REDES SECAS				
13	Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	20222361283981	Activo	Andrés Felipe Castaño Reyes	1.104.694.929
	COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN				
14	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos y programación)	20232360554241	Activo	Andrés Gustavo Pinzón Ubaque	79.761.903
	GESTIÓN AMBIENTAL				
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
15	Biólogo, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, PhD con experiencia en Estudio de Impactos ambientales		Revisión IDU	Lorena Viviana Rodríguez	52868251
	Meteorología y Clima				
16	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Hidrología (Meteorología y Clima)	20221751605161	Activo	Robert Johan Quimbay Moreno	80.911.889
17	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Meteorología (Meteorología y Clima)	20221751605161	Activo	Robert Johan Quimbay Moreno	80.911.889
	Geomorfología y Geodinámica				
18	Ingeniero civil o geotecnista MSc en geociencias con énfasis en Geotecnia. (Geomorfología y Geodinámica)		Revisión IDU	Michelle Ramírez Valencia	1.128.482.385
19	Profesional geotecnista (Geomorfología y Geodinámica)		Revisión IDU	Michelle Ramírez Valencia	1.128.482.385
	Paisaje - Conectividad Ecológica				
20	Biólogo MSc con énfasis en ecología del paisaje (Paisaje - Conectividad Ecológica)		Revisión IDU	Juan Carlos Linero González	5.758.891

No.	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	Aprobación IDU	Estado del profesional	Nombre base de datos IDU	Cédula
21	Biólogo, Ornitólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)		Revisión IDU	Juan Carlos Linero González	80.133.823
22	Biólogo, Mastozoólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	20232360260751	Activo	Leonardo Jesús Claros Sicacha	80.767.354
23	Biólogo Botánico (Paisaje - Conectividad Ecológica)	202417500339391	Activo	Diego Alejandro Rodríguez Torres	80.094.897
24	Biólogo, herpetólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	20221751605161	Activo	Herón José Romero Martínez	79.882.309
Socioeconómico					
25	Trabajador social, sociólogo, antropólogo psicólogo MSc núcleo básico en ciencias sociales y/o economía (Socio económico)	202423600475881	Activo	Andrea del Pilar García Cortes	46.377.990
26	Especialista en Economía (Socio económico)	202423600666971	Activo	Andrea del Pilar García Cortes	46.377.990
27	Profesional apoyo Social (Socio económico)	202323601445431	Activo	Giselle Natalia Vargas Páez	1.015.479.980
Ambiental					
29	Especialista Jurídico Ambiental	20221751508011	Inactivo	Nilbercece Macías Fernández	19.495.796
30	Especialista Forestal	202417500004011	Activo	Gonzalo Jiménez Ballén	19.496.832
31	Profesional junior Forestal	202417500443191	Activo	Carlos Andrés Gelves Valderrama	80.227.880
SST					
32	Especialista SST	202417500123831	Activo	Viviana Mayerly Ramírez Bernal	1.030.615.823
SIG Sistema de Información Geográfica					
33	Ingeniero especialista en SIG con experiencia en interpretación de imágenes satelitales y conectividad		Revisión IDU	Katherin Sarmiento Vítopia	1.020.799.610
SUSTRACCIÓN					
34	ING CIVIL, AMBIENTAL o GEÓLOGO EN HIDROGEOLOGÍA	20221751552001	Activo	María De Los Ángeles Larrotta Salazar	52.937.302

No.	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	Aprobación IDU	Estado del profesional	Nombre base de datos IDU	Cédula
	Meteorología y Clima				
35	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Hidrología (Meteorología y Clima)	20221751605161	Activo	Robert Johan Quimbay Moreno	80.911.889
36	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Meteorología (Meteorología y Clima)	20221751605161	Activo	Robert Johan Quimbay Moreno	80.911.889
	Hidrografía / Hidrología				
37	Ingeniero en recursos hídricos - PhD Hidrosistemas, recursos hídricos. (Hidrografía / Hidrología)		Revisión IDU	Ricardo Montenegro	79.892.395
	Paisaje - Conectividad Ecológica				
39	Biólogo MSc con énfasis en ecología del paisaje (Paisaje - Conectividad Ecológica)		Revisión IDU	Juan Carlos Linero González	5.758.891
40	Biólogo, Ornitólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)		Revisión IDU	Juan Carlos Linero González	80.133.823
41	Biólogo, Mastozoólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	20232360260751	Activo	Leonardo Jesús Claros Sicacha	80.767.354
42	Biólogo Botánico (Paisaje - Conectividad Ecológica)	202417500339391	Activo	Diego Alejandro Rodríguez Torres	80.094.897
43	Biólogo, herpetólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	20221751605161	Activo	Herón José Romero Martínez	79.882.309
	Socioeconómico				
44	Trabajador social, sociólogo, antropólogo psicólogo MSc núcleo básico en ciencias sociales y/o economía (Socio económico)	20221850305253	Activo	Martha Piedad Ramírez Gallego	52.031.985
45	Profesional apoyo Social (Socio económico)	202323601445431	Activo	Giselle Natalia Vargas Páez	1.015.479.980
	Asistente de campo toma información				
46	Profesionales Junior, ambiental, biólogo, Forestal (Asistente de campo levantamiento información)		Revisión IDU	César Augusto González López	1.024.508.810
	Editor Técnico				
47	Profesional (Editor Técnico)		Revisión IDU	Laura Pinzón Moreno	1.019.131.794
	ARQUEOLOGÍA				

No.	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	Aprobación IDU	Estado del profesional	Nombre base de datos IDU	Cédula
48	Arqueólogo	20221751449091	Activo	Leonardo Lizcano Serna	1.020.751.685
49	Arquitecto BIC	20222361378621	Activo	Carolina Ortiz Pedraza	52.387.519
GESTIÓN SOCIAL					
50	Especialista social	202423600283601	Activo	Enith Rivillas Ávila	53.082.424
SIG - CAD					
51	Profesional SIG-CAD	202423600273801	Activo	Isbelia Montenegro Morantes	52.173.627
52	Profesional BIM		Revisión IDU	Oswaldo Ávila Andrade	80229191
GESTIÓN PREDIAL					
53	Gestor Inmobiliario	202432500328581	Activo	Camilo Andrés Castillo Díaz	80116583
54	Gestor Socio-Jurídico	20223251410771	Activo	Roció García Pacheco	36.593.610
55	Gestor Técnico	20223251410771	Activo	Néstor Fabio Martínez Cantor	1.070.596.357

Fuente: Información de las Hojas de Vida

Nota: la lista del personal de Interventoría corresponde al listado presentado al IDU, a la fecha del corte.

4.2 Relación del personal Consultoría

Para el presente informe con corte al 31 de mayo de 2024, la relación del personal de Consultoría se puede visualizar en la **Tabla 25**.

Es importante mencionar que la Interventoría en periodos anteriores remitió a la Consultoría diferentes comunicados, donde solicita al Consultor que cumpla con sus Obligaciones Contractuales. De acuerdo con el desglose de personal entregado por la Consultoría con comunicado (1026-1815-2021-0012-2), todo el personal relacionado en el Anexo Requerimientos de personal y equipo mínimos del proyecto debe estar vinculado en la fase de Estudios y Diseños. A la fecha de corte del presente informe, no han sido radicados la totalidad de los documentos de vinculación como lo exige el IDU.

Tabla 25. Relación del personal del Contrato de Consultoría



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

No.	Personal especialista, profesional o de apoyo / descripción	Nombre	Cedula	Aprobación IDU	Estado de vinculación Para el periodo
	DIRECTOR/COORDINACIÓN				
1	Director de la Consultoría	Rafael Villamarín Restrepo	80.419.547	20232360324851	
2	Coordinador de la Consultoría	Gabriela Pérez Cotrino	51.890.656	20232360324851	
	ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES				
	TRÁNSITO				
3	Especialista en Tránsito y Transporte	Christian Roqueme Salazar	80090282	20222361531681	
4	Ingeniero Modelador	Gabriel Alejandro Prado Paneso	80.817.177	20222361701681	
5	Ingeniero Apoyo	Angie Juliana Torres Álvarez	1.023.954.956	202423600549551	
	VÍAS				
6	Especialista en Diseño Geométrico	Sebastián Mauricio Jiménez Delgado	1.098.664.048	20222361567781	
	ESPACIO PÚBLICO				
7	Especialista en urbanismo y espacio publico	Ana Milena Lopez Vargas	30.338.315	20222361496291	
8	Arquitecto Diseño urbano	Juan Jacobo Molina Restrepo	79.908.113	20222361496291	
9	Arquitecto Diseño urbano	Diana Patricia Marín Saboya	52.115.971	20222361496291	
10	Especialista Patrimonio	Edgar Hernan Benítez Fuentes	73.164.302		
11	Arquitecto de apoyo y renderista	Tomas Miguel Santacruz Delgado	1020736072	20222361496291	
	ESTRUCTURAS				
12	Especialista en Estructuras -Variante Intercambio Cota	Andrea Isabel Rojas Erazo	37.086.706	20222361562731	
13	Especialista en Estructuras - Puente rio Bogotá	Rodrigo Balanta Ramírez	94523023	20222361701681	
14	Especialista de Apoyo en Estructuras	Rodrigo Balanta Ramírez	1.032.369.609		Hoja de vida en revisión IDU
15	Especialista de Apoyo en Estructuras	Andrea Isabel Rojas Erazo	1.032.369.609		Hoja de vida en revisión IDU
	GEOTECNIA				
16	Especialista en Geotecnia	Mario Andrés Arias Estrella	1.085.251.358	20222361531711	
17	Ingeniero de apoyo	Laura Estefanía Sáenz Esquivel	1.019.077.145	202352601473602	
	PAVIMENTOS				
18	Especialista en Pavimentos	Teófilo Carlos Yidi Villareal	79795367	20222361735151	
19	Especialista de Apoyo Pavimentos	Everardo Pardo Guio	79702450	20222361546641	
	REDES HIDROSANITARIAS				

No.	Personal especialista, profesional o de apoyo / descripción	Nombre	Cedula	Aprobación IDU	Estado de vinculación Para el periodo
20	Especialista Redes Hidrosanitarias				Pendiente hoja de vida de parte de la Consultoría
21	Ingeniero de apoyo	María Fernanda Torres Quintana	1033712386	20222361701681	
22	Hidrólogo	Juan Manuel Gutiérrez Segura	80.503.026	20222361562701	
	REDES SECAS				
23	Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	Jorge Alejandro Sánchez Torres	7.161.835	20222361562701	
24	Ingeniero de apoyo	Luis Hernando Pinto León	74.365.880	20222361735151	
25	Ingeniero de apoyo	Alirio Cuesta Garzón	79.573.678	20222361735151	
	COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN				
26	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuestos)	Jhonatan Leandro Muñoz Vargas	71.261.705	20222361546611	
27	Ingeniero de apoyo	Stephanie Ruiz García	1.113.309.052	202352601478872	
28	Ingeniero de apoyo	Stephanie Ruiz García	1.113.309.052	202352601478872	
29	Ingeniero y/o Arquitecto (Especificaciones técnicas y Programación)	Ana María Vélez Cuellar	1121895054	20222361701681	
	GESTIÓN AMBIENTAL				
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL				
30	Biólogo, Ing. Ambiental, Ing. Forestal, PhD con experiencia en Estudio de Impactos ambientales	Rafael Herrera Farfán	79.154.705	20222361735151	
	Meteorología y Clima				
31	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Hidrología (Meteorología y Clima)	Jorge Luis González Castro	1.032.395.475	202352601587112	
32	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Meteorología (Meteorología y Clima)	Jorge Luis González Castro	1.032.395.475	20221751605221	
	Geomorfología y Geodinámica				
33	Ingeniero civil o geotecnista MSc en geociencias con énfasis en Geotecnia. (Geomorfología y Geodinámica)	Mario Andrés Arias Estrella	1.085.251.358,	2022236153171	
34	Profesional geotecnista (Geomorfología y Geodinámica)	Rubian Eduar Rendon Tangarife	75.100.805	20221751605221	
	Paisaje - Conectividad Ecológica				
35	Biólogo MSc con énfasis en ecología del paisaje (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Jimmy Edgard Álvarez Díaz	79137985	20221751704261	
36	Biólogo, Ornitólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)				Pendiente hoja de vida de parte de la Consultoría

No.	Personal especialista, profesional o de apoyo / descripción	Nombre	Cedula	Aprobación IDU	Estado de vinculación Para el periodo
37	Biólogo, Mastozoólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Angelica María Zorrilla Aguirre	1.094.920.635	20221751704261	
38	Biólogo Botánico (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Julio Cesar Baquero Rojas	1.094.905.541	20221751605221	
39	Biólogo, herpetólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Carolina Vargas Pinto	52269486	20221751704261	
	Socioeconómico				
40	Trabajador social, sociólogo, antropólogo psicólogo MSc núcleo básico en ciencias sociales y/o economía (Socio económico)	Nancy Patricia Salamanca Roza			Hoja de vida en revisión IDU
41	Especialista en Economía (Socio económico)	Astrid María Mercedes Blanco Alarcón	41.545.897	20222361735151	
42	Profesional apoyo Social (Socio económico)	Maria Constanza Pardo Prada			Hoja de vida en revisión IDU
	Ambiental				
43	Especialista Ambiental	Claudia Marcela Peraza Forero	39.744.782	202417500443201	
44	Especialista Jurídico Ambiental	Wilson Giovanni León Guerrero	79434280	20221751605221	
45	Especialista Forestal	Luz Adriana Molina García	1.077.145.214	20221751605221	
46	Profesional junior Forestal	Gabriel Andrés Pinto Escobar	80.795.557	202417500442411	
	SST				
47	Especialista SST	Zulma Liliana Amaya	52.217.518	20221751675821	
	SIG Sistema de Información Geográfica				
48	Ingeniero especialista en SIG con experiencia en interpretación de imágenes satelitales y conectividad	Cesar Aldana Ojalora	80.023.710	Observaciones IDU 20222361522431	
	SUSTRACCIÓN				
49	Ingeniero Civil, Ambiental o Geólogo en Hidrogeología	Juan Manuel Dávila Méndez	80.097.824	20221751475781	
	Meteorología y Clima				
50	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Hidrología (Meteorología y Clima)	Jorge Luis González Castro	1032395475	202352601587112	
51	Ingeniero Civil, Ambiental- MSc Meteorología (Meteorología y Clima)	Jorge Luis González Castro	1032395475	20221751605221	
	Hidrografía / Hidrología				
52	Ingeniero en recursos hídricos - PhD Hidro sistemas, recursos hídricos. (Hidrografía / Hidrología)	Juan Manuel Gutiérrez Segura	80.503.026	20221751704261	
	Geomorfología y Geodinámica				

No.	Personal especialista, profesional o de apoyo / descripción	Nombre	Cedula	Aprobación IDU	Estado de vinculación Para el periodo
53	Ingeniero civil o geotecnista MSc en geociencias con énfasis en Geotecnia. (Geomorfología y Geodinámica)	Rubian Eduar Rendon Tangarife	75.100.805	20222361735151	
	Paisaje - Conectividad Ecológica				
54	Biólogo MSc con énfasis en ecología del paisaje (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Jimmy Edgard Álvarez Díaz	79137985	20221751704261	
55	Biólogo, Ornitólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)				Pendiente hoja de vida de parte de la Consultoría
56	Biólogo, Mastozoólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Angelica María Zorrilla Aguirre	1.094.920.635	20221751704261	
57	Biólogo Botánico (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Julio Cesar Baquero Rojas	1.094.905.541	20221751605221	
58	Biólogo, herpetólogo (Paisaje - Conectividad Ecológica)	Carolina Vargas Pinto	52269486	20221751704261	
	Socioeconómico				
59	Trabajador social, sociólogo, antropólogo psicólogo MSnúcleo básico en ciencias sociales y/o economía (Socio económico)	Nancy Patricia Salamanca Roza			Hoja de vida en revisión IDU
60	Profesional apoyo Social (Socio económico)	Maria Constanza Pardo Prada			Hoja de vida en revisión IDU
	Asistente de campo toma información				
61	Profesionales Junior, ambiental, biólogo, Forestal (Asistente de campo levantamiento información)	Shirley Paola Lopera Bermejo	1.032.421.023	202417500271761	
	Editor Técnico				
62	Profesional (Editor Técnico)	Shirley Paola Lopera Bermejo	1.032.421.023	202417500271891	
	ARQUEOLOGÍA y BIENES DE INTERÉS CULTURAL				
63	Arqueólogo	Edgar Hernan Benítez Fuentes	73.164.302	20222361735151	
64	Profesional SIG-CAD	Cesar Aldana Otalora	80.023.710	Observaciones IDU 20222361522431	
65	Arquitecto BIC	Marcela Escallón Vélez	41758636	Observaciones IDU 20221751586811	
	GESTIÓN SOCIAL				
66	Especialista social	Dora Ibeth Galindo Cubillos	52.850.289	202423600475861	
67	Profesional social de apoyo	Diana Paola Jaime Medina	1010195200	20222361644621	
	SIG - CAD				
68	Profesional SIG-CAD	Cesar Aldana Otalora	80.023.710	Observaciones IDU 20222361522431	
69	Profesional BIM	Raúl Alejandro González Pineda	80.026.604	20222361567961	
	GESTIÓN PREDIAL				

No.	Personal especialista, profesional o de apoyo / descripción	Nombre	Cedula	Aprobación IDU	Estado de vinculación Para el periodo
70	ARTICULADOR JURÍDICO	Alberto Borge Stevenson	73.079.352	20222361735151	
71	ARTICULADOR RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES	Luis Armando Beltrán Gaitán	79712273	20232360071781	
72	GESTOR ECONÓMICO	Carolina Malagón Robayo	39.781.099	20222361567961	
73	GESTOR EVALUADOR	Sandra Paola Zaldúa Contreras	52.382.796	Observaciones IDU 20223251657171	
74	GESTOR JURÍDICO				Pendiente hoja de vida de parte de la Consultoría
75	GESTOR INMOBILIARIO	Sandra Paola Zaldúa Contreras	52.382.796	Observaciones IDU 20223251657171	
76	GESTOR RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES	Lina María Arias Torres	1.121.899.373	20222361567961	
77	GESTOR ECONÓMICO DE COMPENSACIONES	Carolina Malagón Robayo	39.781.099	20222361567961	
78	GESTOR SOCIO-JURÍDICO	Alberto Borge Stevenson	73.079.352	-	
79	GESTOR TÉCNICO	Luis Fredy Duarte Cubides	7166406	20223251657171	
	COMISIÓN TOPOGRAFÍA				
80	Ingeniero Catastral o Topográfico	José German Parra Riaño	80542844	20222361735151	

Fuente: Información de las Hojas de Vida.

4.3 Principales actividades desarrolladas por el personal de la Consultoría de cada dependencia.

Las actividades desarrolladas por el personal de la Consultoría en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 fueron actividades relacionadas al quinto mes de la Fase de Estudios y Diseños.

4.3.1 Etapa de Investigación

La Consultoría en la Fase de Recopilación y Análisis de la información desarrolló solicitudes y en la Fase de Estudios y Diseños está desarrollando solicitudes de información a las empresas de servicios públicos, entidades distritales, entidades de orden departamental, entidades de orden nacional y a la Alcaldía de Cota, la relación es la siguiente:

- Empresas de Acueducto de Bogotá.
- CODENSA.
- Gas natural – Vanti
- ETB.
- Movistar.

4.3.2 Topografía

Las actividades en el componente de topografía fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 30 de agosto de 2023, el IDU remitió a la Interventoría el recibido del producto "*Informe de Factibilidad de Topografía*" en la versión 3 mediante comunicado 202323601501321.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 1 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC- IDU- 030-0424 y radicado IDU 202452600618482 la aprobación al producto "Informe de complementación estudios topográfico" en la Versión No 2.
- El día 3 de mayo de 2024, la Interventoría remitió al IDU mediante comunicado CIC- IDU-001-0524 y bajo radicado 202452600815382 la aprobación del producto "Informe de Topografía" en la versión No.2.

4.3.3 Diseño Geométrico

Las actividades en el componente de diseño geométrico fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 13 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-025-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601628462 el producto "*Informe de Factibilidad de Diseño Geométrico*" en la versión 8, en atención a las observaciones del IDU 202323601304601.
- El día 1 de noviembre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601958071 el recibo del producto "Informe de Factibilidad de Diseño Geométrico" en la versión 8.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 23 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1239 el producto "Ajuste altimétrico y secciones transversales del Diseño Geométrico".
- El día 28 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-073-0524 las observaciones al producto "Ajuste altimétrico y secciones transversales –Diseño

4.3.4 Estudios de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

Las actividades en el componente de tránsito y transporte fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 5 de febrero de 2024, el IDU remitió a la Interventoría mediante comunicado 202423600201391 con el asunto "*Respuesta a su oficio CIC-IDU-020-0124 con radicado IDU 202452600027652. Solicitud concepto de aclaración acerca de la Fase de aprobación del producto Estudio Tránsito*". En el comunicado el IDU emite el concepto de aclaración que el producto "*Estudio de Tránsito*" se deberá desarrollar en la Fase de Estudios y Diseños.

Fase Estudios y Diseños.

Estudio de Tránsito

- El día 15 de abril de 2024, la Interventoría mediante comunicado CIC-IDU-083-0424 y radicado IDU 202452600697252, reiteró que no se puede aprobar el producto "Estudio de Tránsito" en la versión 5 teniendo en cuenta que no se han subsanado las observaciones de la SDM, se deberá contar con los diseños definitivos del componente de urbanismo y diseño geométrico.

Plan de Manejo de Tránsito General.

- El día 2 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1196 el producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0.
- El día 8 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-006-0524 las observaciones al producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0.
- A corte del día 3 de junio de 2024, está en atención de observaciones por parte de la Consultoría el producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0.

4.3.5 Estudios y Diseños Arquitectónicos

Las actividades en el componente de estudios y diseños arquitectónicos fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 27 de mayo de 2024, el IDU remitió a la Interventoría mediante comunicado 202423600702831 el recibo del producto "Informe de Factibilidad de Urbanismo" en la versión No.10, en esté comunicado el IDU realizo recomendaciones a tener en cuenta en la Fase de Estudios y Diseños.

Fase Estudios y Diseños.

Ajustes, actualizaciones, complementaciones documento factibilidad.

- El día 8 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1102 el producto "Ajustes, actualizaciones, complementaciones documento factibilidad".
- El día 15 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-078-0424 y radicado IDU 202452600696922 las observaciones al producto "Ajustes, actualizaciones, complementaciones documento factibilidad".
- A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría se encuentra en atención a las observaciones del producto "Ajustes, actualizaciones, complementaciones documento factibilidad".

4.3.6 Redes Hidrosanitarias

Las actividades en el componente de redes hidrosanitarios fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 7 de marzo de 2024, la Interventoría remitió mediante comunicado CIC-IDU-023-0324 y radicado IDU 202452600487072 la aprobación del producto "Informe de Factibilidad de Redes Húmedas" en la versión No.9.
- El día 8 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1094 los planos actualizados para la Fase Factibilidad.

Fase Estudios y Diseños.

Informe de inspección de redes.

- El día 22 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1235 el producto "Informe de Informe Inspección CCTV Redes Alcantarillado" en la versión No.0.
- El día 28 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-072-0524 las recomendaciones al producto "Informe Inspección CCTV Redes Alcantarillado1" en la versión No.1

Informes de avance.

- El día 30 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1191 el producto "Informe de Avance No. 1 Redes Húmedas".

- El día 8 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-008-0524 las recomendaciones al producto "Informe de Avance No. 1 Redes Húmedas."

4.3.7 Redes Secas (Eléctricas, Telefónicas y de Gas)

Las actividades en el componente de redes secas y de gas fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría radicó ante el IDU mediante comunicado CIC-IDU-025-0524 la aprobación del producto "Informe ejecutivo de Factibilidad de Redes Secas y de Gas" en la versión 3 bajo consecutivo 202452600890522.

Fase Estudios y Diseños.

Mesa de trabajo - ENEL.

- El día 20 de marzo de 2024 se llevó a cabo mesa de trabajo con ENEL, en la cual se socializó el resultado de la fase de Factibilidad y sus implicaciones sobre las redes de ENEL- CODENSA (baja y media tensión).
- El día 15 de abril de 2024, se desarrolló mesa de trabajo entre ENEL, IDU, Consultoría e Interventoría, en la cual se socializó el resultado de la fase de Factibilidad y sus implicaciones sobre las redes de alta tensión.

Mesa de trabajo - VANTI.

- El día 8 de abril de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con VANTI, en la cual se Socializó el resultado de la fase de Factibilidad y sus implicaciones sobre las redes de VANTI. Se determinó realizar mesa de trabajo presencial
- El día 18 de abril de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo entre VANTI, IDU, Consultoría e Interventoría, en la cual se socializó el resultado de la fase de Factibilidad y sus implicaciones sobre las redes de gas.
- El día 23 de abril de 2024, se realizó acompañamiento a las actividades desarrolladas por VANTI en la verificación de la tubería de 14" entre el Puente la Virgen y la Calle 170 con Carrera 92.
- El día 16 de mayo de 2024, se realizó mesa de trabajo en las oficinas de Vanti entre la Consultoría, Interventoría, IDU y VANTI.

Mesa de trabajo - ETB.

- El día 21 de mayo de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con ETB, en la cual se Socializó el resultado de la fase de Factibilidad y sus implicaciones sobre las redes de ETB

4.3.8 Estudios y Diseños Estructurales

Las actividades en el componente de estudios y diseños estructurales fueron:

Factibilidad.

- El día 18 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-048-0823 y bajo consecutivo IDU 202352601655902 el producto "*Informe de Factibilidad de Estructuras*" en la versión 6, en atención a las observaciones del IDU 202323601367291.
- El día 31 de octubre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601947781 el recibo del producto "*Informe de Factibilidad de Estructuras*" en la versión No.6.

Fase Estudios y Diseños.

Informe Patología Estructuras Existentes.

- El día 2 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1078 el producto "*Informe Patología Estructuras Existentes*" en la versión 0
- El día 23 de abril de 2024, la a Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-102-0424 las observaciones al producto "*Informe Patología Estructuras Existentes*" en la versión 0.
- A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría está en atención de las observaciones al producto "*Informe Patología Estructuras Existentes*" en la versión 0.

Informes de avance de Estructuras.

- El día 9 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicados 1026-1815-2021-1002 y 1026-1815-2021-1003 la Remisión Informe de Avance Nro. 1 Estructuras (Estructuras Nuevas).
- El día 19 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-102-0424 las recomendaciones al producto " Informe de Avance Nro. 1 Estructuras (Estructuras Nuevas).".

4.3.9 Suelos y Geotecnia

Las actividades en el componente de suelos y geotecnia fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 18 de agosto de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601432581 el recibo del producto "*Informe de Factibilidad del componente de Geotecnia*" en la versión No.7.

Fase Estudios y Diseños.

Plan de Exploración de Geotecnia

- El día 16 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1217 el producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5
- El día 24 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-063-0524 las observaciones al producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5.
- A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría se encuentra atendiendo las observaciones al producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5.

4.3.10 Pavimentos

Fase Factibilidad.

- El producto "*Informe de Factibilidad de Pavimentos*" cuenta concepto de recibido por parte del IDU por medio del comunicado No. 20232360606841; sin embargo, por los cambios como resultado de las matrices multicriterio el producto se actualizó por parte de la Consultoría, de acuerdo con lo anterior, las actividades en el componente de pavimentos fueron:
- El día 6 de septiembre de 2023 la Interventoría radicó con comunicado CIC-IDU-010-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601579312 el producto "*Informe de Factibilidad de Pavimentos*" en la versión 6.
- El día 31 de octubre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601947771 el recibo del producto "Informe de Factibilidad de Pavimentos" en la versión 6.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 16 de mayo de 2024, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202423600649211 el recibo del producto "Plan de Exploración de Pavimentos - Fase de Estudios y Diseños" en la versión No.4.

4.3.11 Gestión del Riesgo de Proyectos

No aplica.

4.3.12 Estudio Ambiental

Metodologías

- El día 18 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-089-0424 el traslado del comunicado IDU 202417500530851 con las observaciones a los productos "Metodología EIA" en la versión No.5 y "Metodología Sustracción de la Reserva" en la versión No.5.
- El día 29 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1188, respuesta a las observaciones del IDU 202417500530851 a los productos "Metodología EIA" en la versión No.5 y "Metodología Sustracción de la Reserva" en la versión No.5

A corte del día 31 de mayo de 2024, la Interventoría esta revisado los productos de las metodologías.

Protocolos monitoreo EIA y Sustracción

- El día 4 de abril de 2024, el IDU remitió a la Interventoría el recibido a los productos "Protocolos monitoreo EIA y Sustracción" en la versión No.8 y versión No.6 respectivamente. mediante comunicado 202417500490151.

Delimitación

- El día 20 de febrero de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-0993, respuesta a las observaciones del producto "Delimitación preliminar área de influencia – EIA".
- El día 20 de febrero de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-0992, respuesta a las observaciones de delimitación del área de influencia preliminar para el proceso de sustracción de reserva.
- El día 20 de febrero de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-0993, respuesta a las observaciones del producto "Delimitación preliminar área de influencia – EIA".

4.3.13 Presentación Proyecto BIM.

Fase Factibilidad

Las actividades en el componente de BIM fueron:

- El día 21 de julio de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-066-0723 y bajo consecutivo IDU 202352601187362 el producto "*Informe de Factibilidad BIM*" en la versión 2.
- El día 1 de noviembre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202320501957771 el recibo del producto "Informe de BIM - Fase Factibilidad" en la versión No.2

Fase Estudios y Diseños.

- El día 10 de enero de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-030-0124 las obligaciones que tiene la Consultoría "12.5.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS", y para el caso específico del componente BIM se indica:

(...)

" 4. El CONSULTOR debe realizar el diseño integral del proyecto como parte de las obligaciones del presente contrato a través de la metodología BIM (Building Information Modeling), de conformidad con lo establecido en el Anexo 1- Anexo técnico del proceso y demás documentos que lo integran.

"(....)

- En el comité técnico No.72 del día 31 de mayo de 2024, el IDU hace un llamado de atención a la Consultoría debido a los atrasos evidenciados en mesas de trabajo BIM en la Fase de Estudios y Diseños.
- En el comité técnico No.72 del día 31 de mayo de 2024, la Interventoría indicó que ha realizado llamados de atención para el cumplimiento de los requerimientos del componente BIM, actividades que debieron iniciar con el inicio de la Fase de Estudios y Diseños, ya que es una herramienta importante de trabajo.

4.3.14 Social.

Fase Factibilidad.

Las actividades en el componente social fueron:

- El producto "*Análisis de la Percepción Ciudadana*" recibió concepto de recibido por parte del IDU por medio del comunicado No. 20232360791451.

Fase Estudios y Diseños.

- El 20 de mayo de 2024 la Interventoría remite a la Consultoría comunicado CIC-IDU-039-0524 con asunto Respuesta oficios 1026-1815-2021-1108 avance Nro. 4 y 1026-1815-2021-1108 avance No. 5 de documento de EIA Capítulo 5.3 Caracterización medio socioeconómico.
- El 21 de mayo de 2024 la Interventoría remite al Consultor comunicación CIC-IDU-046-0524 con asunto - Respuesta al comunicado de la Consultoría 1026-1815-2021-1205 con el asunto "Solicitud de Reprogramación - Actividades del Capítulo 13 Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para el medio socioeconómico".
- El 24 de mayo de 2024 la Interventoría remite al Consultor comunicado CIC-IDU-061-0524, con asunto Respuesta al comunicado de la Consultoría 1026-1815-2021-1214 con asunto "Remisión Informe de Diagnóstico Socioeconómico Versión 0".
- El 28 de mayo de 2024 la Interventoría remite al Consultor comunicado CIC-IDU-076-0524 con asunto Respuesta al comunicado de la Consultoría 1026-1815-2021-1241 con el asunto "Avances actividades ambientales del 06 al 19 de mayo de 2024".
- El 28/05/2024 la Interventoría remite al Consultor comunicado No.CIC-IDU-068-0524 con asunto Respuesta al comunicado de la Consultoría 1026-1815-2021-1225 con asunto "Respuesta al comunicado CIC-IDU-037-0524 de Interventoría, con observaciones al informe mensual social 17 V0."

4.3.15 Arqueología.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 25 de enero de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-0933 el producto "*Plan de trabajo de arqueología*".
- El día 5 de febrero de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-001-0224 la aprobación del producto "*Plan de trabajo de arqueología*" y radicado en el IDU con consecutivo 202452600232092.

4.3.16 Patrimonio y Bienes de Interés cultural.

Fase Factibilidad.

- El producto "*Documento de valoración histórico - Patrimonial*" recibió concepto de recibido por parte del IDU por medio del comunicado 20231750866961.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 8 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-005-0524 las observaciones al producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 2.
- El día 22 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1234 el producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 3.
- El día 29 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-079-0524 las observaciones al producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 3.

4.3.17 Estudio Predial y Reasentamiento.

(Fase Estudios y Diseños)

Metodológica Gestión Predial.

- El día 16 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-019-0524 las observaciones al producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial " en la versión 3, en la atención de las observaciones del IDU 202432500535551.
- El día 28 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1244 las observaciones al producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial " en la versión 4.

A corte del día 31 de mayo de 2024, la Interventoría está revisando el producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial" en la versión No.4.

Consecución de Insumos.

- El día 17 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1221 respuesta las observaciones al producto "Consecución de Insumos" en la versión No.2.
- El día 28 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-071-0524 la aprobación al producto "Consecución de Insumos" en la versión No.2.

Cartografía sobre la línea de intervención

- El día 23 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-057-0524 las observaciones al producto "Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.0.
- El día 27 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1242 el producto "Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.1.

A corte del día 31 de mayo de 2024, la Interventoría está revisando el producto "Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.1.

4.3.18 Presupuesto.

Las actividades de presupuesto fueron:

Fase Factibilidad.

- El día 25 de abril de 2024, la Interventoría remitió a al IDU mediante comunicado CIC-IDU-122-0424 y bajo radicado IDU 202452600765372 la aprobación del producto "Informe de Factibilidad de Costos y presupuestos" en la versión 9.

Fase Estudios y Diseños.

- El día 2 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1079 los formatos Ítems NP's No Visor IDU.
- El día 23 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-109-0424 observaciones a los ítems no previstos.

A corte del día 31 de mayo de 2024, la consultoría está en atención de las observaciones a los ítems no previstos

4.3.19 Documentos para el cierre de la Fase de Factibilidad.

Informe final de Factibilidad:

- El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-039-0524 las observaciones al producto "Informe Final de Factibilidad" en la versión 4.

A corte del 31 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones}

Informe ejecutivo de Factibilidad:

- El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-033-0524 las observaciones al producto "Informe ejecutivo de Factibilidad" en la versión 2.

A corte del 31 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones.

Lista de chequeo de la Fase de Factibilidad.

- El día 20 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-060-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601679092 la lista de chequeo de la Fase de Factibilidad en la versión 0.

En las diferentes mesas de trabajo realizadas desde el 4 de enero de 2024 el IDU le reitero tanto a la consultoría, como a la interventoría la importancia de entregar la totalidad de los productos de los diferentes componentes requeridos en esta etapa, con el fin de cerrar de manera consolidada la etapa de Factibilidad.

4.3.20 Programación.

Las actividades de programación en el periodo fueron:

- Las actividades de programación por parte de la Interventoría fue el seguimiento y control semanal a las actividades desarrolladas por la Consultoría, las cuales están contenidas en los informes semanales de Interventoría radicados ante el IDU.

Tabla 26. Informes semanales de Interventoría

Informe semanal de Interventoría					
No.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Radicado IDU No.	Fecha de radicado
72	Informe semanal Interventoría No.72	30/04/2024	6/05/2024	202452600891092	17/05/2024
73	Informe semanal Interventoría No.73	7/05/2024	13/05/2024	202452600919342	21/05/2024
74	Informe semanal Interventoría No.74	14/05/2024	20/05/2024	202452600954702	28/05/2024
75	Informe semanal Interventoría No.75	21/05/2024	27/05/2024	202452600987982	31/05/2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

4.4 Gestión realizada con cada una de las empresas y entidades que intervengan en el proyecto.

En el periodo del presente informe se presentaron mesas de trabajo con, MINCULTURA y la ETB.

4.4.1 ETB

El día 21 de mayo de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con la ETB, en la cual se solicitó a la consultoría remitir para verificación un plano en el que se implante la investigación en campo que se realizó y en el cual se puedan identificar el diseño geométrico y el urbanismo que se tiene a la fecha; es importante que en este plano quede bien señalizada la ciclorruta propuesta y los apoyos de los puentes.

Además, informó la ETB que en este plano se deben referencia claramente el límite de intervención y la totalidad de los límites prediales. Es importante que se demarque muy bien el área del límite de intervención en el plano y quede achurado toda vez que este es el insumo principal para la investigación de detalle en campo y el área que este demarcada será que sea verificada por la ETB.

4.4.2 VANTI

El día 16 de mayo DE 2024, se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con VANTI en la etapa de estudios y diseños, en la cual se realizó un llamado de atención al Consultor toda vez que se evidenció que no cumplió con los compromisos de la reunión del día 18 de abril de 2024, los cuales fueron:

- Envío de plano con la ubicación de apiques de factibilidad, integración con las demás especialidades del proyecto y los perfiles, la fecha del compromiso se estableció para el día 23 de abril de 2024.
- Remisión de los planos de los diseños finales, la fecha del compromiso se estableció para el día 22 de abril de 2024.
- Remisión de los planos de los diseños con el ajuste requerido por ENEL, la fecha del compromiso se estableció una vez sea ajustado por Consultoría y avalado por Interventoría.

Por lo anterior, al corte del presente el consultor se encuentra trabajando en la elaboración de los planos requeridos por Vanti.

4.4.3 UAESP

El día 15 de mayo de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con la UAESP con el fin de presentar por parte del Consultor el proyecto.

Una vez presentada las principales generalidades del proyecto y los avances que se tienen a la fecha respecto al diseño de iluminación, la UAESP indicó las recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración del diseño y solicitó al Consultor enviar el formato MU 702 para adelantar la gestión correspondiente.

4.4.4 Ministerio de Cultura MINCULTURA

El día 21 de mayo de 2024, se llevó a cabo mesa de trabajo con MINCULTURA, en la cual se presentó el resultado de la Fase de Factibilidad, para el proyecto vial ampliación Suba-Cota. En esta reunión el Ministerio solicitó que se emitiera en otra reunión el soporte y justificación técnica en la afectación del predio de la Hacienda de la Conejera con el proyecto.

4.5 Problemas técnicos y soluciones planteadas de cada dependencia.

En el periodo entre el 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, se adelantaron las siguientes acciones referentes a problemas encontrados en la ejecución e la fase de estudios y diseños:

- ENEL – CODENSA solicitó la ampliación del separador central en 1,5 m para la reubicación de tres postes de Alta Tensión en el tramo K0+000 – K0+700, situación que obligo a ampliar la sección transversal en este sector y la afectación de la reserva TVDH.

- Se validó con VANTI la localización de las tuberías de gas de 14" presentes en la intersección de la Cra 92, por lo que fue necesario ajustar la geometría horizontal y vertical de la intersección de la Cra 92 con Cll 170 y la afectación de la reserva TVDH.
- Diseño Geométrico: Con los trabajos desarrollados en campo se identificó que el predio denominado "*Hacienda Tyhuaira*", localizado fuera de la zona de la reserva TVDH, está siendo afectado por el trazado propuesto en la etapa de pre-factibilidad, dejando áreas remanentes no aprovechables al costado sur de la doble calzada, por lo cual se consideró procedente desplazar 40 m el trazado hacia el sur, sin modificar el sitio de ponteadero evitando afectación sobre los predios colindantes. El objetivo fundamental del ajuste del trazado geométrico obedeció a afectar en una menor medida el predio denominado "*Hacienda Tyhuaira*", ubicando el área de afectación en el borde del predio aumentando la distancia entre la línea de intervención y la estructura principal del predio. De igual manera se aumenta el retiro del proyecto a la ZMPA del Río Bogotá.
- Conforme a la mesa de trabajo adelantada con el Ministerio de Cultura, se solicitó por parte de esa Entidad el sustento requerido que permita justificar la afectación del predio de la Hacienda de la Conejera con le retorno planteado en el trazado de la vía.

En este sentido, la Consultoría se encuentra elaborando dicho informe para ser verificado previamente por la interventoría y posteriormente adelanta la respectiva presentación ante el Ministerio de Cultura; para dicho sustento, se está verificando con la totalidad de áreas técnicas inmersas en el proyecto con el fin de emitir una respuesta armonizada al Ministerio de Cultura.

- Variación áreas de sustracción:
La variación dimensional que se ha presentado en las áreas asociadas al proyecto son las siguientes:

Área	Prefactibilidad	Factibilidad	Avance Estudios y Diseños (*)
Área de Intervención	25.19 Ha	31.63 Ha	31.96 Ha
Área de Estudio	195.48 Ha	555 Ha	2228 Ha
Área a Sustraer	6.61 Ha	8.54 Ha	9.14 Ha

NOTA (*): Estas áreas depende del resultado de la ingeniería de detalle que se está desarrollando y de los requerimientos que realicen las ESP sobre los diseños para aprobación.

- Como elemento fundamental radica el hecho de que no han variado las condiciones ecosistémicas primigeniamente evaluadas a las que sustentaron el pronunciamiento incorporado en el radicado No. 20212022210 del 21 de abril de 2021 emanado de esa Corporación; y en este escenario, su características, físicas, bióticas y sociales no han surtido modificación alguna que infiera o conlleve así fuese indiciariamente a pensar que hoy en día pueda existir una alternativa distinta a la ventilada, evaluada y aceptada como única opción dentro de su pronunciamiento fechado el 21 de abril de 2021.

A corte del presente informe se está trabajando en la elaboración de un informe técnico que sirva como soporte para adelantar la presentación del proyecto ante la CAR para la socialización de las variaciones sufridas desde la factibilidad y exponer la propuesta de manejo de vallados que se tienen contemplados.

4.6 Relación del estado y soportes de los productos entregados

La relación del estado de los productos entregados por la Consultoría dentro de la Fase de recopilación y análisis de la información, Fase de Factibilidad y Fase de Estudios y Diseños a la fecha del día 31 de mayo de 2024 están en el numeral 4.6.1 y numeral 4.6.2.

4.6.1 Estado de los productos Fase RAI

El estado RAI y metodologías de los productos de la Fase RAI a la fecha del 31 de mayo de 2024 es la siguiente:

Tabla 27. Estado de los productos Fase RAI

Informe	Versión	No. radicado IDU	Consecutivo IDU respuesta	Estado IDU
RAI componente Tránsito y Transporte V1	V1	20225261771452	20222361778791	Recibido IDU
Metodología para la toma de Información Tránsito y Transporte V2	V2	20225261896922	20222361778791	Recibido IDU
RAI componente Estructuras V1	V1	20225261896922	20222361748971	Recibido IDU
RAI componente Urbanismo y Espacio Público V1	V1	20225261896922	20222361778711	Recibido IDU
RAI Redes secas y gas V2	V2	20225261896922	202323601445451	Recibido IDU
Metodología componente Urbanismo y Espacio Público V1	V1	20225261896922	20222361778711	Recibido IDU
RAI Gestión Predial V2	V2	20225261933102	20223251796361	Recibido IDU
Metodología Pavimentos - V3	V3	20225261955852	20222361894131	Recibido IDU
Diagnóstico Preliminar del Estado Actual de Infraestructura Existente de Pavimento -V3	V3	20225261955852	20222361894131	Recibido IDU
RAI componente Pavimentos - V3	V3	20225261955852	20222361894131	Recibido IDU
Plan exploratorio geotécnico para pavimentos - V7	V7	20225261955852	20222361894131	Recibido IDU
RAI componente Geometría Vial V3	V3	20225262089262	20222361897271	Recibido IDU
Metodología componente Topografía V3	V3	20225262130042	20222361975421	Recibido IDU
RAI Topografía V3	V3	20225262130042	20222361975421	Recibido IDU

Informe	Versión	No. radicado IDU	Consecutivo IDU respuesta	Estado IDU
Plan de dialogo ciudadano V1	V1	20235260080002	20232360194091	Recibido IDU
RAI componente Hidráulica V4	V4	20235260097532	20232360194741 20231750040393	Recibido IDU
RAI componente Geotecnia V3	V3	20235260120822	20232360397331	Recibido IDU
Plan de exploratorio de geotecnia - V8	V8	20235260672832	202323601133571	Recibido IDU
RAI componente BIC V2	V2	20235260820782	202317501255661	Recibido IDU
Metodología Gestión Predial V3	V3	202352601102902	202332501243981	Recibido IDU
RAI componente Estudios Ambientales V6	V6	202352601660932	202423600017521	Recibido IDU

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

4.6.2 Estado de los productos Fase Factibilidad

El estado de los productos de la Fase de Factibilidad es el siguiente a la fecha del 31 de mayo de 2024:

Tabla 28. Estado de los productos de la Fase de factibilidad.

Producto	Estado	Observación (s)
Informe Topografía	Recibido IDU	Informe final de Factibilidad: El día 14 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-040-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601640602 el producto "Informe Final de Factibilidad" en la versión 3. Informe ejecutivo de Factibilidad: El día 19 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-053-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601670102 el producto "Informe ejecutivo de Factibilidad" en la versión 1.
Estudio de tránsito	Producto Fase Estudios y Diseños	El día 5 de febrero de 2024, el IDU remitió a la Interventoría mediante comunicado 202423600201391 con el asunto "Respuesta a su oficio CIC-IDU-020-0124 con radicado IDU 202452600027652". Solicitud concepto de aclaración acerca de la Fase de aprobación del producto "Estudio Tránsito". En el comunicado el IDU emite el concepto de aclaración que el producto "Estudio de Tránsito" se deberá desarrollar en la Fase de Estudios y Diseños.
Informe de Factibilidad Geotecnia	Recibido IDU	El día 18 de agosto de 2023, el IDU recibió el producto "Informe de Factibilidad Geotecnia" en la versión No.7 con comunicado 202323601432581.
Informe de Factibilidad Redes Secas	Radicado IDU	El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría radicó ante el IDU mediante comunicado CIC-IDU-025-0524 la aprobación del producto "Informe ejecutivo de Factibilidad de Redes Secas y de Gas" en la versión 3 bajo consecutivo 202452600890522.
Informe de redes hidrosanitarias	Revisión Interventoría	El día 7 de marzo de 2024, la Interventoría remitió mediante comunicado CIC-IDU-023-0324 y radicado IDU 202452600487072 la aprobación del producto "Informe de Redes Hidrosanitarias" en la versión No.9. El día 8 de abril de 2024, la Consultoría remitió los planos actualizados con el nombre de Javier Ortega Vera. Una vez se tengan los planos firmados, se remitirá al IDU.
Informe de diseño geométrico de vías	Recibido IDU	El día 1 de noviembre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601958071 el recibo del producto "Informe de Factibilidad de Diseño Geométrico" en la versión 8.

Producto	Estado	Observación (s)
Informe de Urbanismo	Radicado IDU	El día 18 de marzo de 2024, la Interventoría remitió IDU mediante comunicado CIC-IDU-046-0324 y bajo radicado 202452600550822 la aprobación del producto "Informe de Factibilidad de Urbanismo" en la versión No.10, en atención a las observaciones del IDU mediante comunicado 202423600346601.
Informe de estructuras	Recibido IDU	El día 31 de octubre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601947781 el recibo del producto " <i>Informe de Factibilidad de Estructuras</i> " en la versión No.6.
Informe de Factibilidad Estimación de Costos y Presupuestos	Radicado IDU	El día 25 de abril de 2024, la Interventoría remitió al IDU mediante comunicado CIC-IDU-122-0424 y bajo radicado 202452600765372 el producto "Informe de Factibilidad de Estimación de Costos y Presupuesto" en la versión No.7" en la versión No.9 en atención a las observaciones IDU 20232360158917.
Factibilidad BIM	Recibido IDU	El día 1 de noviembre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202320501957771 el recibo del producto " <i>Informe de BIM - Fase Factibilidad</i> " en la versión No.2
Informe de Factibilidad Pavimentos	Recibido IDU	El día 31 de octubre de 2023, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202323601947771 el recibo del producto " <i>Informe de Factibilidad de Pavimentos</i> " en la versión 6.
Informe final de la Fase de Factibilidad	Revisión Consultoría	El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-039-0524 las observaciones al producto "Informe Final de Factibilidad" en la versión 4. A corte del 31 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones
Informe ejecutivo de la Fase de Factibilidad	Revisión Consultoría	El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-033-0524 las observaciones al producto "Informe ejecutivo de Factibilidad" en la versión 2. A corte del 31 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones.
Lista de chequeo de la Fase de Factibilidad	Radicado IDU	El día 20 de septiembre de 2023, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-060-0923 y bajo consecutivo IDU 202352601679092 la lista de chequeo de la Fase de Factibilidad en la versión 0.

Fuente: Consorcio Interventoría Cota

En la **Tabla 29** se puede evidenciar el estado de los productos remitidos para concepto del IDU en la Fase de Factibilidad a corte del 31 de mayo de 2024, periodo que corresponde al informe técnico mensual No. 18, de acuerdo con la información indicada en dicha tabla se observa que varios de los productos cuentan con observaciones, las cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte de Consultoría.

Tabla 29. Relación del estado de los productos radicados en el IDU.

Informe	Versión	No. radicado IDU	Consecutivo IDU respuesta	Estado IDU
Metodología estructuras - V1	V1	20225262093122	20222361913021	Recibido IDU
Metodología Hidráulica - V2	V2	20225262050092	20222361949641 20232360004571 20221750446983	Recibido IDU
Metodología Estimación de Costos y Presupuestos - V1	V1	20235260013282	20232360082921	Recibido IDU

Informe	Versión	No. radicado IDU	Consecutivo IDU respuesta	Estado IDU
Metodología de arqueología - V2	V2	20235260126302	20232360203261	Recibido IDU
Cálculo TPD - V1	V1	20235260272962	20232360336021	Recibido IDU
Informe de Factibilidad Pavimentos - V2	V2	20235260509082	20232360606841	Recibido IDU
Documento de valoración histórico - Patrimonial - V2	V2	20235260514412	20231750866961	Recibido IDU
Metodología Diseño Geométrico - V3	V3	20235260595932	20232360704521	Recibido IDU
Metodología de Geotecnia - V5	V5	20235260820852	20232361029081	Recibido IDU
Informe de Factibilidad Redes Secas - V7	V7	202352601121602	202323601950371	Recibido IDU
Informe de Factibilidad Geotecnia - V7	V7	202352601185152	202323601432581	Recibido IDU
Producto BIM Factibilidad - V2	V2	202352601187362	202320501957771	Recibido IDU
Metodología Componente Redes Secas y de Gas - V2 - Alcance	V2	202352601197502	202323601435081	Recibido IDU
Informe de factibilidad del componente de Redes Húmedas - V7	V7	202352601314342	202423600008801	Observación IDU
Matriz Multicriterio Calle 170 Carrera 92 - V5	V5	202352601350272	202323601618181	Recibido IDU
Matriz Multicriterio Carrera 111 (Av Corpas) - V5	V5	202352601350272	202323601618181	Recibido IDU
Matriz Multicriterio Calle 116 (Av Guaymaral) - V5	V5	202352601350272	202323601618181	Recibido IDU
Informe Topografía - V3	V3	202352601438342	202323601501321	Recibido IDU
Informe de factibilidad Pavimentos - V6	V6	202352601579312	202323601947771	Recibido IDU
Informe de diseño geométrico de vías - V8	V8	202352601628462	202323601958071	Recibido IDU
Informe Final Factibilidad - V3	V3	202352601640602	202423600478241	Observación IDU
Informe de Factibilidad Estructuras - V6	V6	202352601655902	202323601947781	Recibido IDU
Informe ejecutivo Factibilidad - V1	V1	202352601670102	202423600478311	Observación IDU
Lista de chequeo de Factibilidad - V0	V0	202352601679092		Radicado IDU
Informe de Urbanismo - V10	V10	202452600550822	202423600702831	Recibido IDU
Informe de Factibilidad de Estimación de Costos y Presupuesto - V9	V9	202452600765372	202423600588051	Recibido IDU
Informe ejecutivo de Redes Secas - V3	V3	202452600890522		Radicado IDU

Fuente: Consorcio Interventoría Cota

En la

Tabla 30 se indica los productos de la Fase de Factibilidad que presentaron observaciones por parte del IDU y que a corte del 31 de mayo de 2024 no se ha obtenido la atención de las observaciones de los productos, y están en revisión por parte de la Interventoría.

Tabla 30. Relación de informes con observaciones del IDU en el periodo.

Informe	Versión	No. radicado IDU	Consecutivo IDU respuesta	Estado IDU
informe de factibilidad del componente de Redes Húmedas - V7	V7	202352601314342	202423600008801	Observación IDU
Informe Final Factibilidad - V3	V3	202352601640602	202423600478241	Observación IDU
Informe ejecutivo Factibilidad - V1	V1	202352601670102	202423600421151	Observación IDU

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

4.6.3 Estado de los productos Fase Estudios y Diseños.

El estado de los productos de la Fase de Estudios y Diseños es el siguiente a la fecha del 31 de mayo de 2024:

Tabla 31. Estado de los productos de la Fase de Estudios y Diseños.

Producto	Estado	Observación (s)
Informe de topografía.	Radicado IDU	El día 3 de mayo de 2024, la Interventoría remitió al IDU mediante comunicado CIC-IDU-001-0524 y bajo radicado 202452600815382 la aprobación del producto "Informe de Topografía" en la versión No.2.
Plan de exploración Geotecnia	Revisión Interventoría	El día 16 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1217 el producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5 El día 24 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-063-0524 las observaciones al producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5. A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría se encuentra atendiendo las observaciones al producto "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5.
Plan de trabajo de arqueología	NA	El día 5 de febrero de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-001-0224 y radicado en el IDU bajo consecutivo 202452600232092 la aprobación del Plan de trabajo de Arqueología.
Actividades de campo de arqueología	Actividades de campo	La Consultoría se encuentra realizando actividades de campo, estas iniciaron el día 7 de febrero de 2024.
Plan de exploración Pavimentos	Recibido IDU	El día 16 de mayo de 2024, el IDU remitió a la Interventoría con comunicado 202423600649211 el recibo del producto "Plan de Exploración de Pavimentos - Fase de Estudios y Diseños" en la versión No.4.
Tránsito y transporte PMT	Atención de observaciones Consultoría	El día 2 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1196 el producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0 El día 8 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-006-0524 las

Producto	Estado	Observación (s)
		<p>observaciones al producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0.</p> <p>A corte del día 31 de mayo de 2024, está en atención de observaciones por parte de la Consultoría el producto "Plan de Manejo de Tránsito General" en la versión No.0.</p>
Estudio de tránsito	Atención de observaciones Consultoría	<p>El día 15 de abril de 2024, la Interventoría mediante comunicado CIC-IDU-083-0424 y radicado IDU 202452600697252, reiteró que no se puede aprobar el producto "Estudio de Tránsito" en la versión 5 teniendo en cuenta que no se han subsanado las observaciones de la SDM, se deberá contar con los diseños definitivos del componente de urbanismo y diseño geométrico.</p>
BIC Documento Bienes de Interés Cultural – BIC	Atención de observaciones Consultoría	<p>El día 8 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-005-0524 las observaciones al producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 2.</p> <p>El día 22 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1234 el producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 3.</p> <p>El día 29 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-079-0524 las observaciones al producto "Documento Bienes de Interés Cultural – BIC" en la versión 3.</p>
Gestión Predial Metodología predial	Revisión Interventoría	<p>Metodológica Gestión Predial.</p> <p>El día 16 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-019-0524 las observaciones al producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial " en la versión 3, en la atención de las observaciones del IDU 202432500535551.</p> <p>El día 28 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1244 las observaciones al producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial " en la versión 4.</p> <p>A corte del día 3 de junio de 2024, la Interventoría está revisando el producto "Verificación Metodológica Capítulo 2 – Gestión Predial" en la versión No.4.</p> <p>Consecución de Insumos.</p>

Producto	Estado	Observación (s)
		<p>El día 17 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1221 respuesta las observaciones al producto "Consecución de Insumos" en la versión No.2.</p> <p>El día 28 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-071-0524 la aprobación al producto "Consecución de Insumos" en la versión No.2.</p> <p>Cartografía sobre la línea de intervención</p> <p>El día 23 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-057-0524 las observaciones al producto Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.0.</p> <p>El día 27 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1242 el producto "Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.1.</p> <p>A corte del día 31 de mayo de 2024, la Interventoría está revisando el producto "Cartografía sobre la línea de intervención" en la versión No.1.</p>
Estructuras Informe de patología a estructuras existentes	Atención de observaciones Consultoría	<p>El día 2 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1078 el producto "Informe Patología Estructuras Existentes" en la versión 0.</p> <p>El día 23 de abril de 2024, la a Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-102-0424 las observaciones al producto "Informe Patología Estructuras Existentes" en la versión 0.</p> <p>A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría está en atención de las observaciones al producto "Informe Patología Estructuras Existentes" en la versión 0.</p>
Estructuras Informe de avance No.1 a estructuras nuevas	Atención de observaciones Consultoría	<p>El día 8 de abril de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1103 el producto "Informe de Avance Nro. 1 Estructuras (Estructuras Nuevas)".</p> <p>El día 19 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-102-0424 las recomendaciones al producto " Informe de Avance Nro. 1 Estructuras (Estructuras Nuevas)".</p>

Fuente: Consorcio Interventoría Cota.

4.7 Registro fotográfico.

Registro fotográfico de actividades realizadas en el periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

Fotografía 1. Comité IDU número 5 y taller de impactos en el club Laverdieri del día 2 de mayo de 2024




Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024.

Fotografía 2. verificación de las muestras de pavimentos enviadas al laboratorio DAPCIL. S.A.S.



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024.

Fotografía 3. Acompañamiento en campo a las actividades enmarcadas en el Plan de exploración de Geotecnia.

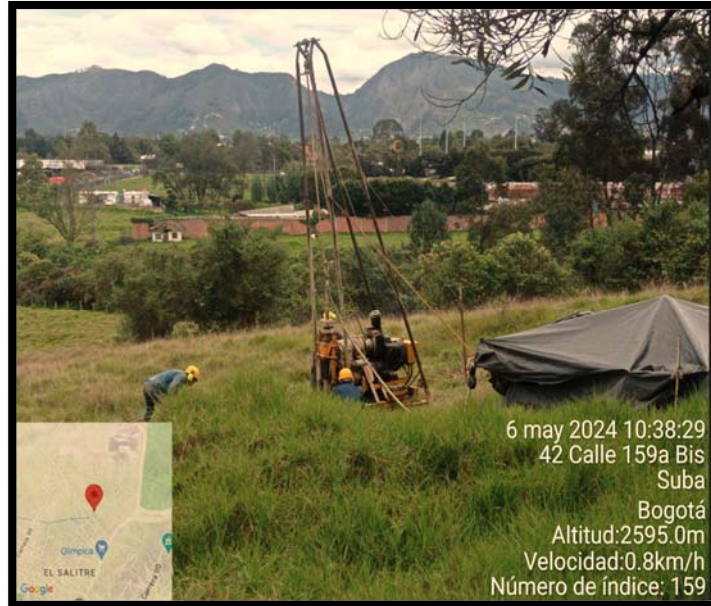

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, (Actividades de campo)

Fotografía 4. Recorrido urbano con la comunidad del barrio Alaska



Fuente: Consorcio Interventoría Cota,


Página 77 de 107

Fotografía 7. Comité Ambiental y técnico No.16 del día 14 de mayo de 2024 en las instalaciones del IDU



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024.

Fotografía 8. Mesa de trabajo entre la Interventoría, la Consultoría, el IDU con VANTI el día 16 de mayo de 2024

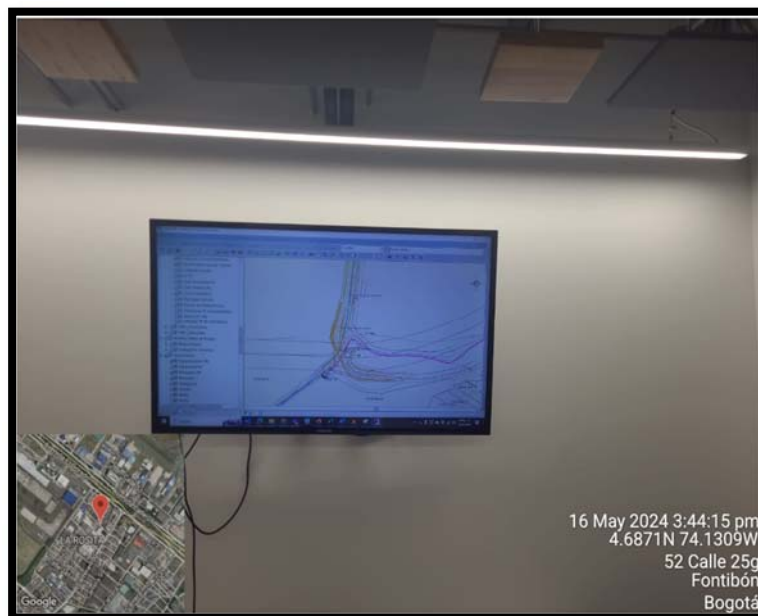

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024.

Fotografía 9. Acompañamiento de los trabajos de geotecnia en campo por parte de la Interventoría el día 14 de mayo de 2024



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, (Actividades de campo)

Fotografía 10. Recorrido Urbano entre el colegio Salitre y el club Laverdieri el día 22 de mayo de 2024



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024

Fotografía 11. Recorrido Urbano entre el colegio Salitre y el club Laverdieri el día 22 de mayo de 2024



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024

Fotografía 12. Acompañamiento de los trabajos de geotecnia en campo por parte de la Interventoría el día 20 de mayo de 2024



Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024

4.8 Programación de la Consultoría

El cronograma del proyecto, a corte del día 27 de mayo de 2024, se encuentra en el **anexo 8.9**, este presenta en el cronograma los siguientes porcentajes:

- Proyecto – 46,95% programado vs 35,22 % ejecutado.
- Fase RAI - 100 % programado vs 100 % ejecutado.
- Fase de Factibilidad 100 % programado y 100 % ejecutado.
- Fase de Estudios y Diseños – 33,20% programado y 18,07% ejecutado.
- Fase Aprobaciones – 0% programado y 0 % ejecutado.

Ilustración 2. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1	PROYECTO COTA: ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA	47%	35%	\$ 6.645.651.967,97	\$ 4.985.200.476,88	\$ 14.155.498.849,14	lun 1/08/22	jue 27/02/25	653,3 días
1.1	Inicio del proyecto	100%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	lun 1/08/22	lun 1/08/22	0 días
1.2	Reunión interdisciplinaria para dar directrices de desarrollo del proyecto	100%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	mar 2/08/22	mié 3/08/22	1 día
1.3	INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	100%	100%	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	lun 1/08/22	vie 30/09/22	51 días
1.4	ELABORACION DE FACTIBILIDAD	100%	100%	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	jue 8/09/22	mié 20/09/23	272,8 días
1.5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE	33%	18%	\$ 3.643.779.189,81	\$ 1.983.327.698,72	\$ 10.975.958.127,98	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	248 días
1.6	APROBACION DE PERMISOS, TRAMITES Y APROBACIONES	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.667.943,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.7	FIN PROYECTO	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	jue 27/02/25	jue 27/02/25	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.1 Cronograma plan de Contingencia.

El cronograma del plan de contingencia para el proyecto, a corte del día 27 de mayo de 2024, presenta en el cronograma los siguientes porcentajes

- Contingencia – 37.58% programado vs 35,23 % ejecutado.
- Fase RAI - 100 % programado vs 100 % ejecutado.
- Fase de Factibilidad 100 % programado y 100 % ejecutado.
- Fase de Estudios y Diseños – 37,58% programado y 35,23% ejecutado.
- Fase Aprobaciones – 0% programado y 0 % ejecutado.

Ilustración 3. Cronograma plan de contingencia a corte del 27 de mayo de 2024.

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1	PROYECTO COTA: ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA, DESDE LA CARRERA 92 (CERRO LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA	38%	35%	\$ 5.319.743.654,48	\$ 4.986.322.065,41	\$ 14.155.498.849,14	lun 1/08/22	jue 27/02/25	653,3 días
1.1	Inicio del proyecto	100%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	lun 1/08/22	lun 1/08/22	0 días
1.2	Reunión interdisciplinaria para dar directrices de desarrollo del proyecto	100%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	mar 2/08/22	mié 3/08/22	1 día
1.3	INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	100%	100%	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	lun 1/08/22	vie 30/09/22	51 días
1.4	ELABORACION DE FACTIBILIDAD	100%	100%	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	jue 8/09/22	mié 20/09/23	272,8 días
1.5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE	21%	18%	\$ 2.317.870.876,32	\$ 1.984.449.287,25	\$ 10.975.958.127,98	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	248 días
1.6	APROBACION DE PERMISOS, TRAMITES Y APROBACIONES	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.667.943,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.7	FIN PROYECTO	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	jue 27/02/25	jue 27/02/25	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.2 Cronograma de la Fase RAI

El cronograma para la Fase RAI, la cual tiene fecha de inicio del 1 de agosto de 2022 y fecha fin el 30 de septiembre de 2022 es el siguiente:

Ilustración 4. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1.3	➤ INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	100%	100%	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	\$ 752.084.872,00	lun 1/08/22	vie 30/09/22	51 días
1.3.1	➤ Visita e Informe de reconocimiento en campo	100%	100%	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	mar 23/08/22	jue 8/09/22	14 días
1.3.2	➤ Componente de Topografía	100%	100%	\$ 50.185.880,00	\$ 50.185.880,00	\$ 50.185.880,00	mié 3/08/22	vie 23/09/22	43 días
1.3.3	➤ Componente Predial	100%	100%	\$ 121.675.152,00	\$ 121.675.152,00	\$ 121.675.152,00	mié 3/08/22	vie 30/09/22	49 días
1.3.4	➤ Componente de Tránsito y Transporte	100%	100%	\$ 17.070.027,00	\$ 17.070.027,00	\$ 17.070.027,00	mié 3/08/22	vie 30/09/22	49 días
1.3.5	➤ Informe de recopilación y análisis de la Información Diseño Geométrico	100%	100%	\$ 20.484.033,00	\$ 20.484.033,00	\$ 20.484.033,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.6	➤ Componente de Urbanismo y Espacio Público	100%	100%	\$ 56.331.090,00	\$ 56.331.090,00	\$ 56.331.090,00	mié 3/08/22	vie 30/09/22	49 días
1.3.7	➤ Informe de recopilación y análisis de la Información Diseño de Redes de Acueducto o Alcantarillado	100%	100%	\$ 20.484.032,00	\$ 20.484.032,00	\$ 20.484.032,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.8	➤ Informe de análisis de información recolectada Redes secas y gas	100%	100%	\$ 20.484.032,00	\$ 20.484.032,00	\$ 20.484.032,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.9	➤ Geotécnica: Informe de recopilación y plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias.	100%	100%	\$ 12.802.520,00	\$ 12.802.520,00	\$ 12.802.520,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.10	➤ Estructuras: Inventario e inspección visual de estructuras existentes.	100%	100%	\$ 61.452.097,00	\$ 61.452.097,00	\$ 61.452.097,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.11	➤ Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	100%	100%	\$ 24.975.307,00	\$ 24.975.307,00	\$ 24.975.307,00	lun 1/08/22	sáb 3/09/22	29 días
1.3.12	➤ Estudios Ambientales: revisar, recopilar, sistematizar y analizar la información ambiental existente	100%	100%	\$ 296.569.343,00	\$ 296.569.343,00	\$ 296.569.343,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.13	➤ Componente de Estudio de Pavimentos	100%	100%	\$ 4.096.807,00	\$ 4.096.807,00	\$ 4.096.807,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.14	➤ Documento de Recopilación de bienes de interés cultural (BIC)	100%	100%	\$ 12.290.420,00	\$ 12.290.420,00	\$ 12.290.420,00	lun 8/08/22	vie 30/09/22	45 días
1.3.15	➤ Componente de Estudios Sociales	100%	100%	\$ 30.726.048,00	\$ 30.726.048,00	\$ 30.726.048,00	lun 1/08/22	vie 30/09/22	51 días
1.3.16	➤ PLAN DE EJECUCION BIM	100%	100%	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	vie 12/08/22	vie 30/09/22	41 días
1.3.17	FIN ETAPA REVISION Y ANALISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE	100%	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	vie 30/09/22	vie 30/09/22	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.3 Cronograma de la Fase de Factibilidad

El cronograma para la Fase Factibilidad, la cual tiene fecha de inicio del 1 de septiembre de 2022 y fecha fin el 20 de septiembre de 2023 es el siguiente:

Ilustración 5. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1.4	➤ ELABORACION DE FACTIBILIDAD	100%	100%	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	\$ 2.249.787.906,16	jue 8/09/22	mié 20/09/23	272,8 días
1.4.1	➤ topografía	100%	100%	\$ 451.672.914,00	\$ 451.672.914,00	\$ 451.672.914,00	vie 30/09/22	jue 16/03/23	104 días
1.4.2	➤ Tránsito y Transporte	100%	100%	\$ 85.350.136,00	\$ 85.350.136,00	\$ 85.350.136,00	mar 13/09/22	jue 23/02/23	100,3 días
1.4.3	➤ Geometría vial	100%	100%	\$ 92.178.145,01	\$ 92.178.145,01	\$ 92.178.145,01	jue 8/09/22	vie 4/08/23	234,3 días
1.4.4	➤ Urbanismo y Espacio Público	100%	100%	\$ 168.993.269,01	\$ 168.993.269,01	\$ 168.993.269,01	sáb 29/10/22	vie 4/08/23	191 días
1.4.5	➤ Hidráulica e Hidrología - redes Acueducto y alcantarillado (hidrosanitarias)	100%	100%	\$ 155.678.647,02	\$ 155.678.647,02	\$ 155.678.647,02	vie 30/09/22	mié 9/08/23	218,3 días
1.4.6	➤ redes secas (energía, telecomunicaciones y gas natural)	100%	100%	\$ 237.614.776,01	\$ 237.614.776,01	\$ 237.614.776,01	vie 30/09/22	mié 23/08/23	229,3 días
1.4.7	➤ Geotécnica / Geología	100%	100%	\$ 135.154.588,00	\$ 135.154.588,00	\$ 135.154.588,00	vie 30/09/22	vie 4/08/23	215,3 días
1.4.8	➤ Estructuras	100%	100%	\$ 61.452.096,98	\$ 61.452.096,98	\$ 61.452.096,98	vie 30/09/22	vie 4/08/23	215,3 días
1.4.9	➤ Ambiental	100%	100%	\$ 587.207.299,14	\$ 587.207.299,14	\$ 587.207.299,14	vie 30/09/22	jue 6/07/23	191 días
1.4.10	➤ pavimentos	100%	100%	\$ 60.223.054,99	\$ 60.223.054,99	\$ 60.223.054,99	sáb 19/11/22	mié 6/09/23	200 días
1.4.11	➤ Arqueología y Bienes de Interés Cultural	100%	100%	\$ 65.548.903,00	\$ 65.548.903,00	\$ 65.548.903,00	vie 30/09/22	mié 22/03/23	108 días
1.4.12	➤ Componente Social	100%	100%	\$ 122.904.195,00	\$ 122.904.195,00	\$ 122.904.195,00	vie 30/09/22	vie 11/03/23	116 días
1.4.13	➤ Presupuestos	100%	100%	\$ 24.580.840,00	\$ 24.580.840,00	\$ 24.580.840,00	sáb 1/10/22	vie 11/08/23	219,3 días
1.4.14	➤ Presentación Proyecto BIM	100%	100%	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	\$ 1.229.042,00	mié 11/01/23	vie 14/07/23	150 días
1.4.15	➤ INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD	100%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	jue 3/08/23	mié 20/09/23	39,5 días
1.4.16	FIN FASE II FACTIBILIDAD	100%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	mié 20/09/23	mié 20/09/23	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.4 Cronograma de la Fase de Estudios y Diseños.

El cronograma para la Fase Estudios y Diseños la cual tiene fecha de inicio del 28 de diciembre de 2023 y fecha fin el 26 de octubre de 2024 es decir, un plazo de diez (10) meses:

Ilustración 6. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1.5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE	33%	18%	\$ 3.643.779.189,81	\$ 1.983.327.698,72	\$ 10.975.958.127,98	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	248 días
1.5.1	Cap. 1 - Estudios y diseños Topográficos	100%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	jue 28/12/23	mié 27/03/24	75 días
1.5.2	Cap 2. Gestion Predial	28%	26%	\$ 305.869.211,46	\$ 282.197.863,55	\$ 1.106.137.753,00	sáb 3/02/24	sáb 26/10/24	218 días
1.5.3	Cap. 3 - Tránsito y Transporte	21%	11%	\$ 35.002.601,05	\$ 18.261.105,13	\$ 165.408.561,00	lun 22/01/24	sáb 26/10/24	227 días
1.5.4	Cap. 4 - Geometría vial	13%	13%	\$ 11.972.097,60	\$ 12.104.834,13	\$ 92.178.145,99	jue 4/04/24	jue 12/09/24	130 días
1.5.5	Cap. 5 - Urbanismo y Espacio Público	30%	22%	\$ 101.446.658,17	\$ 73.410.675,18	\$ 337.986.533,99	lun 22/01/24	sáb 5/10/24	210 días
1.5.6	Cap. 6 - Redes de Acueducto y Alcantarillado	10%	6%	\$ 21.272.926,71	\$ 13.581.988,99	\$ 214.058.139,99	mar 20/02/24	jue 24/10/24	200 días
1.5.7	Cap. 7 - Redes Secas y de Gas	22%	10%	\$ 70.885.240,19	\$ 33.717.536,82	\$ 326.720.318,00	mar 16/04/24	vie 18/10/24	150 días
1.5.8	Cap. 8 - Geotecnia	46%	17%	\$ 1.433.495.831,14	\$ 537.551.828,12	\$ 3.113.677.770,40	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	247 días
1.5.9	Cap. 9 - Estructuras	26%	16%	\$ 245.227.349,90	\$ 156.019.009,27	\$ 960.976.119,71	sáb 9/03/24	jue 24/10/24	185 días
1.5.10	Cap. 10 - Ambiental y Forestal, Seguridad y Salud en el Trabajo	22%	13%	\$ 801.272.825,05	\$ 486.348.703,53	\$ 3.607.755.055,40	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	247 días
1.5.11	Cap. 11 - Pavimentos y Espacio Público Asociado	59%	59%	\$ 149.692.350,98	\$ 149.882.053,61	\$ 252.967.864,52	jue 28/12/23	vie 18/10/24	240 días
1.5.12	Cap. 12 - Arqueología y BIC	55%	54%	\$ 70.065.935,29	\$ 68.252.795,82	\$ 127.001.000,98	sáb 3/02/24	mié 18/09/24	185 días
1.5.13	Cap. 13 - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	86%	33%	\$ 397.576.162,27	\$ 151.940.310,58	\$ 460.890.731,00	jue 28/12/23	sáb 22/06/24	144 días
1.5.14	Cap. 14. Estimación de Costos y Presupuesto	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.572.356,00	sáb 17/08/24	sáb 26/10/24	59 días
1.5.15	Cap. 17- BIM	0%	5%	\$ 0,00	\$ 58.994,02	\$ 1.229.042,00	sáb 10/08/24	mié 2/10/24	44 días
1.5.16	Capacitación No. 2	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	0 días
1.5.17	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.398.736,00	mié 2/10/24	mié 2/10/24	0 días
1.5.18	FIN ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días
1.5.19	INFORME FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.5 Cronograma de la Fase estudios y diseños plan de contingencia

El cronograma para la Fase Estudios y Diseños con el plan de contingencia el cual tiene fecha de inicio del 30 de abril de 2024 se presenta a continuación

Ilustración 7. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1.5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE	21%	18%	\$ 2.317.870.876,32	\$ 1.984.449.287,25	\$ 10.975.958.127,98	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	248 días
1.5.1	Cap. 1 - Estudios y diseños Topográficos	100%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	jue 28/12/23	mié 27/03/24	75 días
1.5.2	Cap 2. Gestion Predial	28%	26%	\$ 305.869.211,46	\$ 282.197.863,55	\$ 1.106.137.753,00	sáb 3/02/24	sáb 26/10/24	218 días
1.5.3	Cap. 3 - Tránsito y Transporte	12%	11%	\$ 19.533.030,81	\$ 18.261.105,14	\$ 165.408.561,00	lun 22/01/24	sáb 26/10/24	227 días
1.5.4	Cap. 4 - Geometría vial	13%	13%	\$ 11.972.097,60	\$ 12.104.834,13	\$ 92.178.145,99	jue 4/04/24	jue 12/09/24	130 días
1.5.5	Cap. 5 - Urbanismo y Espacio Público	30%	22%	\$ 101.446.658,17	\$ 73.410.675,18	\$ 337.986.533,99	lun 22/01/24	sáb 5/10/24	210 días
1.5.6	Cap. 6 - Redes de Acueducto y Alcantarillado	10%	6%	\$ 21.272.926,71	\$ 13.581.988,99	\$ 214.058.139,99	mar 20/02/24	jue 24/10/24	200 días
1.5.7	Cap. 7 - Redes Secas y de Gas	22%	10%	\$ 70.885.240,19	\$ 33.717.536,82	\$ 326.720.318,00	mar 16/04/24	vie 18/10/24	150 días
1.5.8	Cap. 8 - Geotecnia	22%	17%	\$ 675.282.839,09	\$ 538.414.920,38	\$ 3.113.677.770,40	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	247 días
1.5.9	Cap. 9 - Estructuras	26%	16%	\$ 245.227.349,90	\$ 156.019.009,27	\$ 960.976.119,71	sáb 9/03/24	jue 24/10/24	185 días
1.5.10	Cap. 10 - Ambiental y Forestal, Seguridad y Salud en el Trabajo	13%	13%	\$ 483.151.807,02	\$ 486.736.249,18	\$ 3.607.755.055,40	jue 28/12/23	sáb 26/10/24	247 días
1.5.11	Cap. 11 - Pavimentos y Espacio Público Asociado	59%	59%	\$ 149.692.350,98	\$ 149.882.053,61	\$ 252.967.864,52	jue 28/12/23	vie 18/10/24	240 días
1.5.12	Cap. 12 - Arqueología y BIC	55%	54%	\$ 70.065.935,29	\$ 68.252.795,82	\$ 127.001.000,98	sáb 3/02/24	mié 18/09/24	185 días
1.5.13	Cap. 13 - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	35%	33%	\$ 163.471.429,10	\$ 151.811.261,18	\$ 460.890.731,00	jue 28/12/23	sáb 5/10/24	231 días
1.5.14	Cap. 14. Estimación de Costos y Presupuesto	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.572.356,00	sáb 17/08/24	sáb 26/10/24	59 días
1.5.15	Cap. 17- BIM	0%	5%	\$ 0,00	\$ 58.994,02	\$ 1.229.042,00	sáb 10/08/24	mié 2/10/24	44 días
1.5.16	Capacitación No. 2	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	0 días
1.5.17	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.398.736,00	mié 2/10/24	mié 2/10/24	0 días
1.5.18	FIN ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días
1.5.19	INFORME FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	sáb 26/10/24	sáb 26/10/24	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.6 Cronograma de la Fase de Aprobaciones.

El cronograma para la Fase Aprobaciones la cual tiene fecha de inicio del 28 de octubre de 2024 y fecha fin el 27 de febrero de 2025 es el siguiente:

Ilustración 8. Cronograma a corte del 27 de mayo de 2024.

EDT	Nombre de tarea	% Programado	% Ejecutado	Costo Programado	Costo Ejecutado	Costo	Comienzo	Fin	Duración
1.6	APROBACION DE PERMISOS, TRAMITES Y APROBACIONES	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.667.943,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.6.1	TRANSPORTE	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.705.714,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.6.2	DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.459.830,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.6.3	DISEÑO DE REDES SECAS	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.701.846,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.6.4	ESTUDIOS AMBIENTALES	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.800.553,00	lun 28/10/24	jue 27/02/25	100 días
1.6.5	Capacitación No. 3	0%	0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	mié 5/02/25	mié 5/02/25	0 días

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

4.8.7 Cronograma

A la fecha del presente informe se han presentado los siguientes cortes con el % programado y % ejecutado.

Tabla 32. Resumen del % programado y ejecutado.

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
0		0,00%		0,00%		
1	8/08/2022	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%
2	15/08/2022	0,82%	0,52%	0,81%	0,51%	-0,01%
3	22/08/2022	1,49%	0,67%	1,49%	0,68%	0,00%
4	29/05/2022	2,15%	0,66%	2,07%	0,58%	-0,08%
5	5/09/2022	2,84%	0,69%	2,65%	0,58%	-0,19%
6	12/09/2022	3,21%	0,37%	3,00%	0,35%	-0,21%
7	19/09/2022	4,73%	1,52%	3,39%	0,39%	-1,34%
8	26/09/2022	5,84%	1,11%	5,75%	2,36%	-0,09%
9	3/10/2022	6,84%	1,00%	6,56%	0,81%	-0,28%
10	10/10/2022	9,60%	2,76%	8,71%	2,15%	-0,89%
11	17/10/2022	11,40%	1,80%	9,58%	0,87%	-1,82%
12	24/10/2022	13,57%	2,17%	11,45%	1,87%	-2,12%
13	31/10/2022	16,66%	3,09%	12,88%	1,43%	-3,78%
14	7/11/2022	17,55%	0,89%	13,63%	0,75%	-3,92%
15	14/11/2022	18,76%	1,21%	14,97%	1,34%	-3,79%
16	21/11/2022	20,49%	1,73%	16,33%	1,36%	-4,16%
17	28/11/2022	22,87%	2,38%	17,87%	1,54%	-5,00%
18	16/01/2023	19,72%	-3,15%	19,17%	1,30%	-0,55%
19	23/01/2023	20,66%	0,94%	19,33%	0,16%	-1,33%
20	30/01/2023	21,44%	0,78%	19,46%	0,13%	-1,98%
21	6/02/2023	22,60%	1,16%	19,53%	0,07%	-3,07%
22	13/02/2023	23,25%	0,65%	19,78%	0,25%	-3,47%
23	20/02/2023	24,45%	1,20%	20,40%	0,62%	-4,05%
24	27/02/2023	25,30%	0,85%	20,59%	0,19%	-4,71%
25	6/03/2023	26,42%	1,12%	20,70%	0,11%	-5,72%
26	13/03/2023	28,17%	1,75%	20,88%	0,18%	-7,29%
27	20/03/2023	29,62%	1,45%	21,07%	0,19%	-8,55%

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
28	27/03/2023	31,03%	1,41%	21,25%	0,18%	-9,78%
29	3/04/2023	32,53%	1,50%	21,33%	0,08%	-11,20%
30	10/04/2023	33,48%	0,95%	21,37%	0,04%	-12,11%
31	17/04/2023	35,47%	1,99%	21,37%	0,00%	-14,10%
32	24/04/2023	37,36%	1,89%	21,69%	0,32%	-15,67%
33	1/05/2023	39,08%	1,72%	21,84%	0,15%	-17,24%
34	8/05/2023	41,07%	1,99%	21,99%	0,15%	-19,08%
35	15/05/2023	43,26%	2,19%	22,39%	0,40%	-20,87%
36	22/05/2023	45,08%	1,82%	22,50%	0,11%	-22,58%
37	29/05/2023	46,95%	1,87%	22,61%	0,11%	-24,34%
38	5/06/2023	48,96%	2,01%	22,73%	0,12%	-26,23%
39	12/06/2023	50,47%	1,51%	22,82%	0,09%	-27,65%
40	19/06/2023	52,38%	1,91%	22,85%	0,03%	-29,53%
41	26/06/2023	54,33%	1,95%	22,85%	0,00%	-31,48%
42	3/07/2023	56,42%	2,09%	22,85%	0,00%	-33,57%
43	10/07/2023	59,38%	2,96%	22,85%	0,00%	-36,53%
44	17/07/2023	62,46%	3,08%	22,90%	0,05%	-39,56%
45	24/07/2023	64,15%	1,69%	22,94%	0,04%	-41,21%
46	31/07/2023	77,51%	13,36%	22,96%	0,02%	-54,55%
47	7/08/2023	97,18%	19,67%	22,97%	0,01%	-74,21%
48	14/08/2023	98,68%	1,50%	22,97%	0,00%	-75,71%
49	21/08/2023	98,72%	0,04%	23,02%	0,05%	-75,70%
50	28/08/2023	98,77%	0,05%	23,02%	0,00%	-75,75%
51	4/09/2023	98,82%	0,05%	23,02%	0,00%	-75,80%
52	11/09/2023	98,87%	0,05%	23,02%	0,00%	-75,85%
53	18/09/2023	98,92%	0,05%	23,02%	0,00%	-75,90%
54	1/01/2024	21,52%	-77,40%	21,47%	-1,55%	-0,05%
55	8/01/2024	22,00%	0,48%	21,88%	0,41%	-0,12%
56	15/01/2024	22,35%	0,35%	22,07%	0,19%	-0,28%
57	22/01/2024	22,67%	0,32%	22,20%	0,13%	-0,47%
58	29/01/2024	23,40%	0,73%	22,52%	0,32%	-0,88%
59	5/02/2024	23,87%	0,47%	23,22%	0,70%	-0,65%
60	12/02/2024	24,44%	0,57%	23,31%	0,09%	-1,13%
61	19/02/2024	24,91%	0,47%	23,75%	0,44%	-1,16%
62	26/02/2024	25,99%	1,08%	23,97%	0,22%	-2,02%
63	4/03/2024	26,88%	0,89%	24,06%	0,09%	-2,82%
64	11/03/2024	27,87%	0,99%	24,19%	0,13%	-3,68%
65	18/03/2024	29,04%	1,17%	25,19%	1,00%	-3,85%
66	25/04/2024	30,28%	1,24%	25,71%	0,52%	-4,57%
67	1/04/2024	31,29%	1,01%	26,37%	0,66%	-4,92%

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
68	8/04/2024	32,68%	1,39%	26,93%	0,56%	-5,75%
69	15/04/2024	34,09%	1,41%	27,66%	0,73%	-6,43%
70	22/04/2024	35,53%	1,44%	28,33%	0,67%	-7,20%
71	29/04/2024	37,16%	1,63%	29,19%	0,86%	-7,97%
72	6/05/2024	38,84%	1,68%	30,28%	1,09%	-8,56%
73	13/05/2024	41,29%	2,45%	32,24%	1,96%	-9,05%
74	20/05/2024	44,38%	3,09%	33,16%	0,92%	-11,22%
75	27/05/2024	46,95%	2,57%	35,22%	2,06%	-11,73%

Fuente: Informes semanales de Interventoría.

En relación con la Fase de plan de contingencia, el porcentaje % programado vs % ejecutado a corte No.75 del 27 de mayo de 2024 es el siguiente:


Tabla 33. Resumen del % programado y ejecutado. Plan de Contingencia

Semana	Corte No.	% Programado Contingencia	% Ejecutado contingencia	Costo Programado	Costo Ejecutado	Diferencia
72	6/05/2024	31,54%	30,30%	\$ 4.464.861.672	\$ 4.289.193.473	-1,24%
73	13/05/2024	33,05%	32,26%	\$ 4.679.040.136	\$ 4.567.216.363	-0,79%
74	20/05/2024	34,97%	33,16%	\$ 4.950.426.864	\$ 4.694.651.929	-1,81%
75	27/05/2024	37,58%	35,23%	\$ 5.319.743.654	\$ 4.986.322.065	-2,35%

Fuente: Informes semanales de Interventoría.

En la Gráfica 1 se encuentra el 46.95. % programado y 35.22% ejecutado con corte al día 27 de mayo de 2024, en esta se observa el atraso del 11.73 %, el cual se da por el atraso en la entrega de los productos, presentado en la Fase de Factibilidad y en la Fase de Estudios y Diseños. Debido a la anterior se activa el plan de contingencia en la semana 72 el cual para la fecha se encuentra con un 37.58 % programado y un 35.23% ejecutado, observando un atraso del 2.35%.

Gráfica 3. Programado vs Ejecutado a corte del Informe semanal No.75

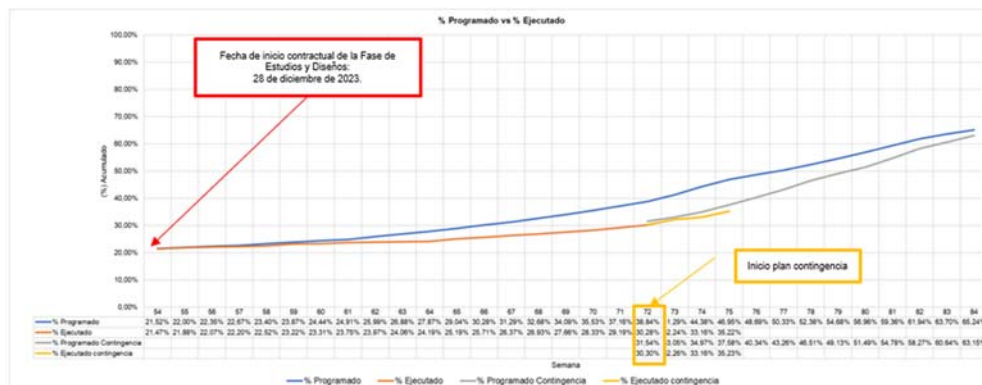

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, cronograma del proyecto, corte No.75.

En relación con la Fase de RAI, el porcentaje % programado vs % ejecutado a corte No.75 del 27 de mayo de 2024 es el siguiente:

Tabla 34. Resumen del % programado y ejecutado Fase RAI.

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
0		0,0%		0,0%		
1	8/08/2022	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	0,0%
2	15/08/2022	14,0%	9,0%	14,0%	9,0%	0,0%
3	22/08/2022	26,0%	12,0%	26,0%	12,0%	0,0%
4	29/05/2022	37,0%	11,0%	36,0%	10,0%	-1,0%
5	5/09/2022	49,0%	12,0%	46,0%	10,0%	-3,0%
6	12/09/2022	55,0%	6,0%	52,0%	6,0%	-3,0%
7	19/09/2022	80,0%	25,0%	58,0%	6,0%	-22,0%
8	26/09/2022	99,0%	19,0%	98,0%	40,0%	-1,0%
9	3/10/2022	100,0%	1,0%	98,0%	0,0%	-2,0%
10	10/10/2022	100,0%	0,0%	100,0%	2,0%	0,0%
11	17/10/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
12	24/10/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
13	31/10/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
14	7/11/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
15	14/11/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
16	21/11/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
17	28/11/2022	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
18	16/01/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
19	23/01/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
20	30/01/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
21	6/02/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
22	13/02/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
23	20/02/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
24	27/02/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
25	6/03/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
26	13/03/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
27	20/03/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
28	27/03/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
29	3/04/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
30	10/04/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
31	17/04/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
32	24/04/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
33	1/05/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
34	8/05/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
35	15/05/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
36	22/05/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
37	29/05/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
38	5/06/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
39	12/06/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
40	19/06/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
41	26/06/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
42	3/07/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
43	10/07/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
44	17/07/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
45	24/07/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
46	31/07/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
47	7/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
48	14/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
49	21/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
50	28/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
51	4/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
52	11/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
53	18/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
54	1/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
55	8/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
56	15/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
57	22/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
58	29/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
59	5/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
60	12/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
61	19/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
62	26/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
63	4/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
64	11/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
65	18/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
66	25/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
67	1/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
68	8/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
69	15/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
70	22/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
71	29/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
72	6/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
73	13/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
74	20/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
75	27/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, Informes semanales de Interventoría

En relación con la Fase de Factibilidad, el porcentaje % programado vs % ejecutado a corte No. 75 del 27 de mayo de 2024 es el siguiente:

Tabla 35. Resumen del % programado y ejecutado Fase Factibilidad.

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
0						
1	8/08/2022					
2	15/08/2022					
3	22/08/2022					
4	29/05/2022					
5	5/09/2022					
6	12/09/2022	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7	19/09/2022	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
8	26/09/2022	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%
9	3/10/2022	6,0%	5,0%	5,0%	4,0%	-1,0%
10	10/10/2022	22,0%	16,0%	17,0%	12,0%	-5,0%
11	17/10/2022	33,0%	11,0%	22,0%	5,0%	-11,0%
12	24/10/2022	45,0%	12,0%	33,0%	11,0%	-12,0%

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
13	31/10/2022	63,0%	18,0%	41,0%	8,0%	-22,0%
14	7/11/2022	68,0%	5,0%	45,0%	4,0%	-23,0%
15	14/11/2022	75,0%	7,0%	53,0%	8,0%	-22,0%
16	21/11/2022	85,0%	10,0%	61,0%	8,0%	-24,0%
17	28/11/2022	99,0%	14,0%	70,0%	9,0%	-29,0%
18	16/01/2023	81,0%	-18,0%	77,0%	7,0%	-4,0%
19	23/01/2023	86,0%	5,0%	78,0%	1,0%	-8,0%
20	30/01/2023	91,0%	5,0%	79,0%	1,0%	-12,0%
21	6/02/2023	98,0%	7,0%	80,0%	1,0%	-18,0%
22	13/02/2023	100,0%	2,0%	81,0%	1,0%	-19,0%
23	20/02/2023	100,0%	0,0%	85,0%	4,0%	-15,0%
24	27/02/2023	100,0%	0,0%	86,0%	1,0%	-14,0%
25	6/03/2023	100,0%	0,0%	87,0%	1,0%	-13,0%
26	13/03/2023	100,0%	0,0%	88,0%	1,0%	-12,0%
27	20/03/2023	100,0%	0,0%	89,0%	1,0%	-11,0%
28	27/03/2023	100,0%	0,0%	90,0%	1,0%	-10,0%
29	3/04/2023	100,0%	0,0%	90,0%	0,0%	-10,0%
30	10/04/2023	100,0%	0,0%	90,0%	0,0%	-10,0%
31	17/04/2023	100,0%	0,0%	90,0%	0,0%	-10,0%
32	24/04/2023	100,0%	0,0%	92,0%	2,0%	-8,0%
33	1/05/2023	100,0%	0,0%	93,0%	1,0%	-7,0%
34	8/05/2023	100,0%	0,0%	94,0%	1,0%	-6,0%
35	15/05/2023	100,0%	0,0%	96,0%	2,0%	-4,0%
36	22/05/2023	100,0%	0,0%	97,0%	1,0%	-3,0%
37	29/05/2023	100,0%	0,0%	98,0%	1,0%	-2,0%
38	5/06/2023	100,0%	0,0%	98,0%	0,0%	-2,0%
39	12/06/2023	100,0%	0,0%	99,0%	1,0%	-1,0%
40	19/06/2023	100,0%	0,0%	99,0%	0,0%	-1,0%
41	26/06/2023	100,0%	0,0%	99,0%	0,0%	-1,0%
42	3/07/2023	100,0%	0,0%	99,0%	0,0%	-1,0%
43	10/07/2023	100,0%	0,0%	99,0%	0,0%	-1,0%
44	17/07/2023	100,0%	0,0%	99,0%	0,0%	-1,0%



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
45	24/07/2023	100,0%	0,0%	99,54%	0,5%	-0,5%
46	31/07/2023	100,0%	0,0%	99,64%	0,1%	-0,4%
47	7/08/2023	100,0%	0,0%	99,68%	0,0%	-0,3%
48	14/08/2023	100,0%	0,0%	99,69%	0,0%	-0,3%
49	21/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,3%	0,0%
50	28/08/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
51	4/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
52	11/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
53	18/09/2023	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
54	1/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
55	8/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
56	15/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
57	22/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
58	29/01/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
59	5/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
60	12/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
61	19/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
62	26/02/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
63	4/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
64	11/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
65	18/03/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
66	25/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
67	1/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
68	8/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
69	15/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
70	22/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
71	29/04/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
72	6/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
73	13/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
74	20/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
75	27/05/2024	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, Informes semanales de Interventoría.

En relación con la Fase de Estudios y Diseños, el porcentaje % programado vs % ejecutado a corte No. 75 del 27 de mayo de 2024 es el siguiente:

Tabla 36. Resumen del % programado y ejecutado Fase Estudios y Diseños.

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
0						
1	8/08/2022					
2	15/08/2022					
3	22/08/2022					
4	29/05/2022					
5	5/09/2022					
6	12/09/2022					
7	19/09/2022					
8	26/09/2022					
9	3/10/2022					
10	10/10/2022					
11	17/10/2022					
12	24/10/2022					
13	31/10/2022					
14	7/11/2022					
15	14/11/2022					
16	21/11/2022					
17	28/11/2022					
18	16/01/2023					
19	23/01/2023					
20	30/01/2023					
21	6/02/2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
22	13/02/2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
23	20/02/2023	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-2,0%
24	27/02/2023	3,0%	1,0%	0,0%	0,0%	-3,0%
25	6/03/2023	5,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-5,0%
26	13/03/2023	7,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-7,0%
27	20/03/2023	9,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-9,0%
28	27/03/2023	11,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-11,0%
29	3/04/2023	13,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-13,0%



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
30	10/04/2023	14,0%	1,0%	0,0%	0,0%	-14,0%
31	17/04/2023	16,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-16,0%
32	24/04/2023	19,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-19,0%
33	1/05/2023	21,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-21,0%
34	8/05/2023	24,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-24,0%
35	15/05/2023	27,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-27,0%
36	22/05/2023	29,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-29,0%
37	29/05/2023	32,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-32,0%
38	5/06/2023	34,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-34,0%
39	12/06/2023	36,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-36,0%
40	19/06/2023	39,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-39,0%
41	26/06/2023	41,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-41,0%
42	3/07/2023	44,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-44,0%
43	10/07/2023	48,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-48,0%
44	17/07/2023	52,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-52,0%
45	24/07/2023	54,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-54,0%
46	31/07/2023	72,0%	18,0%	0,0%	0,0%	-72,0%
47	7/08/2023	98,0%	26,0%	0,0%	0,0%	-98,0%
48	14/08/2023	100,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
49	21/08/2023	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
50	28/08/2023	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
51	4/09/2023	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
52	11/09/2023	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
53	18/09/2023	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
54	1/01/2024	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
55	8/01/2024	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%
56	15/01/2024	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%
57	22/01/2024	2,0%	1,0%	1,0%	0,0%	-1,0%
58	29/01/2024	3,0%	1,0%	2,0%	1,0%	-1,0%
59	5/02/2024	4,0%	1,0%	3,0%	1,0%	-1,0%
60	12/02/2024	4,0%	0,0%	3,0%	0,0%	-1,0%
61	19/02/2024	4,0%	0,0%	3,0%	0,0%	-1,0%

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
62	26/02/2024	4,0%	0,0%	3,0%	0,0%	-1,0%
63	4/03/2024	7,0%	3,0%	4,0%	1,0%	-3,0%
64	11/03/2024	9,0%	2,0%	4,0%	0,0%	-5,0%
65	18/03/2024	10,0%	1,0%	5,0%	1,0%	-5,0%
66	25/04/2024	12,0%	2,0%	6,0%	1,0%	-6,0%
67	1/04/2024	13,0%	1,0%	7,0%	1,0%	-6,0%
68	8/04/2024	15,0%	2,0%	7,0%	0,0%	-8,0%
69	15/04/2024	17,0%	2,0%	8,0%	1,0%	-9,0%
70	22/04/2024	18,0%	1,0%	9,0%	1,0%	-9,0%
71	29/04/2024	18,0%	0,0%	9,0%	0,0%	-9,0%
72	6/05/2024	23,0%	5,0%	12,0%	3,0%	-11,0%
73	13/05/2024	26,0%	3,0%	14,0%	2,0%	-12,0%
74	20/05/2024	26,0%	0,0%	14,0%	0,0%	-12,0%
75	27/05/2024	33,0%	7,0%	18,0%	4,0%	-15,0%

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, Informes semanales de Interventoría.

En relación con la Aprobaciones, el porcentaje % programado vs % ejecutado a corte No. 75 del 27 de mayo de 2024 es el siguiente:

Tabla 37. Resumen del % programado y ejecutado Fase Aprobaciones.

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
0						
1	8/08/2022					
2	15/08/2022					
3	22/08/2022					
4	29/05/2022					
5	5/09/2022					
6	12/09/2022					
7	19/09/2022					
8	26/09/2022					
9	3/10/2022					
10	10/10/2022					
11	17/10/2022					
12	24/10/2022					
13	31/10/2022					



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
14	7/11/2022					
15	14/11/2022					
16	21/11/2022					
17	28/11/2022					
18	16/01/2023					
19	23/01/2023					
20	30/01/2023					
21	6/02/2023					
22	13/02/2023					
23	20/02/2023					
24	27/02/2023					
25	6/03/2023					
26	13/03/2023					
27	20/03/2023					
28	27/03/2023					
29	3/04/2023					
30	10/04/2023					
31	17/04/2023					
32	24/04/2023					
33	1/05/2023					
34	8/05/2023					
35	15/05/2023					
36	22/05/2023					
37	29/05/2023					
38	5/06/2023					
39	12/06/2023					
40	19/06/2023					
41	26/06/2023					
42	3/07/2023					
43	10/07/2023	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
44	17/07/2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
45	24/07/2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

Semana	Corte No.	% Programado	% Programado Semanal	% Ejecutado	% Ejecutado Semanal	Diferencia
46	31/07/2023	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
47	7/08/2023	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%
48	14/08/2023	3,0%	2,0%	0,0%	0,0%	-3,0%
49	21/08/2023	6,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-6,0%
50	28/08/2023	10,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-10,0%
51	4/09/2023	13,0%	3,0%	0,0%	0,0%	-13,0%
52	11/09/2023	17,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-17,0%
53	18/09/2023	21,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-21,0%
54	1/01/2024	0,0%	-21,0%	0,0%	0,0%	0,0%
55	8/01/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
56	15/01/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
57	22/01/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
58	29/01/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
59	5/02/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
60	12/02/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
61	19/02/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
62	26/02/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
63	4/03/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
64	11/03/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
65	18/03/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
66	25/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
67	1/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
68	8/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
69	15/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
70	22/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
71	29/04/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
72	6/05/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
73	13/05/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
74	20/05/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
75	27/05/2024	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, Informes semanales de Interventoría.

4.9 Certificados vigentes de calibración o ajuste de los equipos de inspección.

En el periodo entre el 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024, se presentaron actividades en campo en el componente de geotecnia, por lo cual se anexan los certificados de calibración de quipos en el anexo 8.16.

4.10 Reporte de salida no conforme.

La Interventoría ha realizado la revisión y solicitudes de entrega de los productos para dar cierre a la Fase de Factibilidad y productos de la Fase de Estudios y Diseños. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en el anexo 8.10 se evidencia los productos no conformes para el presente periodo y las acciones tomadas frente al incumplimiento en la entrega de estos.

Tabla 38. Salidas no conforme informe No.18.

ID	Salida No conforme	Fecha de Detección	Descripción de no conformidad y causas	Acción Tomada	Responsable de la acción tomada	Fecha de acción
1	Estudio de Tránsito	08/sep/2023	A fecha de corte del presente informe, la Consultoría no ha dado cierre al producto Estudio de Tránsito, en razón a que presentan observaciones por parte de la secretaria Distrital de Movilidad mediante comunicado 202322410123331 del día 8 de septiembre de 2023. Para dar cierre se requiere finalizar los diseños de los componentes de urbanismo y diseño geométrico.	El 15 de abril de 2024, la Interventoría mediante comunicado CIC-IDU-083-0424 y radicado IDU 202452600697252, reiteró que no se puede aprobar el producto "Estudio de Tránsito" en la versión 5 teniendo en cuenta que no se han subsanado las observaciones de la SDM, se deberá contar con los diseños definitivos del componente de urbanismo y diseño geométrico.	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro Mesa - Coordinador de Interventoría. Luis Guio - Especialista de Tránsito.	15/abril/2024
2	Informe de Redes Húmedas (Fase Factibilidad).	11/ene/2024	A fecha de corte del presente informe, la Consultoría no ha dado cierre al producto de la Fase de Factibilidad "Informe de Factibilidad de Redes Húmedas" en versión 7. el cual presentó observaciones por parte del IDU mediante comunicado 202423600008801 del día 11 de enero de 2024.	El día 7 de marzo de 2024, la Interventoría remitió mediante comunicado CIC-IDU-023-0324 y radicado IDU 202452600487072 la aprobación del producto "Informe de Redes Hidrosanitarias" en la versión No.9. A corte del día 27 de mayo de 2024, está pendiente por parte de la interventoría actualizar los planos con la firma del director William Malaber.	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría. Ricardo Montenegro - Especialista Redes Húmedas.	7/marzo/2024

ID	Salida No conforme	Fecha de Detección	Descripción de no conformidad y causas	Acción Tomada	Responsable de la acción tomada	Fecha de acción
3	Informe Final Factibilidad - V3	27/mar/2024	A fecha de corte del presente informe, la Consultoría no ha dado cierre al producto de la Fase de Factibilidad "Informe Final Factibilidad" en versión 3. el cual presentó observaciones por parte del IDU mediante comunicado mediante 202423600478241 del día 27 de marzo de 2024.	El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-039-0524 las observaciones al producto "Informe Final de Factibilidad" en la versión 4. A corte del 27 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	20/mayo/2024
4	Informe ejecutivo Factibilidad - V1	13/mar/2024	A fecha de corte del presente informe, la Consultoría no ha dado cierre al producto de la Fase de Factibilidad "Informe ejecutivo Factibilidad" en versión 3. el cual presentó observaciones por parte del IDU mediante comunicado mediante 202423600421151 del día 13 de marzo de 2024.	El día 20 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-033-0524 las observaciones al producto "Informe ejecutivo de Factibilidad" en la versión 2.A corte del 27 de mayo de 2024, la Consultoría está atendiendo observaciones.	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	20/mayo/2024
5	Diseño Geométrico	23/may/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cierre al producto de la fase de estudios y diseños informe "Ajuste altimétrico y secciones transversales–Diseño Geométrico"	El 23 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1239 el producto • El día 28 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-073-0524 las observaciones al producto	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	28/mayo/2024
6	Urbanismo	08/abr/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cierre al producto Ajustes, actualizaciones, complementaciones documento factibilidad.	El 15 de abril de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-078-0424 observaciones al producto A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría se encuentra en atención a las observaciones del producto	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	15/abril/2024

ID	Salida No conforme	Fecha de Detección	Descripción de no conformidad y causas	Acción Tomada	Responsable de la acción tomada	Fecha de acción
7	Estructuras	02/abr/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cierre al producto de la fase de estudios y Diseños Informe Patología Estructuras Existentes.	El 23 de abril de 2024, la a Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-102-0424 las observaciones al producto A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría está en atención de las observaciones	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	23/abril/2024
8	Geotecnia	16/may/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cierre al producto de la fase de estudios y Diseños "Plan de Exploración de Geotecnia" en la versión No.5	El 16 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1217 el producto El 24 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-063-0524 las observaciones al producto " A corte del día 31 de mayo de 2024, la Consultoría se encuentra atendiendo las observaciones al producto	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	24/mayo/2024
9	BIM	31/may/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cumplimiento a los compromisos pactados para el componente BIM de la fase de estudios y diseños	Actualmente se están realizando mesas de trabajo semanales entre la interventoría, consultoría e IDU para ver el avance del cumplimiento de los requerimientos del componente BIM	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	31/mayo/2024
10	Patrimonio y Bienes de Interés cultural.	22/may/2024	A fecha de corte del presente informe, la consultoría no ha dado cierre al producto de la fase de estudios y diseños " Documento BIC Fase de Estudios y Diseños"	El 22 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1234 el producto El 29 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-079-0524 observaciones al producto	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	29/mayo/2024

ID	Salida No conforme	Fecha de Detección	Descripción de no conformidad y causas	Acción Tomada	Responsable de la acción tomada	Fecha de acción
11	Predial	16/may/2024	A fecha de corte del presente informe, la Interventoría no ha dado cierre al producto de la fase de estudios y diseños "Metodológica Gestión Predial" el cual presento observaciones por el IDU mediante comunicado observaciones del IDU 202432500535551 del 18 de abril de 2024.	El 16 de mayo de 2024, la Interventoría remitió a la Consultoría mediante comunicado CIC-IDU-019-0524 las observaciones al producto. • El día 28 de mayo de 2024, la Consultoría remitió a la Interventoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1244 observaciones al producto	William Malaver Bello- Director de Interventoría. Sebastián Caro - Coordinador de Interventoría.	16/mayo/2024

Fuente: Consorcio Interventoría Cota, 2024.

4.11 Reporte para la actualización de los estudios, factibilidad, diagnósticos, diseños e intervenciones realizadas en la infraestructura vial de la ciudad, según formato IDU vigente.

A la fecha de corte del presente informe, no se han realizado intervenciones en la infraestructura vial.

5 INFORME SOCIAL.

5.1 Informe mensual de la Consultoría.

La trazabilidad del informe mensual social de la Consultoría No.18 es la siguiente:

- El 11 de junio de 2024, la consultoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1266 remitió a la interventoría el informe social en su versión inicial.
- El 14 de junio de 2024, la interventoría mediante comunicado CIC-IDU-037-0624 y radicado IDU 202452601060032, remitió a la consultoría observaciones al informe social.
- El 20 de junio de 2024, la consultoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1289 remitió a la interventoría la subsanación de las observaciones realizadas mediante comunicado CIC-IDU-037-0624,
- El 26 de junio de 2024 la interventoría mediante comunicado CIC-IDU-075-0624 y radicado IDU 202452601142812 remitió a la consultoría aprobación del informe social N0 18

5.2 Informe mensual de la Interventoría.

- El informe mensual social de la Interventoría No.18 en la versión No.0. se radicará de forma independiente a este informe, este contendrá integrado el informe mensual social No.18 de la Consultoría en la versión No.0

6 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DE SST.

6.1 Informe mensual ambiental de la Consultoría.

- El 13 de junio de 2024, la consultoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1279 remitió a la interventoría el informe social en su versión inicial.

Al corte del presente informe la interventoría se encuentra realizando observaciones al informe ambiental No 18 de la consultoría

6.2 Informe mensual ambiental de la Interventoría.

El informe mensual ambiental de la Interventoría No.18 en la versión No.0. se radicará de forma independiente a este informe.

6.3 Informe mensual SST de la Consultoría.

La trazabilidad del informe mensual SST de la Consultoría No.18 es la siguiente:

- El 12 de junio de 2024, la consultoría mediante comunicado 1026-1815-2021-1274 remitió a la interventoría el informe social en su versión inicial.
- El 21 de junio de 2024, la interventoría mediante comunicado CIC-IDU-061-0624 remitió a la consultoría observaciones al informe SST en su versión inicial.

Al corte del presente informe la Consultoría se encuentra atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría al informe ambiental No 18 de la consultoría

6.4 Informe mensual SST de la Interventoría.

El informe mensual SST de la Interventoría No.18 en la versión No.0. se radicará de forma independiente a este informe, acorde en el aplicativo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones a corte del presente informe y teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto son:

- El estado de avance del PDT al corte de presente informe es el siguiente:

Total, avance contrato: 46,95% programado vs 35,22% ejecutado, respecto a las Fases se tiene:

- Fase RAI - 100 % programado vs 100 % ejecutado.
- Fase Factibilidad - 100 % programado y 100 % ejecutado.
- Fase Estudios y Diseños – 33,20% programado y 18,07% ejecutado.
- Fase Aprobaciones -0 % programado y 0 % ejecutado.

Teniendo en cuenta el atraso que presentaba el contrato, el día 22 de abril de 2024, la Interventoría radicó al IDU mediante comunicado CIC-IDU-103-0424 y bajo consecutivo 202452600738252 el informe de presunto incumplimiento al Contrato IDU-1815-2021, en razón a los atrasos generados por la no presentación de productos del componente de Redes Húmedas.

Paralelamente y teniendo en cuenta lo dispuesto contractualmente, la Interventoría solicito al Consultor la presentación de un plan de contingencia que permitiera al Consultor recuperar el atraso que se presentaba. Una vez presentado y aprobado por la Interventoría, se inició la implementación de este desde la semana No. 72 y transcurridas tres semanas desde su inicio, al corte del presente informe mensual se tiene el siguiente estado de avance:

Plan de Contingencia.37.58 % programado y 35.23 % ejecutado.

Así las cosas, se presenta un atraso del 2.35% a corte del día 27 de mayo de 2024 (Semana 75), cuyo rango es aceptable dentro de la implementación e este tipo de procesos; sin embargo, la Interventoría ha continuado con el exhaustivo proceso de control y seguimiento de la fase de estudios y diseños con el fin de asegurar que el Consultor cumpla con lo pactado y se lleve a feliz término el contrato.

- Por parte, desde la Interventoría, se ha continuado con la gestión y seguimiento de la entrega de la totalidad de los documentos de vinculación del personal, acorde con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU y Guía de Maduración de Proyectos.
- A la fecha de corte del presente informe, se continúan haciendo las gestiones correspondientes con los dueños de los predios que a la fecha no han dado permiso de acceso para la realización de actividades de perforaciones de Geotecnia, Pavimentos y levantamiento forestal. Dada que esta problemática es recurrente, se ha solicitado el apoyo de la Alcaldía de Cota con el fin de realizar acercamientos

más precisos con los propietarios y con esto poder adelantar las actividades restantes.

Aunado a lo anterior, se ha requerido en comités de seguimiento OGA el acompañamiento del IDU en las reuniones y visitas que se tengan con los propietarios de los predios, con el fin de tener una posición unificada ante la Comunidad y generar los espacios necesarios para lograr el permiso.

Igualmente, la Interventoría solicitó al Consultor analizar técnicamente las implicaciones de no realizar estas actividades (geotecnia, pavimentos, forestal) y la propuesta de solución técnica que se debería implementar para poder finalizar los diseños.

- Respecto a la facturación, se están adelantando las acciones necesarias tanto de Interventoría como de parte de la Consultoría para lograr la aprobación de los informes mensuales de todas las áreas con el fin de cobrar los básicos de cada contrato que son aquellos valores que están castigando a los contratos en este momento, toda vez que el cobro de productos se ha realizado conforme se obtiene la aprobación de estos.
- Se recomienda adelantar la mesa de trabajo con la CAR de manera prioritaria, puesto que la presentación de la propuesta de vallados ante esta Entidad es de vital importancia para continuar con el desarrollo del proyecto y evitar reprocesos en el manejo de los vallados y en general del área de sustracción de la reserva Van Der Hammen que se deba tramitar.

8 ANEXOS

Los anexos del Informe mensual son:

- **Anexo 8.1** - Pólizas y Garantías expedidas en el periodo y actas de aprobación de Pólizas del IDU
- **Anexo 8.2** - Actas Suscritas en el periodo. - **No aplica para el presente periodo**
- **Anexo 8.3** - Actas de comité semanal realizadas en el periodo Formato IDU, FO-DP- 06.
- **Anexo 8.4** - Actas de reunión realizadas en el periodo Formato IDU, FO-PE-14 _ FO-P 13.
- **Anexo 8.5** - Actas de pago que se generaron en el periodo. Formato IDU, FO-DP-08 _ FO-DP-09
- **Anexo 8.6** - Cuadro financiero con corte a la presentación del presente Informe - Formato IDU, FO-EO-46
- **Anexo 8.7** - Programa anual de caja – PAC
- **Anexo 8.8** - Listas de chequeo de recibo de productos, de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proyecto, (formatos IDU) – **No aplica para el periodo.**
- **Anexo 8.9** - Cronograma del Contrato.
- **Anexo 8.10** - Salidas No Conformes – Formato IDU, FO-AC-12
- **Anexo 8.11** - Certificación de Cumplimiento del plan de calidad del consultor
- **Anexo 8.12** - Informes semanales Interventoría
- **Anexo 8.13** - Cuadros de seguimiento de actividades de convenios de acuerdo con lo solicitado por el IDU.
- **Anexo 8.14** - Actas de competencia de pago con cada ESP y TIC actualizadas. - Formato IDU, FO-IN-07 – **No aplica para el presente periodo**
- **Anexo 8.15** - Formatos IDU
- **Anexo 8.16** - Certificaciones de calibración
- **Anexo 8.17** - Oficios de aprobación de productos.

9 REFERENCIAS

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2021). *Manual Interventoría y-o Supervisión Versión 9*. Bogotá D.C.

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (s.f.). *Instituto de Desarrollo Urbano - IDU*. Obtenido de <https://www.idu.gov.co/page/documentacion-contractual>



INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS

CÓDIGO: FO-DP-18

VERSIÓN: 3

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1	2022-02-07	Versión inicial del documento.	107

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



Participaron en la elaboración¹	Doris Jeane Rodríguez López, STED / Manuel Antonio Fragoso Crespo, SGDU / Marcela Forero Mejía, STED / Paula Andrea Tamayo Madrid, DTP / Roberto Carlos Alemán López, OAP / Silvia Liliana Santos Ángel, DTP / Valentina Botero Parra, DTP / Wilson Jair Rangel Jiménez, STED / Wilson Ruiz Rodríguez, STED / Yolanda López Patino, STED /
Validado por	Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2022-02-07
Revisado por	Yolanda López Patino, STED Revisado el 2022-02-07
Aprobado por	María Constanza García Alicastro, DTP Aprobado el 2022-02-07

¹El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
