

Bogotá D.C., martes 13 de mayo de 2025

Señores

**SECRETARÍA GENERAL**

Concejo de Bogotá

Email: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

Calle 36 No. 28A 41

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 14-05-2025 05:22:14

2025ER12958 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL/PEDRO ORLANDO MOLANO P

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 607 DE 2025

OBS: —

ASUNTO: Respuesta a radicado UAERMV No. 20251120071512 del 09 de mayo de 2025. Proposición 607 del 08 de mayo de 2025, radicado Concejo de Bogotá 2025IE8361 Tema: Balance de la capacidad de la administración para resolver problemas y atender las necesidades más sentidas por la ciudadanía.

Cordial saludo,

En atención al cuestionario allegado a esta Entidad, el cual corresponde a la proposición No 607 de 2025 que se relaciona a continuación:

<b>N° de proposición:</b>	607 de 2025
<b>Sesión aprobatoria:</b>	Plenaria
<b>N° Rad. Interno Concejo de Bogotá:</b>	2025IE8361
<b>N° Rad. Interno UAERMV:</b>	20251120071512 del 09 de mayo de 2025
<b>Tema de la proposición:</b>	Balance de la capacidad de la administración para resolver problemas y atender las necesidades más sentidas por la ciudadanía

Me permito en atención a lo dispuesto en el artículo 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019 “*Por el cual se expide el reglamento interno del concejo de Bogotá, Distrito Capital*” y en cumplimiento de las funciones y competencias asignadas a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV mediante el artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificadas a través del artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, dar respuesta sobre los numerales 121, 122 y 132 en los siguientes términos:

**“121. ¿Qué criterios se utilizan para priorizar las intervenciones en la malla vial, y cómo se garantiza que las obras cumplan con los plazos establecidos? Describa brevemente.”**

**Respuesta:** Respondiendo a su solicitud relacionada con los criterios que se utilizan para priorizar las intervenciones en la malla vial, se informa que, la UAERMV en el marco de su misión institucional y su modelo de priorización de vías utiliza un modelo que evalúa tres dimensiones: social, económica y técnica.

Cada segmento vial recibe una calificación de 0 a 100, permitiendo establecer un orden de intervención según el nivel de afectación y otros factores como: la viabilidad del estado de las redes de acueducto y alcantarillado, capacidad operativa de la entidad, la existencia de reservas sobre los segmentos viales por parte de otras entidades o pólizas de calidad y estabilidad de las obras vigentes, así como a la disponibilidad de recursos asignados a la UAERMV, los cuales son limitados y deben ser distribuidos

entre todas las localidades de la ciudad basándose en la extensión y estado de la malla vial de cada una de ellas, por lo que no necesariamente implica una priorización para la intervención inmediata de los tramos diagnosticados.

Además, para la vigencia 2025, la UAERMV ha diseñado e implementado una estrategia de intervención por zonas (norte, oriente, occidente, sur) y cuadrantes de intervención de manera coordinada con las Alcaldías Locales, con las Empresas de Servicios Públicos y con las entidades del sector movilidad bajo el liderazgo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

De esta manera se implementaron las **Unidades de Intervención Zonal – UIZ**, que son unidades operativas que se encargan de optimizar la atención de las vías y el espacio público en diferentes zonas de la ciudad, con el propósito de tener una intervención efectiva que atienda las necesidades de conservación de mayor impacto y sumar capacidades institucionales para optimizar tiempos y recursos durante la ejecución de las obras.

En la siguiente imagen se presenta la implementación de las UIZ en la ciudad:

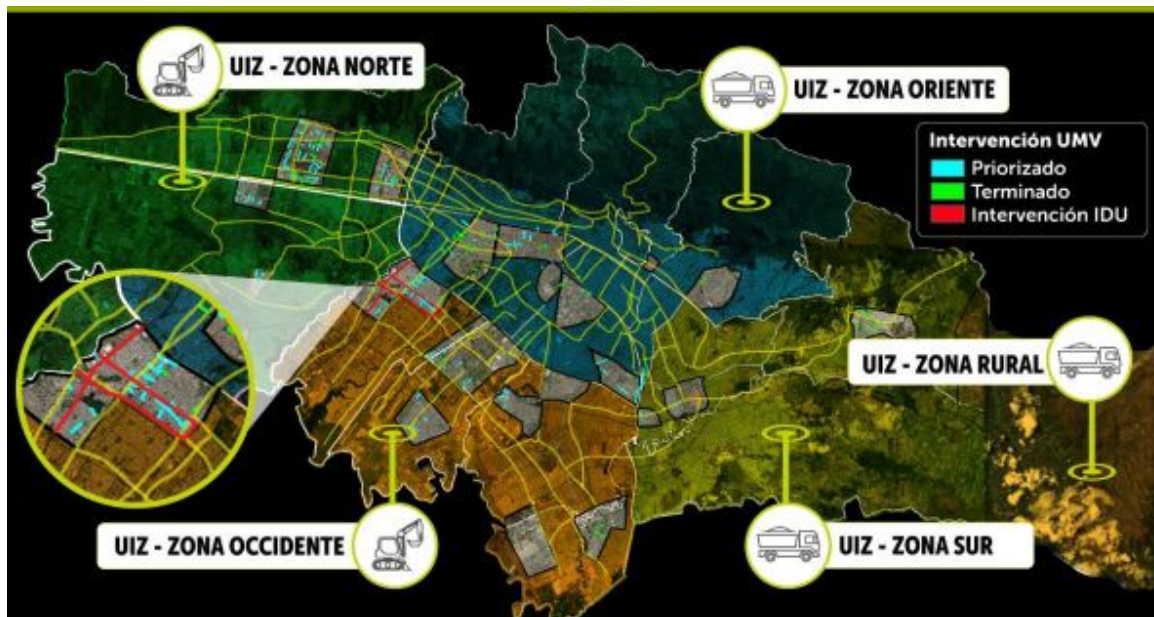


Imagen 1. Estrategia de priorización por zonas y cuadrantes UIZ

Fuente: UAERMV

En cuanto a *garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos*, es importante señalar que la UAERMV ejecuta sus actividades de forma directa, siguiendo un proceso de priorización adelantado por la Subdirección de Planificación y Conservación, tal como se explicó previamente. Esta etapa incluye, entre otras acciones, la gestión de la reserva de los segmentos a intervenir ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), así como la elaboración de diseños, en caso de que la naturaleza de la intervención lo requiera.

Una vez priorizado el segmento, este es recibido por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual, a través de sus dos gerencias (Urbana y Rural), adelanta el alistamiento previo necesario para inicio a la ejecución de las actividades. Esta Subdirección se encarga de programar los

materiales, la mano de obra y los insumos ante la Subdirección de Producción y Apoyo logístico; además, elabora la programación y gestiona la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito ante la Secretaría de Movilidad (SDM).

Una vez se tiene lista la etapa de alistamiento, se da inicio a la ejecución de las obras en los periodos establecido en la programación. De esta manera, la entidad, al cumplir con todas las actividades previas, garantiza la ejecución de las intervenciones dentro de los tiempos proyectados.

***“122. ¿Cuáles son las medidas que desde el sector se están tomando para optimizar y corregir la estructuración y ejecución de los contratos relacionados con la infraestructura vial de la ciudad? Describa brevemente, señale los impactos y refiera magnitudes.”***

**Respuesta:** Aunque la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) no suscribe contratos de obra, ya que ejecuta directamente las intervenciones sobre la malla vial local e intermedia, desde el sector y al interior de la entidad se han implementado diversas medidas para optimizar la planeación, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura vial. Entre estas acciones adoptadas se destacan:

- La implementación de las Unidades de Intervención Zonal (UIZ), que permiten mejorar la logística, reducir traslados innecesarios y aumentar la cobertura de intervención.
- El fortalecimiento de herramientas de monitoreo y programación, como sistemas de información georreferenciada, que permiten planificar mejor y reducir reprocesos.
- El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con empresas de servicios públicos, alcaldías locales y entidades del sector movilidad, para minimizar interferencias durante la ejecución.

**Impactos:** Estas medidas han contribuido a una mayor capacidad de respuesta, mejor uso de los recursos disponibles y mayor efectividad en la atención de la malla vial priorizada, especialmente en zonas de alta demanda

**Magnitudes:** Durante la vigencia anterior, la UAERMV logró intervenir un número significativo de segmentos viales bajo este enfoque operativo.

Si bien los resultados específicos pueden variar según la vigencia y las condiciones operativas, la implementación de estas estrategias ha fortalecido los procesos de intervención directa, permitiendo una ejecución más ordenada y con mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

***“132. ¿Qué porcentaje de los corredores priorizados ha sido intervenido?”***

**Respuesta:** Para cada vigencia, La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) realiza la priorización de forma trimestral. Para el segundo trimestre de 2025, la UAERMV priorizó un total de 222 segmentos viales para actividades de mantenimiento periódico. De estos:

- 30 segmentos (13,5%) han sido intervenidos y se encuentran en estado "Terminado".
- 2 segmentos (0,9%) se encuentran en ejecución.
- 190 segmentos (85,6%) están pendientes por ejecutar.

Por lo tanto, el porcentaje de segmentos priorizados que se ha sido intervenido (estado Terminado) corresponde al 13,5% del total priorizado para este trimestre.

PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
152263	800047 8	KENNEDY	VISION DE ORIENTE	IN	CL 13	KR 79 C	KR 80 A	Cambio de Losa	POR EJECUTAR
152454	800786 1	KENNEDY	CLASS	LO	CL 57A S	KR 80J	KR 81	Cambio de Losa	EN EJECUCIÓN
165338	100051 55	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	CM	KR 111	CL 64	CL 64A	Cambio de Losa	POR EJECUTAR
165337	100052 86	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	CM	KR 111	AC 63	CL 64	Cambio de Losa	EN EJECUCIÓN
137306	100347 6	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	LO	KR 7G	CL 150	CL 150A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139856	100363 2	USAQUEN	ACACIAS USAQUEN	IN	CL 146	AK 9	KR 11	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139939	100359 7	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	IN	CL 148	KR 7BBIS	KR 7BBISA	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
159136	100067 65	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	IN	KR 90	CL 69A	CL 69ABIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
160525	100047 25	ENGATIVA	PARIS	IN	KR 91A	CL 76	CL 76A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
161419	100040 32	ENGATIVA	LOS CEREZOS	IN	KR 89A	TV 89	DG 83C	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
164182	100050 44	ENGATIVA	SANTA MONICA	CM	CL 71B	KR 99C	KR 100	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
178860	120014 52	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	IN	KR 22	CL 82	CL 82A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414331	180015 68	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	LO	CL 28D S	KR 12L	KR 13	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
416019	180021 96	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	LO	KR 10C	CL 27 S	CL 27A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
416022	180021 97	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	CL 27A S	KR 10C	KR 10D	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
2510532	180018 27	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	KR 12D	CL 27 SUR	CL 27 B SUR	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
137392	100617 3	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	IN	KR 7H	CL 152	CL 152	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
139729	100382 1	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 136	KR 18	KR 18A	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
159711	100074 90	ENGATIVA	SANTA HELENITA	IN	CL 69A	KR 77A	KR 77B	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
161435	100022 95	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	IN	KR 89A	CL 89BIS	AC 90	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178617	120024 45	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	IN	KR 27A	CL 63G	CL 64	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
179370	120018 92	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	IN	CL 70	KR 50	KR 51	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185749	160037 16	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 40B S	CL 41 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185750	160036 56	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 40A S	CL 40B S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
188631	160004 58	PUENTE ARANDA	LA TRINIDAD	IN	CL 4G	KR 60	KR 62	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
415750	180020 71	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	LO	KR 11A	CL 27 S	CL 27A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414213	180015 21	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	CL 27 S	KR 12H	KR 12HBIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414224	180015 24	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	KR 13	CL 28C S	CL 28D S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
415613	180020 17	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	CL 27 S	KR 11	KR 11A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
522380	100084 72	ENGATIVA	LA ESTRADA	IN	KR 69	CL 71	AC 72	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
522425	100086 49	ENGATIVA	LA ESTRADA	IN	KR 69	Sin Establecer	CL 70A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
522829	100101 39	ENGATIVA	LA ESTRADA	IN	KR 69	CL 70A	CL 71	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR





PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
901564	120033 69	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	IN	DG 71BIS	KR 50	KR 51	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
137890	100352 6	USAQUEN	CAOBOS SALAZAR	LO	KR 12	CL 146	AC 147	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
157726	100086 63	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	LO	KR 68H	CL 69B	Sin Establecer	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158800	100074 89	ENGATIVA	SANTA HELENITA	IN	KR 77A	CL 69A	CL 70	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
159750	100078 24	ENGATIVA	BOYACA	LO	CL 68	KR 76BIS	KR 77	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
160933	100051 89	ENGATIVA	PARIS	IN	CL 76A	KR 87	KR 87A	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
164183	100049 60	ENGATIVA	SANTA MONICA	CM	CL 71B	KR 100	KR 100A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185744	160040 28	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 42A S	CL 42B S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185778	160042 47	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	KR 53	CL 43 S	CL 44 S	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	TERMINAD O
185779	160040 99	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	KR 53	CL 42A S	CL 43 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
185788	160038 21	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	KR 54	CL 41 S	CL 42 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
188191	160010 48	PUENTE ARANDA	SAN GABRIEL	IN	KR 56	AC 3	CL 4	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
320569	600017 3	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	KR 54B	DG 50 S	DG 50A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137389	100351 2	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	IN	KR 7H	CL 148	CL 150	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
139730	100381 5	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 136	KR 18A	AK 19	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158818	100077 15	ENGATIVA	BOYACA	LO	KR 77	CL 68A	CL 68B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
159137	100066 98	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	IN	KR 90	CL 69ABIS	CL 70	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
159142	100061 50	ENGATIVA	LOS ALAMOS	IN	KR 90	CL 71C	AC 72	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
162426	100035 99	ENGATIVA	LOS CEREZOS	IN	CL 84ABIS	KR 89	KR 89A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178842	120021 72	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	CM	KR 22	CL 71A	AC 72	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185742	160042 62	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 43 S	CL 44 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185743	160041 37	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 42B S	CL 43 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
320505	600014 4	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	KR 54B	DG 49A S	DG 50 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
320651	600020 6	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	LO	KR 55	DG 49 S	DG 51 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
320654	600020 7	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	DG 51 S	KR 55	KR 55A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
413906	180014 12	RAFAEL URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	KR 13	CL 27A S	CL 28B S	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	TERMINAD O
414376	180015 78	RAFAEL URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	CL 27 S	KR 12G	KR 12H	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414876	180017 32	RAFAEL URIBE	GUSTAVO RESTREPO	LO	KR 12HBIS	CL 28B S	CL 28C S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
2518179	180018 80	RAFAEL URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	KR 12D	CL 27B S	CL 28B S	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
137307	100362 4	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	IN	KR 7A	CL 148	CL 152	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
138030	100394 6	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	KR 17	CL 134A	CL 135	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
179897	120013 63	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	IN	CL 83	KR 21A	KR 22	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185746	160039 08	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 41B S	CL 42 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
188254	160005 98	PUENTE ARANDA	LA PRADERA	LO	KR 64	CL 4B	CL 4D	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
320478	600013	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	LO	DG 49A S	KR 54	KR 54B	Parcheo-Bacheo	POR



PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
	4								EJECUTAR
320692	600022 0	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	KR 54B	DG 50A S	DG 51 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414192	180015 14	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	CL 28C S	KR 12L	KR 13	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
415937	180021 56	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	CL 27A S	KR 10D	KR 11	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
472787	180068 90	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	CL 27 SUR	KR 12	KR 12	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9102295 7	180018 27	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	CL 27 A SUR	KR 12 D	KR 12 D	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178840	120022 65	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	CM	KR 22	CL 70A	CL 71	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178862	120013 50	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	IN	KR 22	CL 83	CL 83A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
188215	160008 29	PUENTE ARANDA	SAN GABRIEL	Local	KR 57A	CL 4	CL 4B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
410351	180001 06	RAFAEL URIBE URIBE	SANTIAGO PEREZ	IN	CL 26 S	KR 26C	KR 27	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414068	180014 68	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	KR 13	CL 28B S	CL 28C S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
137390	100346 8	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	IN	KR 7H	CL 150	CL 151	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139654	100394 7	USAQUEN	EL CONTADOR	CM	CL 134A	KR 17	KR 18	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158097	100087 10	ENGATIVA	LA ESTRADA	CM	CL 69BIS	KR 69	KR 69A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
160939	100046 89	ENGATIVA	PARIS	IN	CL 76A	KR 90BIS	KR 90A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
161434	100024 24	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	IN	KR 89A	CL 89	CL 89BIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
164177	100052 84	ENGATIVA	SANTA MONICA	CM	DG 72	Sin Establecer	KR 97BIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137305	100352 3	USAQUEN	CEDRO SALAZAR	LO	KR 7G	CL 148	CL 150	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139857	100347 0	USAQUEN	CAOBOS SALAZAR	LO	CL 146	KR 13	KR 14B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158098	100086 75	ENGATIVA	LA ESTRADA	LO	CL 69BIS	KR 69A	KR 69C	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
160602	100054 24	ENGATIVA	PARIS	LO	KR 87	CL 75B	CL 76A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
161480	100036 03	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	IN	CL 84A	KR 89A	KR 90	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178324	120018 56	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	CM	KR 51	CL 70	DG 71BIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178618	120024 10	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	IN	KR 27A	CL 64	CL 64A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185786	160042 35	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	KR 54	CL 43 S	CL 44 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
186392	160035 86	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	CL 40A S	KR 52C	AK 68	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
320630	600019 4	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	DG 51 S	KR 55A	TV 60	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
414071	180014 69	RAFAEL URIBE URIBE	GUSTAVO RESTREPO	IN	CL 28C S	KR 13	KR 13BIS	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
415858	180021 20	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	KR 11	CL 27 S	CL 27A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
416352	180023 45	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	IN	CL 27A S	KR 10	KR 10A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138011	100397 8	USAQUEN	EL CONTADOR	LO	KR 16	CL 134A	CL 135	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138021	100390 5	USAQUEN	EL CONTADOR	LO	KR 16A	CL 135	CL 136	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139728	100382 3	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 136	KR 17A	KR 18	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158073	100088 02	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	LO	CL 69B	KR 68F	KR 68H	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
158810	100077 29	ENGATIVA	BOYACA	LO	KR 76	CL 68B	CL 69A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR



PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
159139	100064 81	ENGATIVA	LOS ALAMOS	IN	KR 90	CL 70A	CL 70B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
160934	100051 18	ENGATIVA	PARIS	IN	CL 76A	KR 87A	KR 88	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178838	120023 53	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	CM	KR 22	AC 68	CL 69	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178839	120023 12	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	CM	KR 22	CL 69	CL 70A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178865	120012 00	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	IN	KR 22	CL 84	CL 85A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
178866	120010 89	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	IN	KR 22	CL 85A	CL 86	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185747	160038 38	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 41A S	CL 41B S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185748	160037 77	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	KR 52C	CL 41 S	CL 41A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
185780	160038 62	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	LO	KR 53	CL 41 S	CL 42 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
188632	160004 40	PUENTE ARANDA	LA TRINIDAD	IN	CL 4G	KR 62	KR 63	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
320771	600024 4	TUNJUELITO	VENECIA OCCIDENTAL	IN	DG 51 S	KR 54	KR 54A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
410505	180001 59	RAFAEL URIBE URIBE	SANTIAGO PEREZ	IN	CL 26 S	KR 26	KR 26A	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
415572	180020 01	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	LO	KR 12BIS	CL 27 S	CL 27A S	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
416155	180022 57	RAFAEL URIBE URIBE	SOSIEGO SUR	LO	KR 10A	CL 27 S	CL 27A S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9106370 8	100119 72	ENGATIVA	LOS ALAMOS	LO	CL 71 C	KR 90	KR 90 B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9106370 9	100119 73	ENGATIVA	LOS ALAMOS	IN	KR 90	CL 70 B	CL 71 B	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
387200	900283 8	FONTIBON	MODELIA OCCIDENTAL	LO	KR 85A	CL 23D	CL 23F	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
9103089 9	110141 35	SUBA	BOSQUES DE SAN JORGE	IN	CL 148	KR 92	Sin Establecer	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9103090 0	110141 34	SUBA	BOSQUES DE SAN JORGE	IN	CL 148	KR 95	KR 98	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
181447	130004 55	TEUSAQUILLO	SAN LUIS	IN	DG 61B	TV 22A	TV 23	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
151791	800161 4	KENNEDY	VILLA ALSACIA II	LO	KR 72B	CL 11A	CL 11ABIS	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
9101304 3	801282 3	KENNEDY	TINTALA	LO	KR 92	CL 7	CL 8 A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
902508	801404 1	KENNEDY	VILLA ALSACIA II	LO	TV 73	CL 11 B	CL 11C	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
902511	801403 9	KENNEDY	NUEVO TECHO	LO	CL 11BBISA	TV 79	KR 79A	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
181039	130017 51	TEUSAQUILLO	SANTA TERESITA	LO	CL 43	DG 43BIS	KR 16	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
388738	900347 1	FONTIBON	MODELIA OCCIDENTAL	IN	CL 23	KR 75	KR 80ABIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
386619	900255 7	FONTIBON	FERROCAJA FONTIBON	LO	CL 23D	AK 86	TV 88B	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
148270	800958 0	KENNEDY	PROVIVIENDA	IN	KR 68HBIS	CL 31A S	CL 34 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
149307	801092 0	KENNEDY	SANTA CATALINA	LO	KR 72J	CL 42G S	CL 43 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
149310	801109 9	KENNEDY	SANTA CATALINA	LO	KR 72J	CL 43 S	CL 45 S	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
149309	801109 9	KENNEDY	SANTA CATALINA	LO	KR 72J	CL 43 S	CL 45 S	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
169194	110026 92	SUBA	BRITALIA	LO	CL 165	KR 54C	KR 55A	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
176209	110040 22	SUBA	LAS FLORES	LO	CL 147	KR 98	KR 98B	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
176195	110046 52	SUBA	LAS FLORES	LO	KR 94C	CL 146C	CL 147	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
172987	110037	SUBA	BOSQUES DE SAN	IN	KR 92	CL 148	CL 149	Parcheo-Bacheo	POR

PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
	23		JORGE						EJECUTAR
176203	110043 49	SUBA	LAS FLORES	LO	CL 147	KR 94C	KR 95	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
530090	130025 60	TEUSAQUILLO	NICOLAS DE FEDERMAN	CM	CL 57B	KR 47	AK 50	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
169177	110041 36	SUBA	BRITALIA	IN	KR 55C	CL 160BIS	CL 161	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
169178	110039 09	SUBA	BRITALIA	IN	KR 55C	CL 161	CL 161A	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
9101304 0	801439 4	KENNEDY	TINTALA	LO	CL 7	KR 90	KR 92	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
506535	130022 35	TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	IN	KR 17	AC 34	CL 35	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9102718 8	801369 3	KENNEDY	TINTALA	CM	KR 92	Sin Establecer	CL 7	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
607300	110131 97	SUBA	BRITALIA	IN	CL 163	KR 55B	KR 55C	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
169233	110018 86	SUBA	BRITALIA	CM	KR 54A	CL 169	CL 170	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
607303	110131 98	SUBA	BRITALIA	IN	CL 163	KR 55	KR 55BIS	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
180684	130009 87	TEUSAQUILLO	GALERIAS	IN	KR 27	AC 53	CL 53B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
169199	110023 64	SUBA	BRITALIA	LO	CL 166	KR 55A	KR 55D	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
181525	130019 34	TEUSAQUILLO	EL RECUERDO	LO	KR 33BIS	CL 25B	CL 25C	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
2300023 9	900443 8	FONTIBON	CIUDAD HAYUELOS	CM	CL 19A	KR 80A	KR 81B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9101441 3	900427 5	FONTIBON	CIUDAD HAYUELOS	CM	KR 82	CL 19A	CL 19B	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
9101308 6	801440 0	KENNEDY	NUEVO TECHO	LO	CL 10D	KR 79	AK 80	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9101324 0	801403 8	KENNEDY	NUEVO TECHO	CM	TV 79	CL 11B	CL 11 B BIS A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
151792	800151 7	KENNEDY	VILLA ALSACIA II	CM	KR 72B	CL 11ABIS	TV 72 B	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
152202	800126 4	KENNEDY	VILLA ALSACIA II	CM	TV 74	CL 11ABIS	CL 11B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
181113	130012 99	TEUSAQUILLO	PALERMO	LO	DG 46	TV 20	TV 21	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
180653	130012 14	TEUSAQUILLO	ALFONSO LOPEZ	LO	KR 26	CL 49	CL 50	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
181097	130014 47	TEUSAQUILLO	PALERMO	LO	CL 45A	KR 20	KR 22	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
180408	130012 87	TEUSAQUILLO	ALFONSO LOPEZ	LO	KR 19	DG 48	CL 49	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9101371 5	801431 3	KENNEDY	TIMIZA A	LO	DG 40C S	KR 72JBIS	KR 72 K	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
149560	800945 2	KENNEDY	TIMIZA A	IN	CL 40 C SUR	KR 72 M	KR 72 M BIS B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
148432	800923 7	KENNEDY	PROVIVIENDA	IN	CL 34 S	KR 68N	KR 69	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
148431	800950 2	KENNEDY	PROVIVIENDA	IN	CL 34 S	KR 68I	KR 68N	Parcheo-Bacheo	TERMINAD O
186489	160038 63	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	IN	CL 42 S	KR 53	KR 54	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
186533	160041 00	PUENTE ARANDA	ALQUERIA	Interme dia	CL 43 S	KR 53	KR 54	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
385758	900221 3	FONTIBON	SANTA CECILIA	IN	CL 25G	KR 85C	KR 85H	Cambio de Losa	POR EJECUTAR
473485	900426 1	FONTIBON	SANTA CECILIA	IN	CL 25G	KR 85B	KR 85C	Cambio de Losa	POR EJECUTAR
386266	900242 4	FONTIBON	SANTA CECILIA	IN	CL 25G	KR 82	KR 85B	Cambio de Losa	POR EJECUTAR
139026	100519 5	USAQUEN	SAN PATRICIO	IN	CL 109	KR 17A	KR 18	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137015	100528 4	USAQUEN	SAN PATRICIO	CM	KR 16	CL 108	CL 109	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR





PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
139024	100524 2	USAQUEN	SAN PATRICIO	IN	CL 109	KR 16	KR 17	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
188743	160020 06	PUENTE ARANDA	PENSILVANIA	IN	KR 31	CL 10	CL 11	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9102486 1	100055 7	USAQUEN	EL VERVENAL	IN	CL 187	Sin Establecer	KR 20	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137075	100532 6	USAQUEN	SAN PATRICIO	CM	KR 17A	CL 106	CL 106A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139023	100528 9	USAQUEN	SAN PATRICIO	IN	CL 109	AK 15	KR 16	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
9101934 9	100721 1	USAQUEN	SANTA BIBIANA	IN	CL 106	KR 17A	Sin Establecer	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
510778	100530 5	USAQUEN	SANTA BIBIANA	IN	CL 106	Sin Establecer	AK 19	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138780	100059 8	USAQUEN	EL CEREZO	LO	KR 19	CL 186	CL 186A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138782	100054 5	USAQUEN	EL CEREZO	LO	KR 19	CL 186B	CL 186C	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138781	100057 2	USAQUEN	EL CEREZO	LO	KR 19	CL 186A	CL 186B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138778	100085 2	USAQUEN	EL VERVENAL	LO	KR 19	CL 184	CL 185	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
189242	160021 12	PUENTE ARANDA	PENSILVANIA	LO	CL 10	AK 30	KR 31	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
189281	160018 16	PUENTE ARANDA	PENSILVANIA	IN	CL 12	KR 31	KR 31A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
180681	130011 11	TEUSAQUILLO	ALFONSO LOPEZ	IN	KR 27	CL 51	CL 51A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
472576	130024 64	TEUSAQUILLO	GALERIAS	IN	CL 52	KR 25	KR 26	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
144507	300003 4	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	IN	CL 36	KR 8	KR 13	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
144016	300001 9	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	IN	KR 13A	CL 37	CL 38	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
144506	300003 6	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	IN	CL 36	KR 7	KR 8	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
144014	300004 1	SANTA FE	SAGRADO CORAZON	IN	KR 13A	CL 34	CL 36	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
136969	100532 3	USAQUEN	MOLINOS NORTE	LO	KR 14A	CL 109	CL 110	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	TERMINAD O
166903	110109 05	SUBA	MONACO	IN	KR 50	CL 115	AC 116	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
166912	110109 85	SUBA	MONACO	IN	KR 53	CL 113	CL 114	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
9101010 2	110142 30	SUBA	MONACO	CM	CL 118	KR 50	KR 50A	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
9101015 3	110142 29	SUBA	MONACO	CM	CL 118	KR 50A	KR 50A	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
146580	800622 1	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY SUR	LO	KR 78M	CL 38C S	CL 39 S	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
146772	800619 2	KENNEDY	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL	CM	CL 41B S	KR 79G	AK 80	Parcheo-Bacheo (MBR / FE)	POR EJECUTAR
187798	160021 55	PUENTE ARANDA	LA CAMELIA	IN	TV 52	CL 1A	CL 1B	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
510013	100418 3	USAQUEN	LA CALLEJA	AR	AK 19	CL 128B	CL 131	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
189346	160014 70	PUENTE ARANDA	ESTACION CENTRAL	AR	CL 17	AK 30	KR 32	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
140710	100263 1	USAQUEN	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	CM	CL 163	KR 1BIS	KR 1A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
142869	200145 3	CHAPINERO	MARIA CRISTINA	LO	CL 64	KR 4	KR 5	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
165281	100052 15	ENGATIVA	SAN ANTONIO ENGATIVA	IN	CL 64D	KR 110	KR 110BIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
174148	110043 55	SUBA	LA GAITANA	LO	TV 126F	CL 132D	CL 133	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
174149	110041 53	SUBA	LA GAITANA	LO	TV 126F	CL 133	CL 135	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
520014	900283	FONTIBON	SANTA CECILIA	LO	KR 80C	CL 25B	CL 25C	Parcheo-Bacheo	POR

PK_ID ELEMEN TO	CIV	LOCALIDAD	SECTOR	TIPO MALLA	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Intervención	Estado de ejecución
	6								EJECUTAR
387064	900277 2	FONTIBON	SANTA CECILIA	LO	KR 80C	CL 25C	CL 25D	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
507000	120028 40	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	AR	AC 68	KR 21	KR 22	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137856	100400 3	USAQUEN	CEDRITOS	IN	KR 10A	CL 138	CL 140	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137864	100396 1	USAQUEN	CEDRITOS	CM	KR 11	CL 138	CL 140	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137865	100389 8	USAQUEN	CEDRITOS	IN	KR 11	CL 140	CL 142	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
137935	100380 0	USAQUEN	CEDRITOS	IN	KR 13	CL 140	CL 142	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138015	100379 1	USAQUEN	EL CONTADOR	LO	KR 16	CL 136	CL 140	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
138088	100364 3	USAQUEN	LOS CEDROS	IN	KR 20	CL 140	CL 142	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139751	100400 8	USAQUEN	CEDRITOS	IN	CL 140	KR 7C	KR 7CBIS	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139752	100399 2	USAQUEN	CEDRITOS	IN	CL 140	KR 7CBIS	AK 9	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139755	100813 0	USAQUEN	CEDRITOS	IN	CL 140	AK 9	KR 10A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139758	100814 8	USAQUEN	CEDRITOS	IN	CL 140	KR 11	KR 12	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139762	100380 1	USAQUEN	CEDRITOS	IN	CL 140	KR 13	AK 15	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139766	100372 6	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 140	KR 16A	KR 17	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139767	100370 8	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 140	KR 17	KR 17A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139769	100368 4	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 140	KR 18	KR 18A	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR
139770	100367 2	USAQUEN	EL CONTADOR	IN	CL 140	KR 18A	AK 19	Parcheo-Bacheo	POR EJECUTAR

Fuente: Subdirección de Intervención de la Infraestructura (UAERMV). / Corte al 12 de mayo de 2025.


Es importante aclarar que, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) a diario evalúa la posibilidad de programar los tramos viales priorizados, dentro de la ejecución por misionalidad que adelanta la Entidad, sin embargo, su intervención está supeditada a la disponibilidad de recursos asignados, viabilidad del estado de las redes de acueducto y alcantarillado, capacidad operativa de la Entidad, las intervenciones que tienen programadas otras entidades, entre otras, lo cual no implica una intervención inmediata.

Con lo anterior, damos respuesta a su solicitud y reiteramos nuestro compromiso de seguir con el desarrollo de Bogotá dentro de los límites de nuestra misión y los recursos disponibles.

Cordialmente,

Documento 20251400056881 firmado electrónicamente por:	
<b>PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ</b>	Director General DIRECCIÓN GENERAL orlando.molano@umv.gov.co Fecha firma: 14-05-2025 15:42:47
<b>Aprobó:</b>	CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ - Gerente de Intervención urbana - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA - carlos.castano@umv.gov.co
<b>Revisó:</b>	ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA - Secretaría General - SECRETARÍA GENERAL - rosita.barrios@umv.gov.co
	PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES - Subdirector de Planificación y Conservación - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN - pablo.munoz@umv.gov.co



	RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRI - Jefe de Oficina - OFICINA JURÍDICA - rafael.uribe@umv.gov.co
	SANDRA FABIOLA RODRÍGUEZ TRIVIÑO - Contratista - SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - sandra.rodriguez@umv.gov.co
<b>Proyectó:</b>	CAROLINA CAÑÓN RODRIGUEZ - Contratista - OFICINA JURÍDICA - carolina.canon@umv.gov.co
 0d7d4a3d25b08f26de4b7e69fc91ba01d62eb32618562ca6371d57084868b47a Codigo de Verificación CV: f8b35 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	
