

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad: BOGOTA D.C.
 Responsable: Oscar Florez Moreno
 Horizonte: 2020 - 2023
 Presupuesto 2021: \$
 Control Posterior: 13/08/2021
 Seguimiento de: agosto 2021

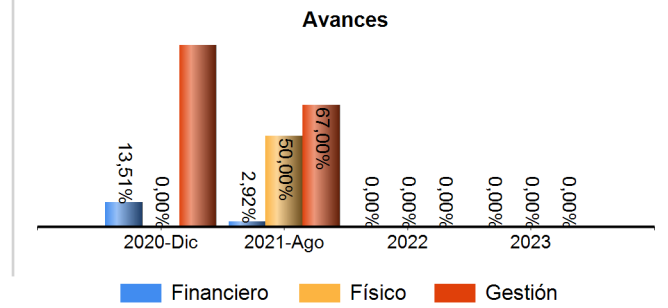

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2100	0,1050	50,00 %

Observaciones : Avance de acuerdo con el comité de obra del mes de agosto de 2021 para el convenio interadministrativo. Porcentaje de ejecución de la obra del 58%.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$90.670.000	\$74.223.000	\$74.223.000
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$2.279.524.000	\$2.465.977.000	
TOTAL	\$2.370.194.000	\$2.540.200.000	\$74.223.000

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0200	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se encuentra definida la linea de contratación, esta en curso el tramite para la adición de recursos al Convenio Interadministrativo. Se tiene proyectado la gestión de recursos.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	\$170.006.000	\$0			
TOTAL	\$170.006.000	\$0			

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51% Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Ago	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	16.494.000	Financiero 2,92% Físico 50,00% Gestión 67,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	2.895.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	3.383.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	16.494.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	16.494.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %	2,92 %	2,92 %	2,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	47,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	17,00 %	17,00 %	17,00 %	33,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	67,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Comités de Obra realizados	6,0000	4,0000	66,67 %
Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	2.540.200.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	8.247.000
---Bogota-BOGOTA	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	8.247.000

>> Regionalización de Productos

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

> **Anexos**

Descripción

- Informe de avance de obra - Apoyo a la supervisión.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324
