

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad: BOGOTA D.C.
 Responsable: Oscar Florez Moreno
 Horizonte: 2020 - 2023
 Presupuesto 2021: \$
 Control Posterior: 30/12/2020
 Seguimiento de: junio 2021

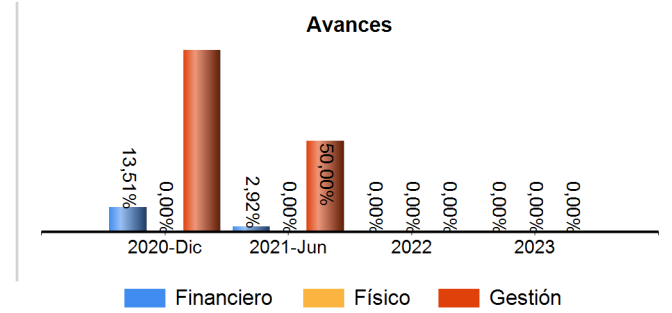

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,2100	0,0000	0,00 %

Observaciones : Avance de acuerdo con el comite de obra del mes de junio de 2021 para el convenio interadministrativo.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$90.670.000	\$90.670.000	\$74.223.000
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$2.279.524.000	\$2.279.524.000	
TOTAL	\$2.370.194.000	\$2.370.194.000	\$74.223.000

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0200	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se están gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	\$170.006.000	\$170.006.000			
TOTAL	\$170.006.000	\$170.006.000			

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51% Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Jun	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	0	Financiero 2,92% Físico 0,00% Gestión 50,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	2.895.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	3.383.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.540.200.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %	2,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	17,00 %	17,00 %	17,00 %	33,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Comites de Obra realizados	6,0000	3,0000	50,00 %
Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	2.540.200.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,92 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	0
---Bogota-BOGOTA	2.540.200.000	2.540.200.000	74.223.000	74.223.000	0

>> Regionalización de Productos

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324
