

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad:
Responsable:
Horizonte: 2020 - 2023
Presupuesto 2023: \$
Control Posterior: 29/09/2023
Seguimiento de: septiembre 2023

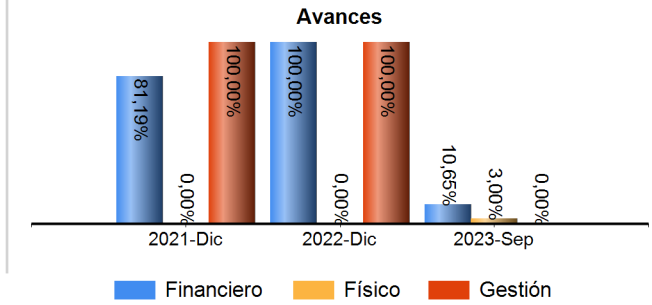

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS					
Sede construida y dotada					
Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,3380	0,1500	0,0210	14,00 %
Observaciones : En el marco del apoyo a la modernización física de las instalaciones del Concejo, se realizo: Gestión de adecuación de mobiliario, seguimiento a la ejecución financiera y administrativa del convenio 180450 con la ANIM para efectos de este ultimo la gestión de cierre y liquidación contractual.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$61.407.000	\$61.407.000	\$59.465.000		
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$1.730.611.000	\$556.846.000	\$298.984.733		
TOTAL	\$1.792.018.000	\$618.253.000	\$358.449.733		

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se ha avanzado en la entrega de los servicios y las herramientas tecnologicas para la interconexión del nuevo edificio, como también en lo que corresponde a los elementos para el proyecto de conferencia y debate de los recitons y las comisiones del Concejo.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	\$0	\$0	
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá	\$5.700.000.000	\$2.747.025.000	\$0
TOTAL	\$5.700.000.000	\$2.747.025.000	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51% Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Dic	3.128.808.000	0	3.128.808.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.507.212.000	Financiero 81,19% Físico 90,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Dic	13.242.815.003	7.125.191.000	13.242.815.003	13.242.491.965	13.242.491.965	74.756.000	Financiero 100,00%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2023-Sep	3.365.278.000	7.492.018.000	3.365.278.000	358.449.733	358.449.733	8.778.166	Financiero 10,65%  Físico 3,00%  Gestión 0,00% 

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	7.492.018.000	3.365.278.000	358.449.733	358.449.733	8.778.166	Apr. Vigente 13.167.735.965,00 Pago 8.320.913.424,00
Total	7.492.018.000	3.365.278.000	358.449.733	358.449.733	8.778.166	Apr. Vigente 13.167.735.965,00 Pago 8.320.913.424,00

>> Evolución 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	6.318.253.000	3.365.278.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %	0,79 %	5,67 %	10,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	7.492.018.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	7.492.018.000			
---Bogota-BOGOTA	0	7.492.018.000			

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324
