



CONCEJO DE BOGOTÁ 26-03-2025 08:10:45

2025ER7724 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: IDU/PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RESPUESTA CUESTIONARIO PROPOSICIÓN 403 DE 2025

OBS: 202522500311871



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Marzo 25 de 2025

Doctor

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

CONCEJO DE BOGOTÁ DC

CALLE 36 28A 41

comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogotá D.C.

REF: Respuesta cuestionario Proposición 403 de 2025. Tema: Cerros Orientales.
Oficio Concejo No. 2025EE5369. Radicado IDU N. 202552600415992.

Respetados doctor Giraldo,

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual remite al IDU el cuestionario de la Proposición 403 de 2025, que tiene por tema “*CERROS ORIENTALES*”, a continuación, brindamos respuesta a los interrogantes de competencia del IDU, con base en la información preparada por la Dirección Técnica de Proyectos de esta Entidad, en los siguientes términos:

Caso Triángulo Bajo, Triángulo Alto, Manantial y Corinto:

27. “Sírvese indicar las acciones que su entidad ha adelantado para atender y solucionar la emergencia de cierre vial ocasionada por el deslizamiento de tierra en la localidad de San Cristóbal, en la Av. de los Cerros a la altura del Barrio el Triángulo Bajo”

Respuesta:

Para dar respuesta a este requerimiento nos permitimos indicar que el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU realizó visitas al sitio los días 06 de diciembre de 2024 y el 09 de enero de 2025, producto de estas visitas se emitió un documento de diagnóstico y un procedimiento para el tratamiento del talud a corto plazo. Los cuales fueron enviados el primero de ellos al equipo de emergencias del IDIGER mediante correo electrónico y el segundo documento se el envió al IDIGER con copia a la Alcaldía de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

San Cristóbal por medio del oficio del IDU DTP 202522500137991 el 05 de febrero de 2025.

Para la ejecución de los trabajos el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU , junto con el IDIGER, la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Unidad de Mantenimiento Vial UMV, con el fin de ofrecer el tratamiento a corto plazo del Talud ubicado en la Calle 17 D Sur No. 13 - 68 Este, sector El Triángulo, localidad de San Cristóbal, consistentes en retirar del talud el material suelto, inició actividades en el sitio el día viernes 07 de Febrero de 2025 hasta el día 03 de marzo cuando se dio apertura a la vía.

Las actividades ejecutadas se describen a continuación:

I. Instalación de elementos de protección en vía

- El IDU instaló un colchón de arena con un espesor mínimo de 0.30 m de espesor, y ubicado en el costado de la vía adyacente a la parte baja del talud.
- Como elemento de confinamiento, se conformó un dique de protección con una de aproximadamente 1.0m a lo largo del colchón de arena.
- Finalmente, y como complemento al dique, confinó la totalidad del conjunto colchón-dique mediante la instalación de maletines rellenos de material que impida su movimiento ante posibles impactos de rocas provenientes del talud.

El objetivo de estos elementos era reducir la energía cinética de los bloques de roca que se desprendieran del talud tanto en la etapa de intervenciones, así como en los periodos en los cuales no se ejecutaban actividades.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

	
<p>Inicio de colocación de maletines y dique</p>	<p>Inicio de la instalación del colchón de arena</p>
	
<p>Relleno del colchón de arena</p>	<p>Finalización del colchón de arena, como control y barrera de la caída de rocas.</p>

II. Desabombe del talud

Luego de la instalación del colchón de arena y del dique con bolsas rellenas de material, se inició con las actividades de desabombe del talud tendientes a remover los bloques suelos y susceptibles de caída. Para tal fin, el IDIGER, se apoyó en personal del ejército Nacional para esta labor. Esta actividad se llevó a cabo, por medio de herramienta menor y martillos rotopercutores.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número



Remoción de bloques iniciando desde la parte superior



Remoción de bloques iniciando desde la parte superior

Bloques desprendidos controladamente

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número



Remoción controlada de bloques con martillo rotopercursor

III. Evacuación progresiva de los bloques removidos de la parte superior

Por medio de un minicargador y volqueta de la UAERMV, se inicia el retiro los fragmentos de roca que se lograron desprender desde la parte alta con herramienta menor.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

<p>Material desprendido</p>	<p>Minicargador trasladando los fragmentos desprendidos de las volquetas.</p>

IV. Desabombe parte media y baja del talud

Por medio de la retroexcavadora del IDIGER en comodato de la UMV, se realizó la descarga del material suelto de la parte media y baja del talud



Desabombe material suelto parte media y baja

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

El brazo de la retro excavadora en algunos lugares no alcanzó a llegar al borde la roca de arenisca de la parte superior, donde quedo un mínimo material remante de partículas pequeñas. Las cuales no se pudieron bajar por falta del personal con curso en alturas.

V. Sellado de grieta

Se realizó el sellado de una grieta en el parte superior con ayuda del personal y materiales de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Con el fin de disminuir la degradación de la arcillolita que se encuentra debajo de la arenisca por la entrada de agua.



Sellado de grieta

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

VI. Recolección del material de la vía y apertura

Una vez finalizado el perfilado del talud y remoción del material suelto, se recogió por parte del IDU el material del colchón que se había dispuesto sobre la vía y se dio apertura a esta el día 03 de marzo.

 <p>28 feb 2025 2:11:54 p. m. 4°34'51.96"N 74°4'39.372"W 13-10 Calle 14 Sur Bogotá, 11041 Colombia</p>	 <p>28 feb 2025 4:32:47 p. m. 4°34'4.926"N 74°4'39.186"W 13-91 Calle 14 Sur Bogotá, 11041 Colombia</p>
<p>Limpeza de cuneta</p>	<p>Recolección de material de triturado del colchón</p>
 <p>1 mar 2025 1:29:46 p. m. 4°34'6.15"N 74°4'39.846"W 13-10 Calle 14 Sur Bogotá, 11041 Colombia</p>	 <p>lunes, 3 de marzo de 2025 16:39:09 4.56810094N 74.07751645W Cra. 8a Este #17-17, Bogotá, Colombia</p>
<p>Recolección del material proveniente del talud</p>	<p>Disposición de bolsas de lona con material en la pata del talud y limpieza de la vía</p>

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

8



DTP

202522500311871


Información Pública

Al responder cite este número



Apertura de la vía

A continuación, se muestra una imagen comparativa antes de la intervención y luego de esta, en donde se aprecia la remoción del material rocoso suelto de la parte superior del talud que corresponde a una arenisca con alto grado de fracturación y el perfilado y remoción del material suelto que se encontraba en la parte media y baja del talud correspondiente a la zona de arcillolita.

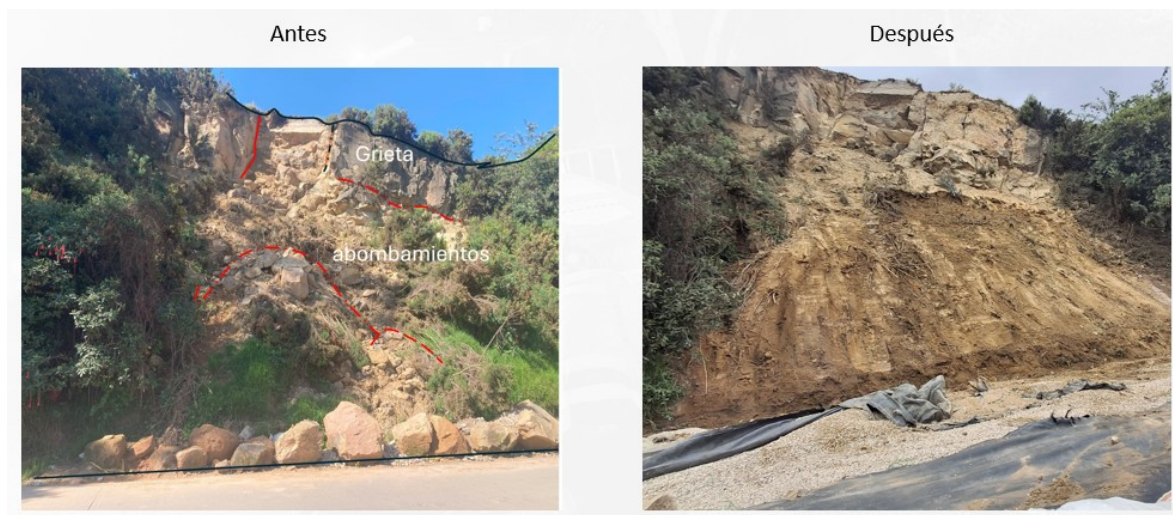

28. “Sírvese indicar el estado de los estudios y diseños de las obras que se pretenden realizar en este punto, los tiempos que se tienen proyectados

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9



DTP

202522500311871

Información Pública

Al responder cite este número

para las distintas etapas del proyecto, los presupuestos y de donde van a salir los recursos.”

Respuesta:

El IDU cuenta con 4 contratos, en desarrollo con el siguiente objeto:

“REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”, Grupos A, B, C y D

Estos contratos se encuentran finalizando etapa de Estudios y Diseños, en las cuales se están revisando los presupuestos y vialidades prediales para pasar a la fase de construcción de las obras. Una vez se logre finalizar el balance de los contratos se revisará la posibilidad de inclusión del punto del sector del Triángulo Bajo, dentro de alguno de estos 4 contratos para iniciar la etapa de estudios y diseños y llevar a cabo la intervención definitiva. Con respecto a los recursos, en el caso que haya que adicionar alguno de ellos, se adelantaran las gestiones correspondientes para la obtención de los recursos necesarios para la intervención.

29. *“Sírvese indicar cómo se tiene planeado intervenir la vía de acceso a los barrios Manantial y Triángulo Alto que actualmente se encuentra afectada por deslizamientos en varios tramos poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. Sustente su respuesta”*

Respuesta:

La vía de acceso de los Barrios Manantial y Triángulo alto corresponden a la malla vial rural de la localidad de San Cristóbal, como se muestra en la imagen a continuación, por lo tanto, su atención está a cargo de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial – URMV, conforme lo señalado en los Acuerdos Distritales 740 de 2019 y 761 de 2020, respectivamente. Por lo que se da traslado a la Alcaldía Local de San Cristóbal.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

10

