

Nombre del proyecto:

# MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



## Objetivo general:

Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad: BOGOTA D.C.


Responsable: Clara Ines Parra Rojas

Horizonte: 2020 - 2023

Presupuesto 2022: \$

Control Posterior: 16/02/2022

Seguimiento de: junio 2022

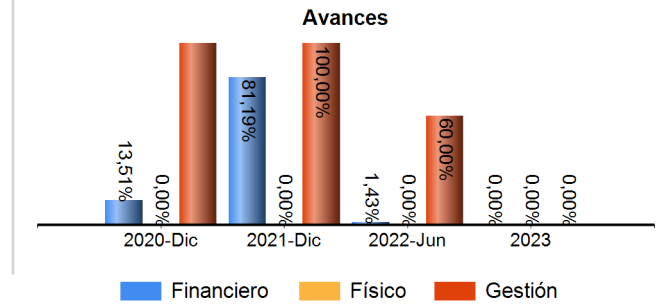

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

**PRODUCTOS**

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sede construida y dotada - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,2880	0,3000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se encuentra en la formulación de las necesidades y adición de recursos para la optimización del edificio nuevo, en el marco del convenio No. 180450. En finalizar, los servicios posventa, mobiliario y conectividad.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$101.940.000	\$101.940.000	\$101.940.000
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$3.690.562.000	\$3.690.562.000	
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.792.502.000</b>	<b>\$3.792.502.000</b>	<b>\$101.940.000</b>

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes mantenidas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,3000	0,0000	0,00 %
<b>Actividad</b>		<b>Inicial</b>	<b>Vigente</b>	<b>Obligado</b>	
Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes		\$0	\$0		
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá		\$3.332.689.000	\$3.332.689.000		
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.332.689.000</b>	<b>\$3.332.689.000</b>		

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51%  Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Dic	3.128.808.000	0	3.128.808.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.507.212.000	Financiero 81,19%  Físico 90,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Jun	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	101.940.000	101.940.000	0	Financiero 1,43% Físico 0,00% Gestión 60,00%
2023	3.383.500.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptl.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	7.125.191.000	7.125.191.000	101.940.000	101.940.000	0	Apr. Vigente 24.741.000,00 Pago 8.247.000,00
<b>Total</b>	<b>7.125.191.000</b>	<b>7.125.191.000</b>	<b>101.940.000</b>	<b>101.940.000</b>	<b>0</b>	Apr. Vigente 24.741.000,00 Pago 8.247.000,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.895.000.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestión</b>	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	60,00 %	60,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Comites de Obra realizados	5,0000	3,0000	60,00 %
<b>Observaciones:</b> Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.			
Sedes arrendadas	0,0000	0,0000	0,00 %

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	7.125.191.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,43 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

### >> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	7.125.191.000	7.125.191.000	101.940.000	101.940.000	0
---Bogota-BOGOTA	7.125.191.000	7.125.191.000	101.940.000	101.940.000	0

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324
