

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad:
 Responsable:
 Horizonte: 2020 - 2023
 Presupuesto 2022: \$
 Control Posterior: 23/12/2022
 Seguimiento de: diciembre 2022

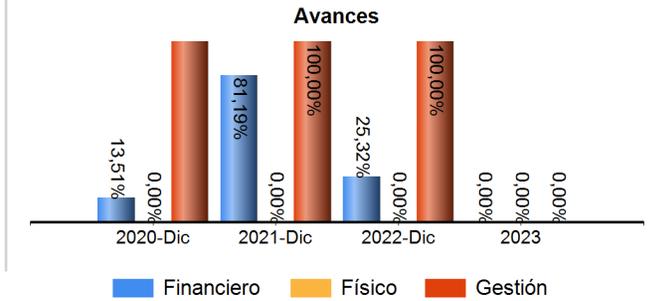

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS					
Sede construida y dotada					
Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,1880	0,1500	0,0000	0,00 %
Observaciones : ETB su referencia 220445, se encuentra en el estudio de mercado para conferencia y debate, mobiliario y adición de recursos para la optimización del edificio nuevo, en el marco del convenio No. 180450. Al igual que la solicitud de prórroga por 1 año aprox.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$101.940.000	\$101.940.000	\$101.940.000		
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$3.690.562.000	\$13.140.875.003	\$3.250.551.965		
TOTAL	\$3.792.502.000	\$13.242.815.003	\$3.352.491.965		

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad		Inicial	Vigente	Obligado	
Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes		\$0	\$0		
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá		\$3.332.689.000	\$0		
TOTAL		\$3.332.689.000	\$0		

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51%  Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Dic	3.128.808.000	0	3.128.808.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.507.212.000	Financiero 81,19%  Físico 90,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Dic	13.242.815.003	7.125.191.000	13.242.815.003	3.352.491.965	3.352.491.965	57.766.000	Financiero 25,32%  Físico 0,00%  Gestión 100,00% 
2023	7.492.018.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	7.125.191.000	13.242.815.003	3.352.491.965	3.352.491.965	57.766.000	Apr. Vigente 24.741.000,00 Pago 8.247.000,00
Total	7.125.191.000	13.242.815.003	3.352.491.965	3.352.491.965	57.766.000	Apr. Vigente 24.741.000,00 Pago 8.247.000,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.895.000.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	7.125.191.000	9.835.191.000	9.835.191.000	9.835.191.000	13.242.815.003
Avance Financiero	0,00 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	1,43 %	47,05 %	34,09 %	34,09 %	34,09 %	25,32 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %	60,00 %	60,00 %	80,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Sedes arrendadas	1,0000	0,0000	0,00 %
Comites de Obra realizados	5,0000	5,0000	100,00 %

Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	9.835.191.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,09 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	7.125.191.000	9.835.191.000	3.352.491.965	3.352.491.965	57.766.000
---Bogota-BOGOTA	7.125.191.000	9.835.191.000	3.352.491.965	3.352.491.965	57.766.000

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324
